

2023年浚县善堂镇东海头村冬桃种植

项目

验收报告

报告编号：BG-YS231121001

河南崇安检测技术有限公司

2023年11月21日

委托单位：浚县乡村振兴局

建设单位：浚县善堂镇人民政府

施工单位：河南迈拓建设工程有限公司

见证单位：河南中睿信达工程管理有限公司

验收人员

验收人员：张青

报告审核：朱彦君

报告批准：李峰

说明：1、报告未加盖公章或检测专用章无效。

2、未经本单位书面同意，部分复制报告无效。

3、若对检测结果有异议，应于收到报告十五日内，以书面形式向检测单位提出，逾期视为对报告无异议。

4、检测报告未加盖骑缝章无效。

单位地址：郑州经济技术开发区九龙办事处龙飞南街105号5号生产车间

联系电话：18603922578

目 录

1. 项目概况	1
2. 验收依据	1
2.1 行为依据	1
2.2 标准、规范依据	1
2.3 其它依据	2
3. 检测仪器设备	2
4. 检验项目及检测方法	3
4.1 工程量测量	3
4.2 实体质量检验	3
5. 工程验收情况	3
5.1 土石方工程	3
5.2 混凝土及钢筋混凝土工程	4
5.3 金属结构工程	4
5.4 安装工程	5
6. 冷库部分验收情况	6
6.1 土石方工程	6
6.2 安装工程	6
7. 工程量偏差表	7
8. 工程量增加情况	7
附件1、检测单位营业执照及资质证书	9
附件2、部分产品合格证	11
附件3、工程量签证单	17
附件4、部分现场验收照片	18

河南崇安检测技术有限公司受浚县乡村振兴局的委托，就2023年浚县善堂镇东海头村冬桃种植项目进行验收。该项目主要验收情况如下：

1. 项目概况

项目名称：2023年浚县善堂镇东海头村冬桃种植项目。

建设地点：善堂镇东海头村。

主要建设内容：新建种植大棚及冷库。

该项目委托单位为浚县乡村振兴局，建设单位为浚县善堂镇人民政府，施工单位为河南迈拓建设工程有限公司，监理单位为河南中睿信达工程管理有限公司。

开工日期：2023年8月2日。

竣工日期：2023年10月1日。

2. 验收依据

2.1 行为依据

- 浚县乡村振兴局的《第三方验收服务合同》

2.2 标准、规范依据

- 《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；
- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）

;

- 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2018）

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

;

- 《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）；

- 《种植塑料大棚工程技术规范》（GB / T51057-2015）

;

- 《温室覆盖材料安装与验收规范塑料薄膜》（NY / T1966-2010）；

- 《工程测量标准》（GB 50026-2020）；

- 《冷库施工及验收标准》（GB 51440-2021）；

- 其它相关规程、规范。

2.3 其它依据

- 2023年浚县善堂镇东海头村冬桃种植项目相关文件。

- 现场检查、勘测资料。

3. 检测仪器设备

表3-1检测仪器及设备

序号	仪器/设备名称	规格型号	单位	数量
1	测距轮	9999m	把	2
2	钢卷尺	10m、	把	1
3	卷尺	100m	把	1
4	游标卡尺	0-15cm	把	1

4. 检验项目及检测方法

4.1 工程量测量

采用仪器与设备对工程量进行核实，测量方法及精度依据《工程测量标准》（GB50026-2020）及相关规定。

4.2 实体质量检验

依据《建设工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）及相关验收规范，采用观察、测量、检验施工资料及合格证明文件对工程质量进行检测。

5. 工程验收情况

5.1 土石方工程

依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2018）规定的检验方法进行检验。因该工程已经竣工，不能对隐蔽工程验收，通过检查施工资料进行评价。

通过查看资料，土石方工程检验结果如下：土方回填压实系数符合设计要求；土方顶面标高偏差未超过规范要求的偏差；该项目土石方工程施工质量符合设计和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2018）的要求，土石方工程合格。

5.2 混凝土及钢筋混凝土工程

依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）规定的检验方法进行检验。通过检查施工资料及现场检测进行评价。

通过查看资料，垫层及圈梁施工检验结果如下：混凝土强度符合设计要求；轴线位置的偏差未超过规范要求的偏差；基础的截面尺寸偏差未超过规范要求的偏差；基础顶面标高偏差未超过规范要求的偏差；混凝土浇筑质量符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）的要求。该项目混凝土及钢筋混凝土工程施工质量符合设计要求，工程质量合格。

5.3 金属结构工程

依据《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）规定的检验方法进行检验。

通过检查施工资料及现场查看，因情况特殊，在施工过程中依据现场实际情况，4个大棚内所有水泥立柱共176根替换成钢立柱，且已按相关规范进行养护。该工程钢材的品种、规格、性能等符合现行国家产品标准和设计要求。大棚高度、大棚宽度、大棚拱杆平面垂直度、相邻拱杆间距、纵向系杆顺直度等均符合设计和规范要求。

5.4 安装工程

5.4.1 彩板门工程

依据《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）规定的检验方法进行检验。

经检查施工资料和现场查看，彩板门安装牢固，位置正确，使用灵活，墙体、洞口的质量、性能要求达到国家有关规定，符合现行国家产品标准和设计要求。

5.4.2 保温、隔热工程

依据《温室覆盖材料安装与验收规范塑料薄膜》NY / T1966规定的检验方法进行检验。经检查施工资料和现场查看，薄膜、拉链卷膜器、温控放风机、温室保温被、卷被机安装合理，符

合设计和规范要求。

5.4.3其他工程

经检查施工资料和现场勘察，卷被机4套，减速机4套，温控放风机16套，卷膜器8套未安装，压膜绳配套铁环、砖360套，喷灌配件安装240个，配电箱4台，补光灯240套，照明开关16个，实际12个，喷淋系统和配线、配管及照明开关安装合理，观感较好，该工程除卷膜器未安装外，其他安装工程符合设计和规范要求。

6. 冷库部分验收情况

6.1土石方工程

经检查施工资料和现场查看，冷库的土石方工程施工质量符合设计和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2018）的要求，土石方工程合格。

6.2安装工程

依据《冷库施工及验收标准》（GB 51440-2021）规定的检验方法进行检验。

经检查施工资料和现场查看，冷库特种门1樘，风幕机1台，

冷风机组1台，落地式配电柜1台，冲霜水系统，管道系统的安装、及其他配套设施，均满足设计要求，符合现行国家产品标准和设计要求，工程质量合格。

7. 工程量偏差表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	实际工程量	备注
	种植大棚					
1	卷膜器	1. 卷膜器	套	8	0	未安装
3	喷灌配件安装	1. 满足设计要求	个	240	288	
4	配管	1. 名称：PCF 2. 配置形式：明配	m	929.2	1080	
5	照明开关	1. 名称：单联双控开关 2. 材质：详见图纸	个	16	12	单控双控8个 单联单控4个

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	实际工程量	备注
	冷库					
1	特种门	1. 冷库门口 (2.5*1.35)	樘	2	2	实际规格 1.5*2.55
2	其他保温隔热	1. 保温隔热部位：冷库底部 2. 保温隔热方式：15cm挤塑板	m2	32	48	

8. 工程量增加情况

因现场情况特殊，在施工过程中需要依据现场实际情况完成施工，经现场检测：新增一套20匹智能冷暖机组。现已按相关规范进行养护，养护工程量为变更后施工工程量。（详见附件3）

工程完工检测报告

2023年11月10日，河南崇安检测技术有限公司对2023年浚县善堂镇东海头村冬桃种植项目进行了工程实体质量检测和外观检查，并对其检测数据进行了整理、汇总、评定等工作。

● 评定结果

2023年浚县善堂镇东海头村冬桃种植项目工程质量符合相关验收规范的规定；质量控制资料完整；主要功能项目的抽检结果符合相关专业质量验收规范的规定；观感质量符合验收要求。

经上述指标评定，该工程实际施工内容与设计有偏差，工程质量符合设计文件要求及相关验收规范的规定，工程质量合格。

验收人员签字：司长青 朱彦宏




附件1、检测单位营业执照及资质证书

统一社会信用代码 91410100MA4557HP8T		扫描二维码 国家企业信用信息公示系统 了解更多登记、备案、许可监管信息。	
河南崇安检测技术有限公司		伍佰万圆整	
名称	河南崇安检测技术有限公司	注册资本	伍佰万圆整
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	成立日期	2018年04月24日
法定代表人	徐志彬	营业期限	长期
经营范围	主体结构工程检测；玻璃幕墙工程检测；地基基础工程检测；钢结构工程检测；建筑工程检测；路桥工程检测；人防工程检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
住所		郑州经济技术开发区九龙办事处龙飞南街105号5号生产车间	
登记机关		2022年02月25日	

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 201601060067

名称: 河南崇安检测技术有限公司

地址: 郑州经济技术开发区九龙办事处龙飞南街105号5号生产车间

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



201601060067
有效期至2026年4月20日

发证日期: 2022年3月22日

有效期至: 2026年4月20日

发证机关: 河南省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

附件2、部分产品合格证

产品合格证	
产品型号：	RMTZNN16.0 风机
产品编号：	
出厂日期：	2023年8月
该产品经检验符合国家标准和行业 标准之规定，产品实验合格，准予出厂。	
QC 003 PASS	
上海睿美特制冷科技有限公司	

产品合格证

PRODUCT CERTIFICATION

(产品检验专用章)

(PRODUCT INSPECTION STAMP)

泰兴市企鹅冷冻设备厂

Taixing Penguin Refrigeration Equipment Factory

产品名称 Name:

6WB25-2

产品型号 Model:

Q200435

出厂编号 Serial No.:

21 11

生产日期 Manufacture Date:

合格

检验结论 Test Result

检验 (签章)

Tested by (Stamp)

检 1

核 验

(签章)

Tested by (Stamp)

检 2

聚氨酯夹芯板检验报告

产品名称：聚氨酯夹芯板

主要检测项目


序号	检测项目	规定标准	实测结果	检验结论
1	导热系数	$\leq 0.024W/(m \cdot k)$	0.021	合格
2	阻燃	B1	B1	合格
3	彩板厚度	0.4mm	0.4mm	合格
4	容重	$40 \pm 2Kg/m^3$	$38Kg/m^3$	合格
检验负责人：高铁山				

河南诺板业有限公司
2023年9月9日


河南永盛环境检测工程有限公司
检测报告

样品名称	金属面聚氨酯夹芯板		
委托单位	河南节诺板业有限公司		
建设单位	/		
监理单位	/		
施工单位	/		
生产单位	河南节诺板业有限公司		
规格型号	4000 mm×1120 mm×100 mm		
样品状况	符合要求	检测类别	委托检测
送样日期	2022.3.15	检测日期	2022.3.17-2022.3.30
检测参数	芯密度、导热系数、压缩强度、燃烧性能 B ₁ 、粘结强度、尺寸允许偏差		
检测依据	1、检测委托书 WT-JN20220200061； 2、《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》 GB/T 6343-2009； 3、《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》 GB/T 10294-2008； 4、《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》 GB/T 8813-2020； 5、《泡沫塑料与橡胶线性尺寸的测定》 GB/T 6342-1996； 6、《建筑材料可燃性试验方法》 GB/T 8626-2007； 7、《建筑材料或制品的单体燃烧试验》 GB/T 20284-2006； 8、《建筑用金属面绝热夹芯板》 GB/T23932-2009。		
检测结论	1、依据《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》 GB/T 21558-2008，所检试样的导热系数、压缩强度符合标准要求； 2、依据《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB 8624-2012，所检试样的燃烧性能符合 B ₁ (C-s2, d0) 级标准要求； 3、依据《建筑用金属面绝热夹芯板》 GB/T23932-2009，所检试样的芯密度、粘结强度、尺寸允许偏差符合标准要求，检测结果附后。 		
备注	1、试验结果与特定试验条件下试样的性能有关，试验结果不能作为评价制品在实际使用条件下潜在火灾危险性的唯一依据； 2、试样送样前已陈化完成； 3、检验检测结果仅对来样负责。		


批准:



审核:



主检:



第1页共3页

天津市宏丰制管有限公司材质单
钢管产品质量证明书

需方名称:

合同编号:

产品名称: 镀锌管

执行标准: Q/12JH4597-2007
质量等级: 合格品

批号	品种规格	材质	支数	化学成分%				机械性能			镀锌层 重量 测定 g/m ²	镀锌层 附着力 检验
				C	Si	Mn	P	S	压扁	抗拉强度	伸长率	
									实验	(N/mm ²)	%	
	30*70*2.0	Q195		0.15	0.3	0.32	0.045	0.05	合格	420	30	合格
	30*60*2.0	Q195		0.15	0.3	0.32	0.045	0.05	合格	420	30	
	48*2.0	Q195		0.15	0.3	0.32	0.045	0.05	合格	420	30	
	60*2.0	Q195		0.15	0.3	0.32	0.045	0.05	合格	420	30	
	25*1.5	Q195		0.15	0.3	0.32	0.045	0.05	合格	420	30	
	32*1.5	Q195		0.15	0.3	0.32	0.045	0.05	合格	420	30	
备注: 1: 此份材质单与对应单据号销售单所提供规格对应使用, 以、图注省该规格视为无效												
2: 如发现质量问题请与本公司质检科联系												
地址: 天津市静海县大邱庄镇工业园												
发货日期: 2023年												


混凝土配合比试验报告										报告编号		230926004					
										任务单号							
HBST-J-032-2022										配比编号		SP2023003					
施工单位		河南迈拓建设工程有限公司															
工程名称		2023年淅县善堂镇东海头村冬桃种植项目															
浇筑部位		冷藏、冷冻库垫层															
强度等级		C25	配制强度(MPa)		33.5		搅拌方法		机械		要求坍落度(mm)		180±20				
其它技术要求						养护方法		标养		实测坍落度(mm)		200					
项目		厂名或产地				品种、规格				试验编号							
材料名称		水泥				P.O42.5				C230025							
		卫辉春江															
		砂				鹤壁淅县				S230025							
						I 中砂机制砂											
						II /											
		石				鹤壁淅县				G230025							
						I 碎石5-25mm											
						II /											
		水				/				饮用水							
掺合料		I		鹤壁万和电厂		F类II级				F230025							
		II		安阳远山		S95				K230025							
外加剂		I		淇县盛丰		聚羧酸高性能减水剂				Y230025							
		II		/		/				/							
其它																	
报告日期																	
材料名称		水泥		砂		石		拌合水量		掺合料		外加剂		膨胀剂		其它	
项目				机制砂		碎石5-25mm				F类II级 S95级							
每m³用量(kg)		190		908		920		177		95 75		5.5					
质量比		1		4.779		4.842		0.932		0.500 0.395		0.029					
水胶比				0.49		砂率%		50%		设计水量		177					
抗压检验结果		试件规格(mm)				龄期(d)				抗压强度(MPa)							
		100mm*100mm*100mm				3d											
						7d				22.5							
						28d				33.5							
备注:																	
签发人		陈恒庆		审核人		郭昆化		试验人		路振平							

注：1、报告未加盖检测单位公章无效；2、复制报告未重新加盖检测单位公章无效。


检验单位：淅县万润新型节能建材有限公司实验室

单位地址：淅县007乡道九股路村


电话：17530395388



附件3、工程量签证单


工程量签证单		
工程名称	2023 年浚县善堂镇东海头村冬桃种植项目	
1、本工程冬桃种植项目，因现场情况特殊，在施工过程中需要依据现场实际情况完成施工，经现场检测：新增一套 20 匹智能冷暖机组。现已按相关规范进行养护，养护工程量为变更后施工工程量。		
建设单位：（公章）	监理单位：（签章）	施工单位：（签章）
 (工程量属实、情况属实)	 (工程量属实、情况属实)	 (工程量属实、情况属实)
年 月 日	年 月 日	年 月 日

附件4、部分现场验收照片

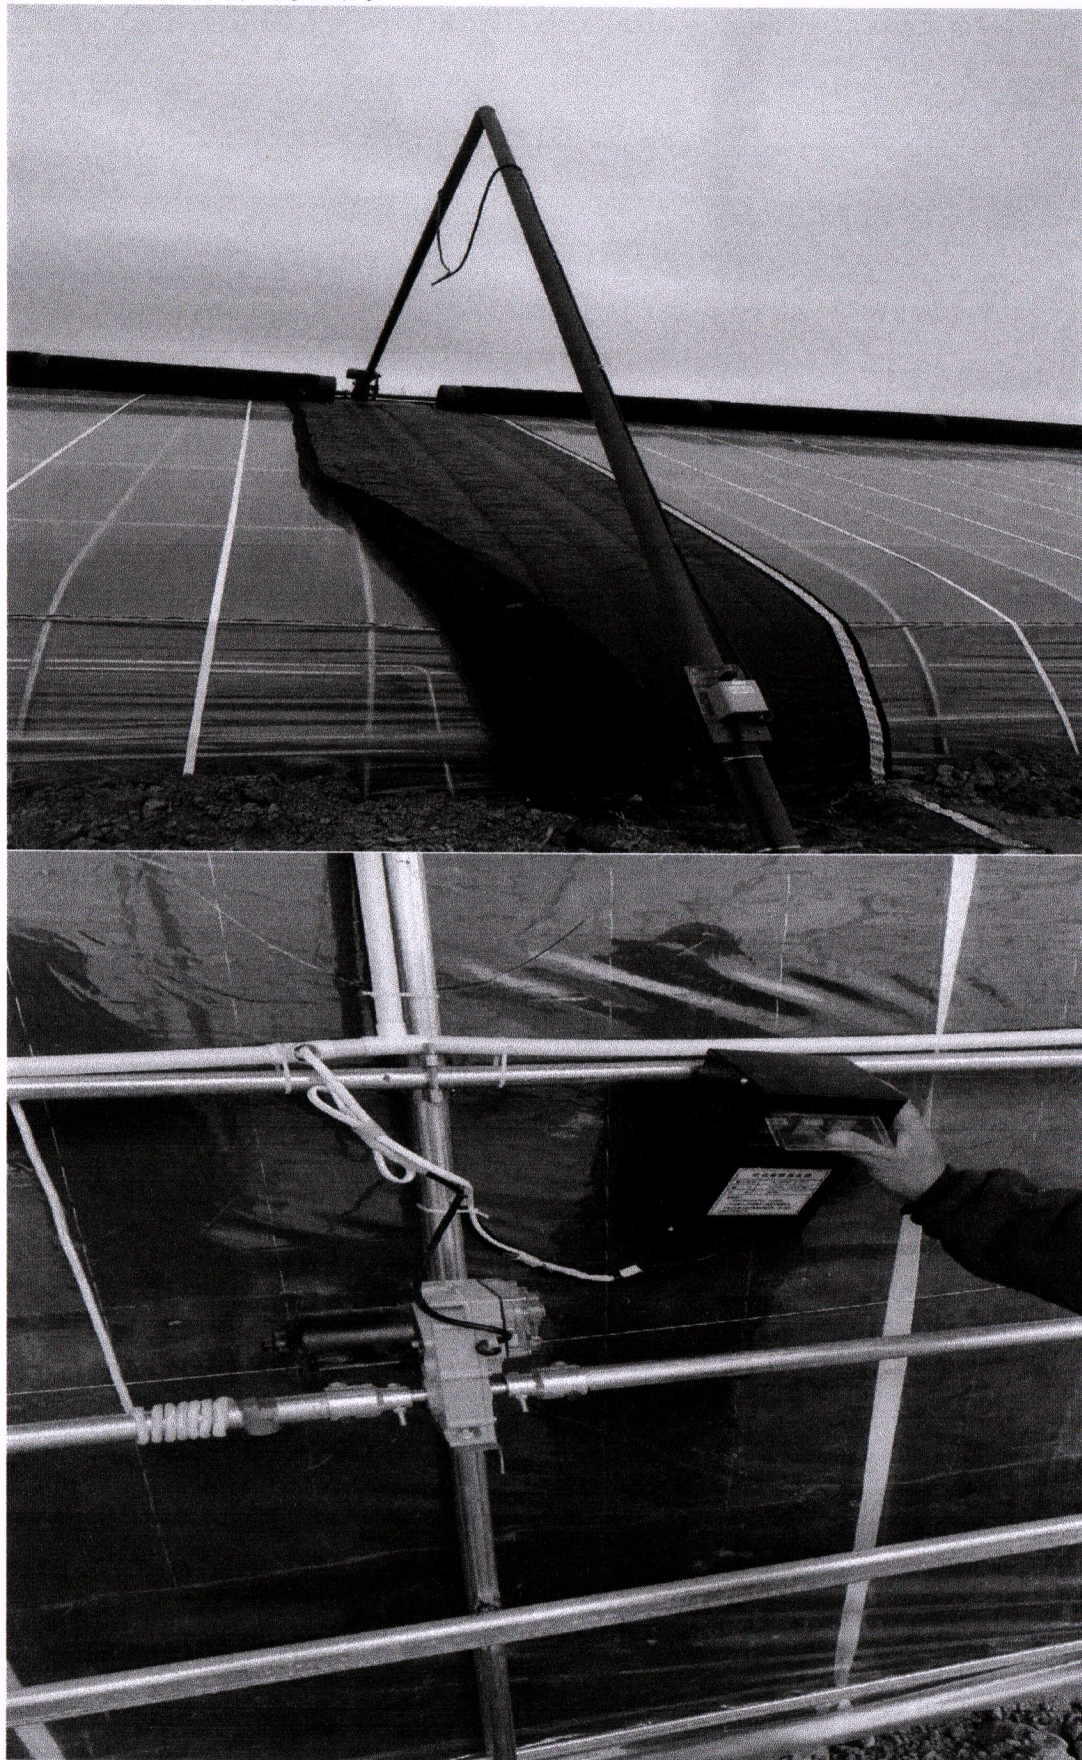





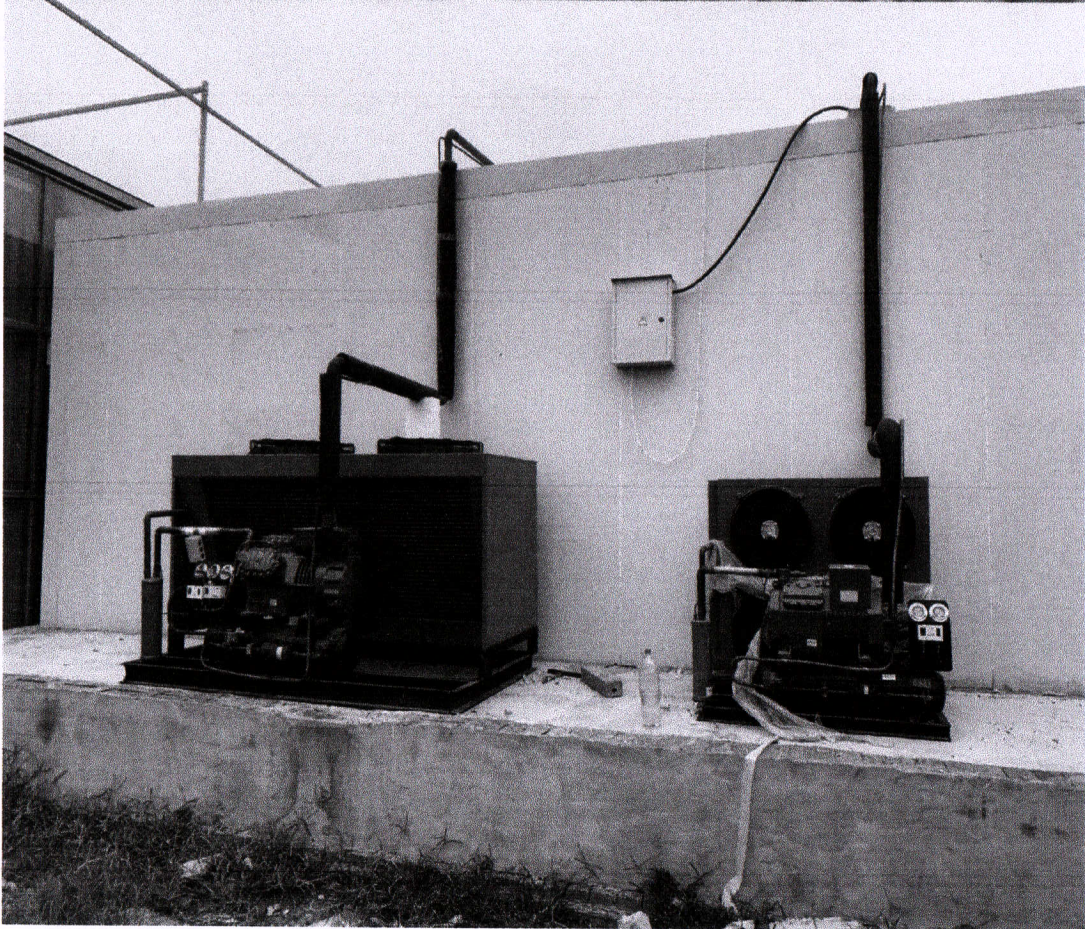



半封闭活塞式制冷压缩机			
型 号		排 量	m ³ /h
电 源	380V 3N~ 50Hz	介 质	
油 量		L 重 量	kg
日 期	20 年 月	编 号	
泰兴市企鹅冷冻设备厂			



电动卷膜器电源	
输入电压	AC220V ±10%
输 出	DC24V 6.5A/路
功 率	350W
温馨提示: 1. 安装时切勿带电作业, 以防触电。 2. 在长期不工作的情况下请关闭电源开关。 3. 输出短路会造成电源短路自保(停止输出)持续解除后恢复正常。	

