

汝阳县林业生态建设营造林综合项目 验收报告

河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

二〇二三年十一月

项 目 名 称：汝阳县林业生态建设营造林综合项目

项目委托单位：汝阳县林业局

项目咨询单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

法 人 代 表：郭放勋

总 工 程 师：王文星 高级工程师

项 目 负 责 人：王文星 高级工程师

项 目 主 管：杨寒昂 工程师

资 质 证 书：中国林业工程
建设协会 乙级 乙 16—009

报 告 执 笔：徐 慧 高级工程师

张米然 高级农艺师

杨寒昂 工程师

数 据 汇 总：郭亚蒙 工程师

制 图：李亚茹 高级工程师

杨寒昂 工程师

现 场 勘 验：李保龙 高级工程师

杨寒昂 工程师

郭亚西 工程师

参 加 人 员：王文星 李保龙 张米然

李亚茹 徐 慧 杨寒昂

杨寒昂 李小雄 郭亚蒙

李巍巍 姚瑶瑶 郭亚西

审 稿：王文星 高级工程师

前 言

为了全面掌握汝阳县林业生态建设营造林综合项目建设成效,搞好工程资金兑付工作,2023年9月,汝阳县林业局委托河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司,对汝阳县林业生态建设营造林综合项目进行了验收。

验收对象包括七个子工程,分别为:汝阳县高速隧道南北两侧荒山绿化工程、汝阳县连翘种植项目、汝阳县上台隧道南侧困难地增绿添彩工程、汝阳县生态廊道北环路绿化项目、汝阳县生态廊道汝安路绿化项目、汝阳县生态廊道微地形绿化项目、橡子直播造林项目,设计面积23850.05亩、257个小班。

本次验收以《汝阳县高速隧道南北两侧荒山绿化工程作业设计》、《汝阳县连翘种植项目作业设计》、《汝阳县上台隧道南侧困难地增绿添彩工程》、《汝阳县生态廊道北环路绿化项目作业设计》、《汝阳县生态廊道汝安路绿化项目作业设计》、《汝阳县生态廊道微地形绿化项目作业设计》、《橡子直播造林项目作业设计》为基础,以《森林河南生态建设工程核查办法(试行)》、《全国营造林核查技术规程》和《森林资源规划设计调查技术规程》为技术依据,结合工程实施的实际情况,本着成效优先的原则,重点验收工程造林面积、苗木规格和成活率,提交了造林验收报告、验收表、统计汇总表和验收图等成果资料。

目 录

一、工程实施情况	1
二、验收工作概况	1
(一) 人员组织	1
(二) 技术培训	2
(三) 验收方法	2
(四) 质量管理	3
三、验收结果	3

附件:

- 1、汝阳县林业生态建设营造林综合项目验收结果汇总表
- 2、汝阳县高速隧道南北两侧荒山绿化工程造林小班调查表
- 3、汝阳县高速隧道南北两侧荒山绿化工程造林小班样地调查表
- 4、汝阳县高速隧道南北两侧荒山绿化工程造林验收图
- 5、汝阳县高速隧道南北两侧荒山绿化工程现场调查工作照
- 6、汝阳县连翘种植项目造林小班调查表
- 7、汝阳县连翘种植项目造林小班样地调查表
- 8、汝阳县连翘种植项目造林验收图
- 9、汝阳县连翘种植项目现场调查工作照
- 10、汝阳县上台隧道南侧困难地增绿添彩工程小班调查表
- 11、汝阳县上台隧道南侧困难地增绿添彩工程小班样地调查表
- 12、汝阳县上台隧道南侧困难地增绿添彩工程造林验收图

- 13、汝阳县上台隧道南侧困难地增绿添彩工程现场调查工作照
- 14、汝阳县生态廊道北环路绿化项目小班调查表
- 15、汝阳县生态廊道北环路绿化项目小班样地调查表
- 16、汝阳县生态廊道北环路绿化项目造林验收图
- 17、汝阳县生态廊道北环路绿化项目现场调查工作照
- 18、汝阳县生态廊道汝安路绿化项目小班调查表
- 19、汝阳县生态廊道汝安路绿化项目小班样地调查表
- 20、汝阳县生态廊道汝安路绿化项目造林验收图
- 21、汝阳县生态廊道汝安路绿化项目现场调查工作照
- 22、汝阳县生态廊道微地形绿化项目小班调查表
- 23、汝阳县生态廊道微地形绿化项目小班样地调查表
- 24、汝阳县生态廊道微地形绿化项目造林验收图
- 25、汝阳县生态廊道微地形绿化项目现场调查工作照
- 26、汝阳县橡子直播造林项目小班调查表
- 27、汝阳县橡子直播造林项目小班样地调查表
- 28、汝阳县橡子直播造林项目造林验收图
- 29、汝阳县橡子直播造林项目现场调查工作照

汝阳县林业生态建设营造林综合项目验收报告

一、工程实施情况

汝阳县林业生态建设营造林综合项目包括七个子工程，作业设计总规划 23850.05 亩，257 个小班，位于汝阳县境内。

二、验收工作概况

本次造林验收由汝阳县林业局委托河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司实施。

（一）人员组织

项目合同签订后，鑫森源公司抽调 3 名业务技术骨干，组成了以公司总工程师为负责人的验收工作团队，汝阳县林业局抽调业务骨干作为向导，服务于验收工作。根据工作需求组建成一个验收小组全面开展验收工作。

（二）技术培训

验收团队组成后，即与汝阳县林业局服务人员进行对接，收集工程的作业设计、矢量图层和影像数据，听取汝阳县林业局的工程概况介绍和技术交底，开展了技术培训，共同学习了《森林河南生态建设工程核查办法（试行）》、《全国营造林核查技术规程》(CLY/T2083-2013)、《造林技术规程》、《森林资源规划设计调查技术规程》等技术文件，统一了验收标准，编制了现场验收表格，加载了数图层。

（三）验收方法

本次验收采取现场逐小班调查的方法进行，严格执行有关技术规程，重点验收造林面积、苗木规格、造林密度和成活率等。现场对造林范围进行区划，填写小班样地调查表格，并将验收数据录入平板验收系统。

小班调查采取设置样地的方法调查，样地类型为样圆、样段，样地面积为1亩或0.5亩，对于较小的小班采取全查，抽样方法和抽样比例按有关规程执行；对汝阳县生态廊道微地形绿化项目，由于设计复杂，采取逐小班全查，主要调查乔灌树木的株数和成活情况，色块和草皮的植被覆盖度和与作业设计的符合情况。

对符合作业设计、成活率达到85%及以上的小班判定为合格，否则为不合格。

（四）质量管理

1、实行项目质量负责制。本次造林验收我们抽调业务技术骨干，由总工程师担任项目负责人，具体负责项目的技术和质量；参与验收的技术人员要对验收的结果签字负责。

2、严格按照有关技术规程和要求验收。验收前，组织参与人员认真学习《森林河南生态建设工程核查办法（试行）》、《全国营造林核查技术规程》(CLY/T2083-2013)、《造林技术规程》(GB/T15776-2023)、《森林资源规划设计调查技术规程》等技术文件，统一技术校准，统一操作流程，为验收质量提供技术保证；验收开始后，调查人员现场消化验收技术，发现问题及时纠正。

3、实行质量跟踪监督。在验收过程中，项目负责人全程参与验收并进行现场督查，并会同汝阳县林业局技术人员进行质量检查，发现问题及时纠正。

4、客观公正独立验收。验收工作除必要的向导外，验收人员严格按照有关技术规程开展验收，客观公正作出质量判断，严格执行中央八项规定，不允许接受被验收单位的“吃请”和礼品。

三、验收结果

从2023年9月18日开始验收，于2023年10月22日完成外业调查。2023年11月9日完成内业汇总，验收工作顺利完成。

汝阳县林业生态建设营造林综合项目设计总计面积23850.05亩，共257个小班。本次验收合格219个小班，合格面积为22704.1亩，不合格小班38个，不合格面积1145.94亩，合格率为95.2%。分工程验收结果如下（详见附表）：

1、汝阳县高速隧道南北两侧荒山绿化工程设计总计面积117.36亩，共6个小班。本次验收合格4个小班，合格面积为114.47亩，不合格小班2个，不合格面积2.89亩，合格率为97.5%。

2、汝阳县连翘种植项目设计总计面积2007.68亩，共23个小班。本次验收合格21个小班，合格面积为1914.2亩，不合格小班2个，不合格面积93.48亩，合格率为95.3%。

3、汝阳县上台隧道南侧困难地增绿添彩工程设计总计面积154.02亩，共4个小班。本次验收合格4个小班，合格面积为154.02亩，不合格小班0个，不合格面积0亩，合格率为100%。

4、汝阳县生态廊道北环路绿化项目设计总计面积 673.85 亩，共 79 个小班。本次验收合格 70 个小班，合格面积为 590.96 亩，不合格小班 9 个，不合格面积 82.89 亩，合格率为 87.7%。

5、汝阳县生态廊道汝安路绿化项目设计总计面积 378.33 亩，共 44 个小班。本次验收合格 32 个小班，合格面积为 322.04 亩，不合格小班 12 个，不合格面积 56.28 亩，合格率为 85.1%。

6、汝阳县生态廊道微地形绿化项目设计总计面积 54.92 亩，共 10 个小班。本次验收合格 10 个小班，合格面积为 54.92 亩，不合格小班 0 个，不合格面积 0 亩，合格率为 100 %。

7、汝阳县橡子直播造林项目设计总计面积 20463.89 亩，共 91 个小班。本次验收合格 78 个小班，合格面积为 19553.49 亩，不合格小班 13 个，不合格面积 910.4 亩，合格率为 95.6%。

河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

2023 年 11 月 15 日

汝阳县林业生态建设营造林综合项目验收结果汇总表

单位：亩、个、%

子工程	设计		验收				面积 合格率
	面积	小班数	合格		不合格		
			面积	小班数	面积	小班数	
合计	23850.05	257	22704.1	219	1145.94	38	95.2
汝阳县高速隧道南北两侧 荒山绿化项目	117.36	6	114.47	4	2.89	2	97.5
汝阳县连翘种植项目	2007.68	23	1914.2	21	93.48	2	95.3
汝阳县上台隧道南侧困难地 增绿添彩工程	154.02	4	154.02	4	0	0	100
汝阳县生态廊道北环路 绿化项目	673.85	79	590.96	70	82.89	9	87.7
汝阳县生态廊道汝安路 绿化工程	378.33	44	322.04	32	56.28	12	85.1
汝阳县生态廊道微地形 绿化项目	54.92	10	54.92	10	0	0	100
汝阳县橡子直播项目	20463.89	91	19553.49	78	910.4	13	95.6

汝阳县高速隧道南北两侧荒山绿化项目小班验收表

单位: 亩, 株/亩, 株, km, 年, 次, 人, %

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人、%																								
乡镇	行政村	工程名称	小班号	规划面积	苗木设计				造林设计										验收意见		验收结果			
					树种	规格	株行距	密度	造林方法	整地方法	树穴规格	栽植时间	扩穴标准	浇水	施肥	病虫害防治	除草	成活率	意见	合格面积	不合格面积	不合格原因		
合计				117.36																114.47	2.89	2.89		
设计	陶营镇	范滩村	高速隧道南北两侧	1	2.09	油松	高度2m、全冠不脱腿，带土球、一级苗	1.5*2	222	植苗造林	机械清理杂草、按梯田标准整地	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次						
验收	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0	不合格	0	2.09	未种植	
设计	陶营镇	范滩村	高速隧道南北两侧	2	0.8	油松	高度2m、全冠不脱腿，带土球、一级苗	1.5*2	222	植苗造林	机械清理杂草、按梯田标准整地	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次						
验收	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0	不合格	0	0.8	未种植	
设计	小店镇	龙泉村	高速隧道南北两侧	3	84.82	油松	高度2m、全冠不脱腿，带土球、一级苗	1.5*2	222	植苗造林	机械清理杂草、按梯田标准整地	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次						
验收	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	合格	84.82	0		
设计	小店镇	龙泉村	高速隧道南北两侧	4	17.53	油松	高度2m、全冠不脱腿，带土球、一级苗	1.5*2	222	植苗造林	机械清理杂草、按梯田标准整地	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次						
验收	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	92	合格	17.53	0		
设计	小店镇	龙泉村	高速隧道南北两侧	5	10.39	油松	高度2m、全冠不脱腿，带土球、一级苗	1.5*2	222	植苗造林	机械清理杂草、按梯田标准整地	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次						
验收	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	92	合格	10.39	0		
设计	小店镇	龙泉村	高速隧道南北两侧	6	1.73	油松	高度2m、全冠不脱腿，带土球、一级苗	1.5*2	222	植苗造林	机械清理杂草、按梯田标准整地	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次						
验收	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	87	合格	1.73	0		

2023年9月23日
许昌县高速路南北两侧
陶湾镇乡 范庄村 村 2 号小班

造林验收样地调查表

调查时间：2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			油松						造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样圃	0.8	0	0						
		杉木植								
合计			0	0					0	0
苗木规格			不合格							
整地规格			不合格							
混交比例			不合格							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨洪印 郭业西

沁阳县高速路两侧
陶营镇乡范滩村 1 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			油松						造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样圆	0.5	0	0						
2	样圆	0.5	0	0						
3	样圆	0.5	0	0						
		柳植								
合计			0	0					0	0
苗木规格			不合格							
整地规格			不合格							
混交比例			不合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨寒那

郭业西

小店鎮 乡 龙集

村 3 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨寒昂

郭正霞

小庄乡 龙泉村 村 4 号小班

湘阴县高塘岭街道南村西侧

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			油松						造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样圆	1	211	10						
2	样圆	1	207	14						
3	样圆	1	198	25						
合计		3	616	49					222	92
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨建

郭亚西

小屯镇 乡 龙泉村 村 5 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			油松						造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样圆	1	220	2						
2	样圆	1	180	42						
3	样圆	1	210	10						
合计			610	54					222	92
苗木规格			全规格							
整地规格			全规格							
混交比例			全规格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨建邦

郭亚西

小庄乡 龙泉村 村 6 号小班
平阳县高速路南北两侧

造林验收样地调查表

调查时间：2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			油松						造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样圆	0.5	95	15						
2	样圆	0.5	88	24						
3	样圆	0.5	107	5						
合计			290	44					223	87
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：


杨寒那

郭玉西



汝阳县高速隧道南北两侧荒山绿化项目验收图 (1/2)



汝阳县高速隧道南北两侧荒山绿化项目验收图 (2/2)

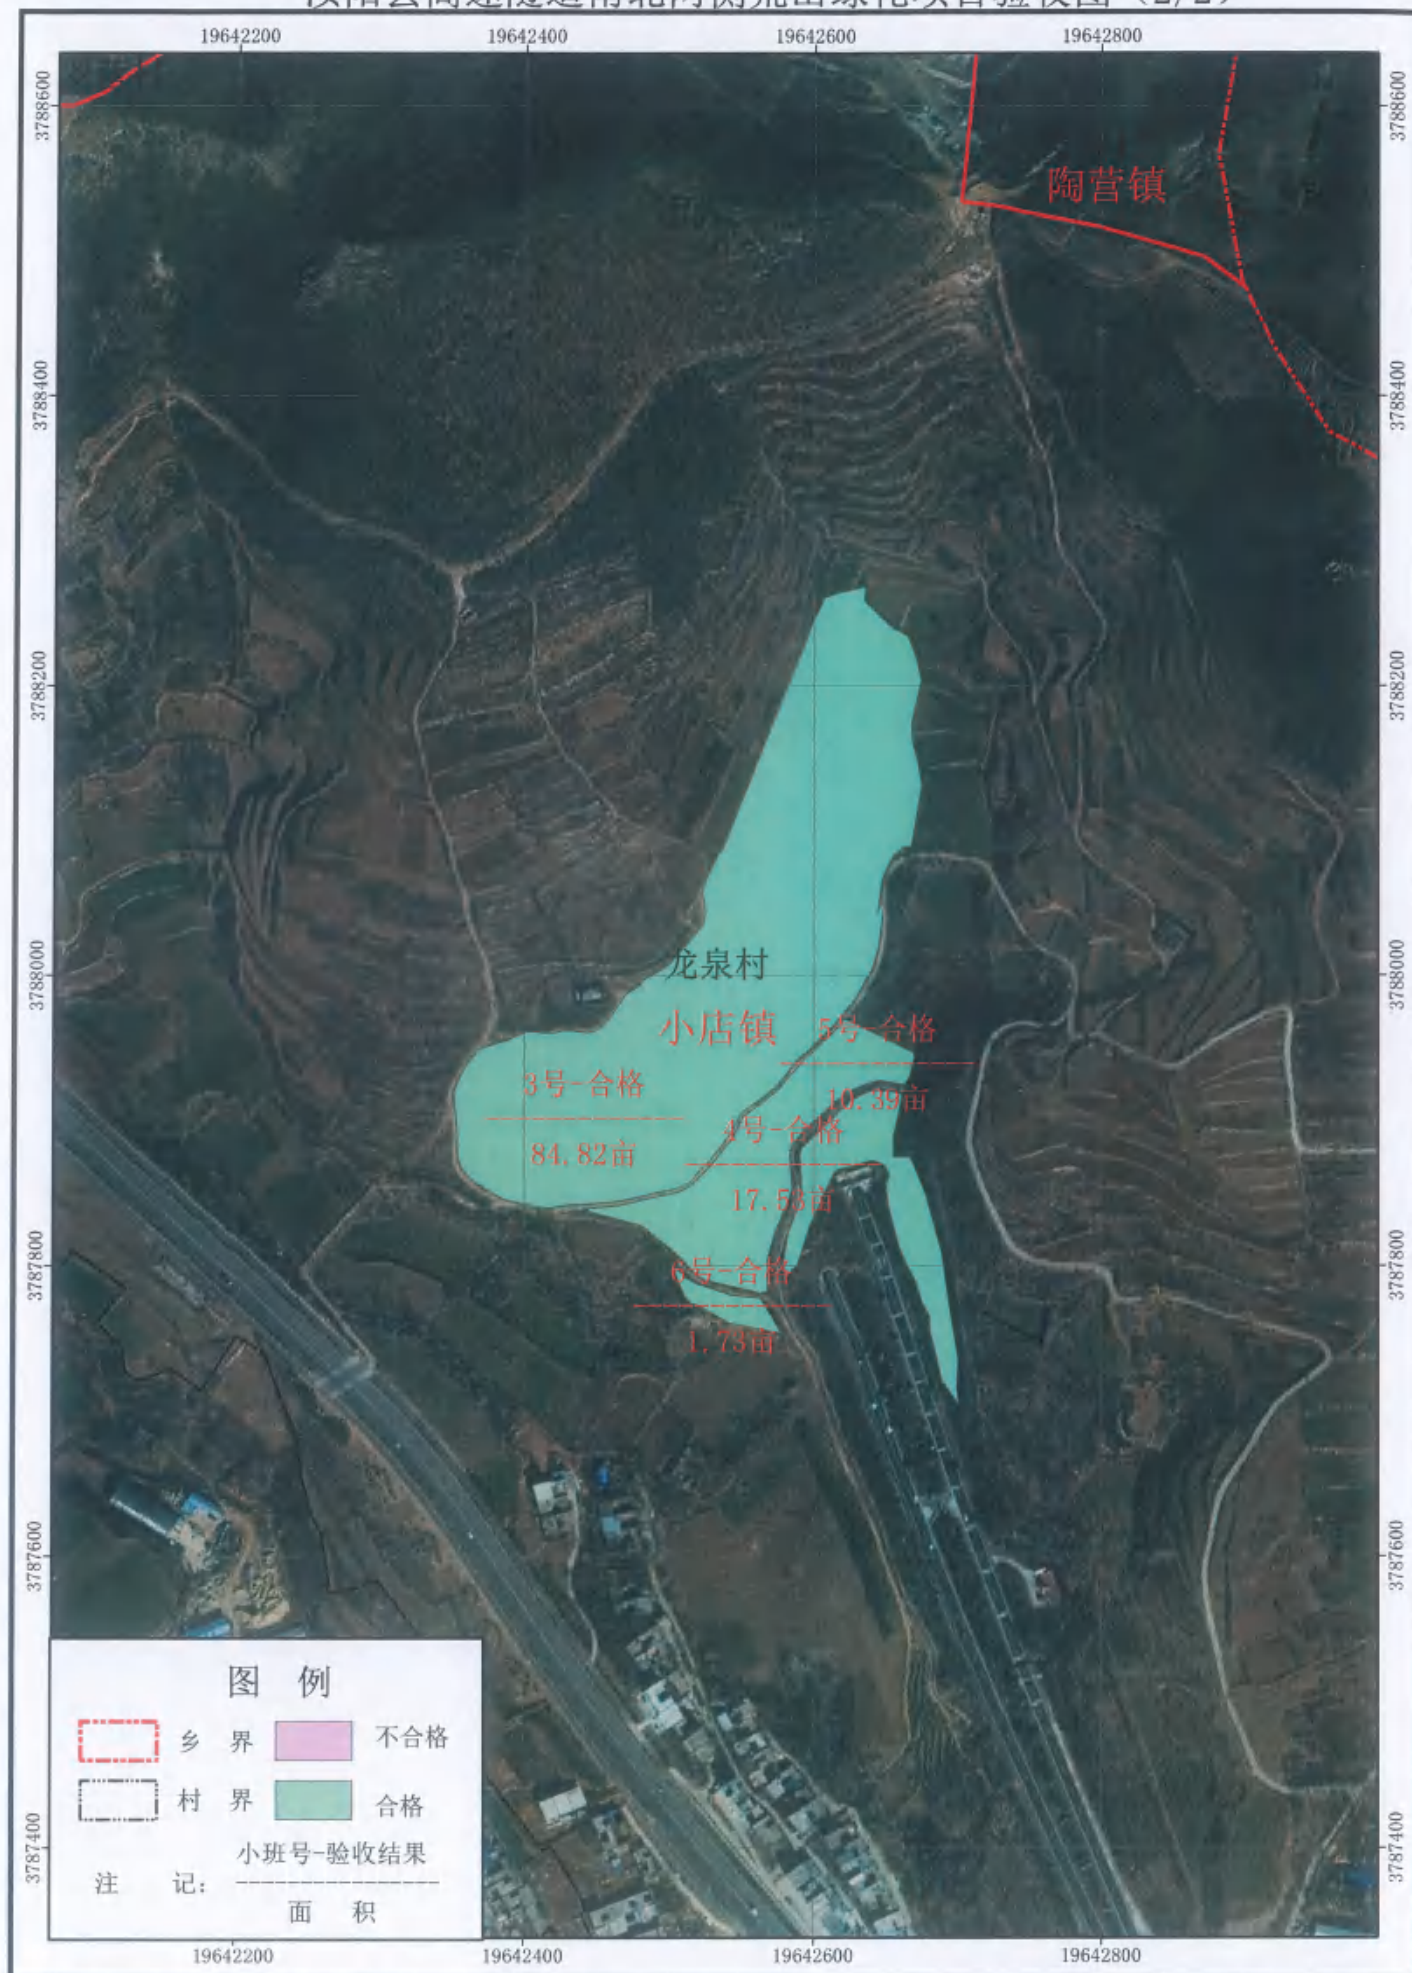

汝阳县高速隧道南北两侧荒山绿化工程验收现场照片

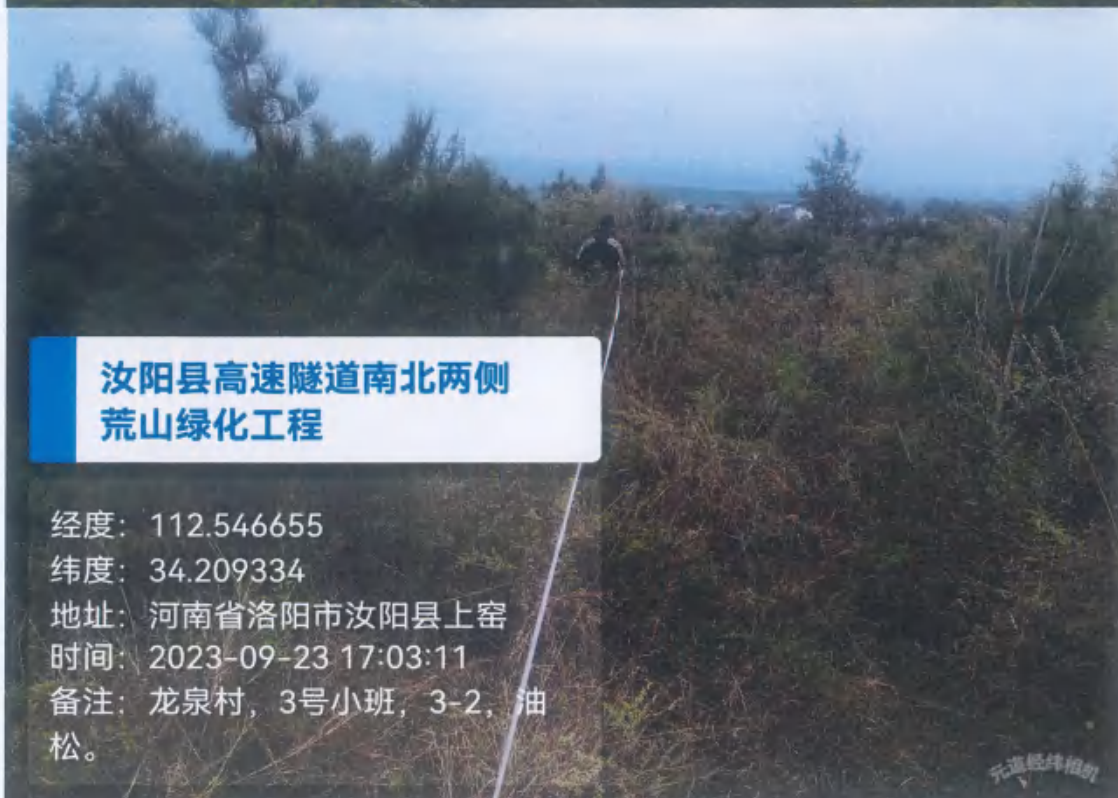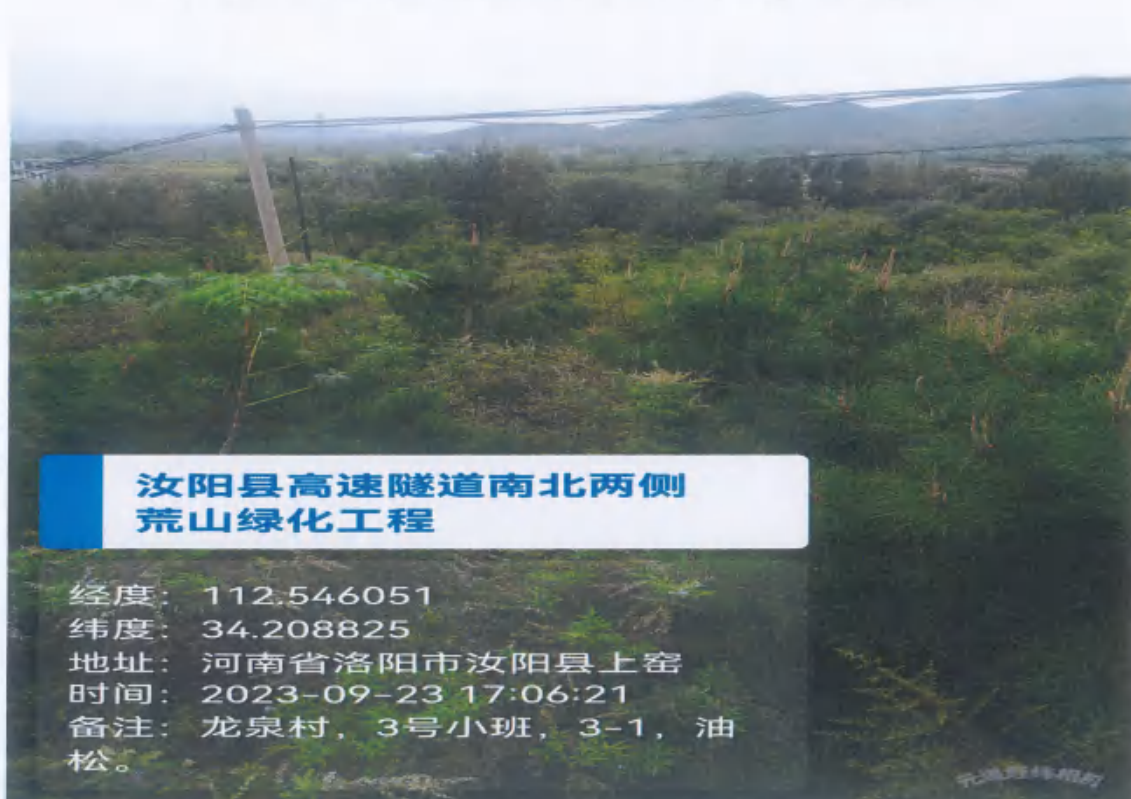


汝阳县高速隧道南北两侧荒山绿化工程验收现场照片



**汝阳县高速隧道南北两侧
荒山绿化工程**

经度: 112.547388
纬度: 34.209003
地址: 河南省洛阳市汝阳县上窑
时间: 2023-09-23 17:36:04
备注: 龙泉村, 4号小班, 4-1, 油
松。

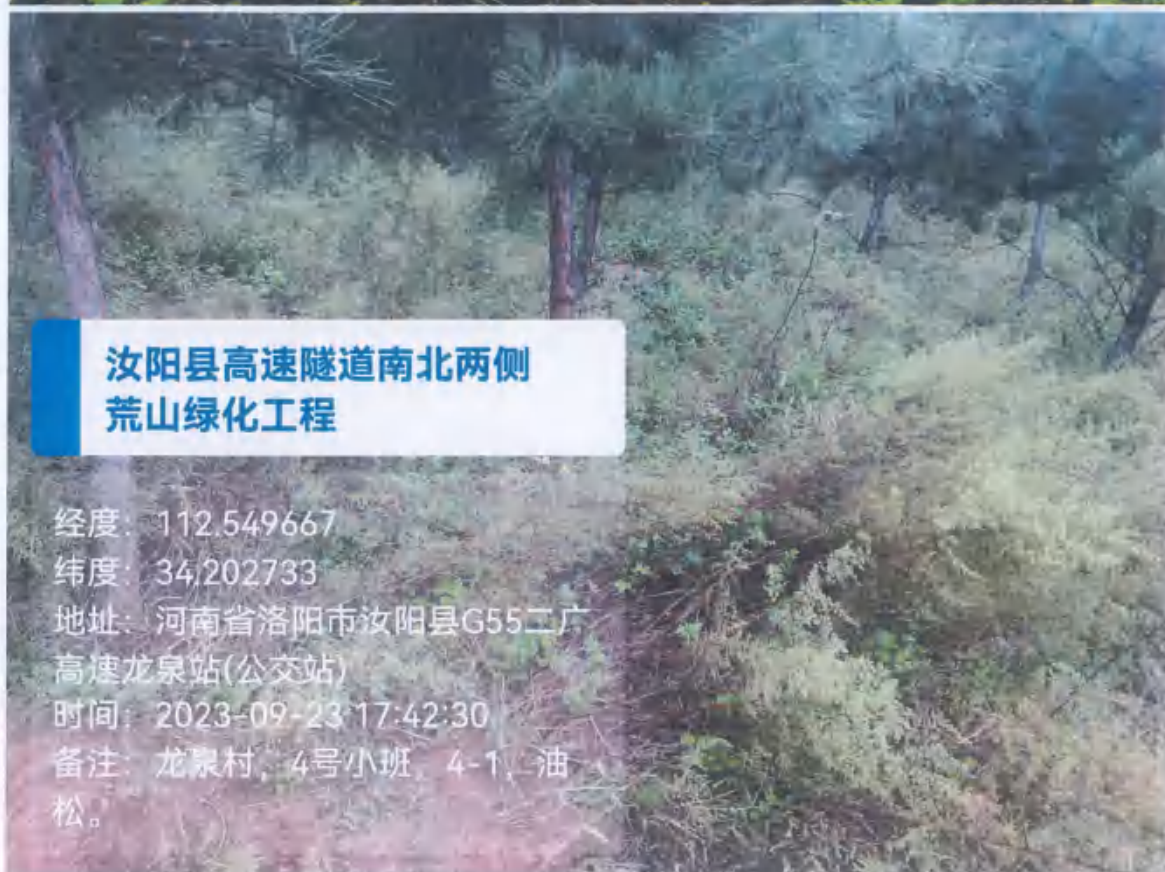

**汝阳县高速隧道南北两侧
荒山绿化工程**

经度: 112.549667
纬度: 34.202733
地址: 河南省洛阳市汝阳县G55二广
高速龙泉站(公交站)
时间: 2023-09-23 17:42:30
备注: 龙泉村, 4号小班, 4-1, 油
松。

汝阳县连翘种植小班验收表

	乡镇	行政村	小班号	面积	造林设计					抚育设计					验收意见		验收结果					
					树种	苗木规格	造林方法	造林密度 (株/亩)	造林		整地		栽植时间	方式	次数	时间	管护	成活率	意见	合格面积	不合格面积	不合格原因
									年度	施工时间	方法	规格										
	合计			2007.68													1914.2	93.48				
设计	陶营乡	范滩	1	16.49	连翘	地径0.3cm以上, 高度30cm, 裸根一级苗。	植苗造林	111	2022	冬季或春季	人工开挖树穴	30*30*40	冬季或春季	松土、除草 浇水、补植	1-2或者2-4	夏秋季	1年					
验收	陶营乡	范滩	1	✓	✓	✓	✓	111	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	89.5	合格	16.49	0		
设计	陶营乡	范滩	2	20.13	连翘	地径0.3cm以上, 高度30cm, 裸根一级苗。	植苗造林	111	2022	冬季或春季	人工开挖树穴	30*30*40	冬季或春季	松土、除草 浇水、补植	1-2或者2-4	夏秋季	1年					
验收	陶营乡	范滩	2	✓	✓	✓	✓	111	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	94.5	合格	20.13	0		
设计	小店镇	紫罗村	3	77.03	连翘	地径0.3cm以上, 高度30cm, 裸根一级苗。	植苗造林	111	2022	冬季或春季	人工开挖树穴	30*30*40	冬季或春季	松土、除草 浇水、补植	1-2或者2-4	夏秋季	1年					
验收	小店镇	紫罗村	3	✓	✓	✓	✓	111	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	93	合格	77.03	0		
设计	小店镇	小店	4	276.12	连翘	地径0.3cm以上, 高度30cm, 裸根一级苗。	植苗造林	111	2022	冬季或春季	人工开挖树穴	30*30*40	冬季或春季	松土、除草 浇水、补植	1-2或者2-4	夏秋季	1年					
验收	小店镇	小店	4	✓	✓	✓	✓	111	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	89.5	合格	276.12	0		
设计	小店镇	马庄村	5	154.34	连翘	地径0.3cm以上, 高度30cm, 裸根一级苗。	植苗造林	111	2022	冬季或春季	人工开挖树穴	30*30*40	冬季或春季	松土、除草 浇水、补植	1-2或者2-4	夏秋季	1年					
验收	小店镇	马庄村	5	✓	✓	✓	✓	111	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	91.7	合格	154.34	0		
设计	小店镇	马庄	6	165.11	连翘	地径0.3cm以上, 高度30cm, 裸根一级苗。	植苗造林	111	2022	冬季或春季	人工开挖树穴	30*30*40	冬季或春季	松土、除草 浇水、补植	1-2或者2-4	夏秋季	1年					
验收	小店镇	马庄	6	✓	✓	✓	✓	111	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	92.6	不合格	165.11	0		
设计	小店镇	小店村	7	94.77	连翘	地径0.3cm以上, 高度30cm, 裸根一级苗。	植苗造林	111	2022	冬季或春季	人工开挖树穴	30*30*40	冬季或春季	松土、除草 浇水、补植	1-2或者2-4	夏秋季	1年					
验收	小店镇	小店村	7	✓	✓	✓	✓	111	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	92	合格	94.77	0		
设计	小店镇	双丰村	8	6.49	连翘	地径0.3cm以上, 高度30cm, 裸根一级苗。	植苗造林	111	2022	冬季或春季	人工开挖树穴	30*30*40	冬季或春季	松土、除草 浇水、补植	1-2或者2-4	夏秋季	1年					
验收	小店镇	双丰村	8	✓	✓	✓	✓	111	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	91.8	合格	6.49	0		
设计	小店镇	双丰村	9	77.69	连翘	地径0.3cm以上, 高度30cm, 裸根一级苗。	植苗造林	111	2022	冬季或春季	人工开挖树穴	30*30*40	冬季或春季	松土、除草 浇水、补植	1-2或者2-4	夏秋季	1年					

汝阳县连翘种植小班验收表

	乡镇	行政村	小班号	面积	造林设计					抚育设计				管护	验收意见		验收结果	
					树种	苗木规格	造林方法	造林密度 (株/亩)	造林	整地	方式	次数	时间		成活率	意见	合格面积	不合格面积 不合格原因
	合计			2007.68													1914.2	93.48
验收	小店镇	双丰村	9	✓	✓	✓	✓	111	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91.2	合格	77.69	0
设计	小店镇	双丰村	10	2.1	连翘	地径0.3cm以上, 高度30cm, 裸根一级苗。	植苗造林	111	2022	冬季或春季	人工开挖树穴	30*30*40	冬季或春季	松土、除草 浇水、补植	1-2或者2-4	夏秋季		
验收	小店镇	双丰村	10	✓	✓	✓	✓	111	✓	✓	✓	✓	✓	✓	92	合格	2.1	0
设计	小店镇	双丰村	11	3.16	连翘	地径0.3cm以上, 高度30cm, 裸根一级苗。	植苗造林	111	2022	冬季或春季	人工开挖树穴	30*30*40	冬季或春季	松土、除草 浇水、补植	1-2或者2-4	夏秋季		
验收	小店镇	双丰村	11	✓	✓	✓	✓	111	✓	✓	✓	✓	✓	✓	93.6	合格	3.16	0
设计	小店镇	双丰村	12	13.1	连翘	地径0.3cm以上, 高度30cm, 裸根一级苗。	植苗造林	111	2022	冬季或春季	人工开挖树穴	30*30*40	冬季或春季	松土、除草 浇水、补植	1-2或者2-4	夏秋季		
验收	小店镇	双丰村	12	✓	✓	✓	✓	111	✓	✓	✓	✓	✓	✓	89.7	合格	13.1	0
设计	城关镇	云梦村	13	56.09	连翘	地径0.3cm以上, 高度30cm, 裸根一级苗。	植苗造林	111	2022	冬季或春季	人工开挖树穴	30*30*40	冬季或春季	松土、除草 浇水、补植	1-2或者2-4	夏秋季		
验收	城关镇	云梦村	13	✓	✓	✓	✓	111	✓	✓	✓	✓	✓	✓	93	合格	56.09	0
设计	城关镇	云梦	14	103.9	连翘	地径0.3cm以上, 高度30cm, 裸根一级苗。	植苗造林	111	2022	冬季或春季	人工开挖树穴	30*30*40	冬季或春季	松土、除草 浇水、补植	1-2或者2-4	夏秋季		
验收	城关镇	云梦	14	✓	✓	✓	✓	111	✓	✓	✓	✓	✓	✓	91	合格	103.9	0
设计	城关镇	云梦	15	183.61	连翘	地径0.3cm以上, 高度30cm, 裸根一级苗。	植苗造林	111	2022	冬季或春季	人工开挖树穴	30*30*40	冬季或春季	松土、除草 浇水、补植	1-2或者2-4	夏秋季		
验收	城关镇	云梦	15	✓	✓	✓	✓	111	✓	✓	✓	✓	✓	✓	89	合格	183.61	0
设计	城关镇	云梦	16	68.8	连翘	地径0.3cm以上, 高度30cm, 裸根一级苗。	植苗造林	111	2022	冬季或春季	人工开挖树穴	30*30*40	冬季或春季	松土、除草 浇水、补植	1-2或者2-4	夏秋季		
验收	城关镇	云梦	16	✓	✓	✓	✓	111	✓	✓	✓	✓	✓	✓	94	合格	68.8	0
设计	刘店镇	滕岭村	17	63.52	连翘	地径0.3cm以上, 高度30cm, 裸根一级苗。	植苗造林	111	2022	冬季或春季	人工开挖树穴	30*30*40	冬季或春季	松土、除草 浇水、补植	1-2或者2-4	夏秋季		
验收	刘店镇	滕岭村	17	✓	✓	✓	✓	111	✓	✓	✓	✓	✓	✓	86.2	合格	63.52	0

汝阳县连翘种植小班验收表

	乡镇	行政村	小班号	面积	造林设计								抚育设计			管护	验收意见		验收结果			
					树种	苗木规格	造林方法	造林密度(株/亩)	造林		整地		栽植时间	方式	次数		时间	成活率	意见	合格面积	不合格面积	不合格原因
									年度	施工时间	方法	规格										
	合计			2007.68														1914.2	93.48			
设计	刘店镇	滕岭村	18	55.77	连翘	地径0.3cm以上,高度30cm、裸根一级苗。	植苗造林	111	2022	冬季或春季	人工开挖树穴	30*30*40	冬季或春季	松土、除草浇水、补植	1-2或者2-4	夏秋季	1年					
验收	刘店镇	滕岭村	18	√	√	√	√	111	√	√	√	√	√	/	/	/	/	86.7	合格	55.77	0	
设计	柏树乡	杨沟村	19	76.09	连翘	地径0.3cm以上,高度30cm、裸根一级苗。	植苗造林	111	2022	冬季或春季	人工开挖树穴	30*30*40	冬季或春季	松土、除草浇水、补植	1-2或者2-4	夏秋季	1年					
验收	柏树乡	杨沟村	19	0	√	√	√	111	√	√	√	√	√	/	/	/	/	77	不合格	0	76.09	成活率不足
设计	十八盘乡	鸭兰村	20	415.33	连翘	地径0.3cm以上,高度30cm、裸根一级苗。	植苗造林	111	2022	冬季或春季	人工开挖树穴	30*30*40	冬季或春季	松土、除草浇水、补植	1-2或者2-4	夏秋季	1年					
验收	十八盘乡	鸭兰村	20	√	√	√	√	111	√	√	√	√	√	/	/	/	/	88.2	合格	415.33	0	
设计	十八盘乡	鸭兰村	21	14.37	连翘	地径0.3cm以上,高度30cm、裸根一级苗。	植苗造林	111	2022	冬季或春季	人工开挖树穴	30*30*40	冬季或春季	松土、除草浇水、补植	1-2或者2-4	夏秋季	1年					
验收	十八盘乡	鸭兰村	21	√	√	√	√	111	√	√	√	√	√	/	/	/	/	87.6	合格	14.37	0	
设计	十八盘乡	鸭兰村	22	46.28	连翘	地径0.3cm以上,高度30cm、裸根一级苗。	植苗造林	111	2022	冬季或春季	人工开挖树穴	30*30*40	冬季或春季	松土、除草浇水、补植	1-2或者2-4	夏秋季	1年					
验收	十八盘乡	鸭兰村	22	√	√	√	√	111	√	√	√	√	√	/	/	/	/	86.5	合格	46.28	0	
设计	十八盘乡	刘坡村	23	17.39	连翘	地径0.3cm以上,高度30cm、裸根一级苗。	植苗造林	111	2022	冬季或春季	人工开挖树穴	30*30*40	冬季或春季	松土、除草浇水、补植	1-2或者2-4	夏秋季	1年					
验收	十八盘乡	刘坡村	23	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	不合格	0	17.39	密度不足

汝阳县造林
隆安乡

造林验收样地调查表

现汉佳村 1 号小班

调查时间:

2023年 10 月 7 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合 格苗木)	造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
1	样园	1	96	14						
2	：	1	105	10						
3	样园	1	97	11						
合计			298	35					111	89.5
苗木规格			全检							
整地规格										
混交比例										

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

郭

郭

造林验收样地调查表

陶营乡范滩村 2 号小班 2023 年 10 月 7 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合 格苗木)	造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
1	样地	1	102	11						
2	:	:	99	15						
3	样地	1	114	5						
合计			315	31					115	94.5
苗木规格			合格							
整地规格										
混交比例										

造林验收样地调查表

陈营乡洪滩村 3 号小班 有见注湖种植 调查时间: 2023 年 10 月 7 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合 格苗木)	造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
①	样园	1	97	15						
②	、	、	60	21						
③	样园	1	113	6						
合计			310	42					117	93
苗木规格			合格							
整地规格										
混交比例										

造林验收样地调查表

小店镇 乡 小店村 4 号小班 济源连翘种植

调查时间:

2023年 10月 7 日

		分树种调查 (株)							综合	
样地号	样地类型	样地面积 (亩)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合 格苗木)	造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
1	样园	1	98	15						
2	∴	∴	101	14						
3	∴	∴	97	20						
4	∴	∴	96	18						
5	样园	1	107	12						
6	∴	∴	104	7						
7	∴	∴	97	21						
8	∴	∴	95	19						
9	样园	1	99	13						
合计			894	139					115	89.5
苗木规格			全检							
整地规格										
混交比例										

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨军

郭亚磊

造林验收样地调查表

小庄乡 乡马庄村

5号小班 调查时间:

2023年 10月 7日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合 格苗木)	造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
1	样田	1	97	16						
2	:	:	95	21						
3	:	:	113	8						
4	:	:	106	11						
5	样田	1	98	17						
合计			509	73					116	91.7
苗木规格			合格							
整地规格										
混交比例										

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨恩

祁玉

造林验收样地调查表

小店镇 乡 马庄村 6 号小班造林验收调查时间:

2023年 10 月 8 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合 格苗木)	造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
1	样圆	1	95	18						
2	∴	∴	99	20						
3	∴	∴	113	9						
4	∴	∴	106	6						
5	样圆	1	101	10						
合计			514	63					115	92.6
苗木规格			合格							
整地规格										
混交比例										

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨建邦

郭亚西

小店乡小店村 7 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 10 月 8 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			连翘						造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样园	1	100	11						
2	样园	1	110	2						
3	样园	1	96	16						
4	样园	1	105	5						
5	样园	1	102	9						
合计			513	43					111	92
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨亚平

郭亚西

造林验收样地调查表

小屯镇 乡 双丰村 8号小班 调查时间: 2023年 10月 8日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合 格苗木)	造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
1	杨	1	94	9						
2	杏	1	95	12						
3	杨	1	113	4						
合计			306	25					111	91.3
苗木规格			合格							
整地规格										
混交比例										

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨建东

张世西

造林验收样地调查表

小店镇乡 双丰村 9号小班 连翘种植 调查时间: 2023年 10月 8日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合 格苗木)	造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
1	样地	1	98	21						
2	:	:	103	14						
3	:	:	105	7						
4	样地	1	99	14						
合计			405	56					115	91.2
苗木规格			合格							
整地规格										
混交比例										

造林验收样地调查表

小店镇 乡 双丰村 10 号小班 调查时间: 2017 年 10 月 8 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合 格苗木)	造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
1	样地	0.5	49	11						
2	:	0.5	50	3						
3	样地	0.5	53	5						
合计			152	19					114	92
苗木规格			合格							
整地规格										
混交比例										

造林验收样地调查表

小屯乡 双丰村 11号小班 调查时间: 2023年 10月 8日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合 格苗木)	造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
1	样地	0.5	49	8						
2	:	:	52	3						
3	样地	0.5	55	2						
合计			156	13					113	93.6
苗木规格			合格							
整地规格										
混交比例										

造林验收样地调查表

小庄镇 乡 双丰村 12号小班 调查时间: 2013年 10月 8日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合 格苗木)	造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
1	样地	1	97	16						
2	样地	1	94	13						
3	样地	1	103	10						
合计			299	39					113	89.7
苗木规格			合格							
整地规格										
混交比例										

造林验收样地调查表

城关镇乡 云坡 村 13 号小班 濮阳县陈留镇种指 调查时间: 2023 年 10 月 8 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合 格苗木)	造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
1	样园	1	98	21						
2	:	:	103	13						
3	样园	1	112	4						
合计			313	38					117	93
苗木规格			合格							
整地规格										
混交比例										

城关乡 云梦村 14号小班

汝阳县连片造林

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 10 月 8 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			近旁						造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样圆	1	107	5						
2	样圆	1	98	13						
3	样圆	1	105	8						
4	样圆	1	97	14						
5	样圆	1	89	23						
合计			496	53					111	91
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

李洪恩

郭亚飞

汝阳县连奕种植
城关乡云梦村 15 号小班

造林验收样地调查表

调查时间：2023 年 10 月 7 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			连翘						造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样圆	1	104	7						
2	样圆	1	96	16						
3	样圆	1	98	13						
4	样圆	1	106	5						
5	样圆	1	89	21						
6	样圆	1	97	14						
合计			590	76					111	89
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨典昂

郭亚西

造林验收样地调查表

城关镇乡云梦村 16 号小班 调查时间: 2023 年 10 月 8 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合 格苗木)	造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
1	杨国	1	97	21						
2	:	1	103	5						
3	:	1	112	2						
4	杨国	1	107	4						
合计			419	32					112	94
苗木规格			合格							
整地规格										
混交比例										

造林验收样地调查表

刘应镇 乡 陈岭村 17 号小班 邓晓连 种植 调查时间:

2023 年 10 月 8 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合 格苗木)	造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
1	样地	1	96	16						
2	:	:	97	15						
3	:	:	98	21						
4	样地	1	95	19						
合计			383	71					114	86.2
苗木规格			合格							
整地规格										
混交比例										

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

邓晓连

郭亚西

造林验收样地调查表

刘店镇 乡 滕屯 村 18 号小班 调查时间: 2023 年 10 月 8 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合 格苗木)	造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
1	样田	1	96	14						
2	：	：	95	21						
3	样田	1	98	18						
合计			289	53					114	86.7
苗木规格			合格							
整地规格										
混交比例										

造林验收样地调查表

十八号 乡 鸭兰村 20 号小班 调查时间: 2023年 10 月 8 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合 格苗木)	造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
1	样地	1	97	18						
2	:	:	96	20						
3	:	:	99	23						
4	:	:	101	16						
5	:	:	105	17						
6	:	:	96	18						
7	样地	1	97	20						
8	:	:	96	23						
9	:	:	97	21						
10	:	:	95	26						
11	:	:	98	20						
12	:	:	103	7						
13	样地	1	95	18						
合计			1275	247					117	88.2
苗木规格			合格							
整地规格										
混交比例										

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨建邦

刘亚西

造林验收样地调查表

十八里乡 王村 21 号小班 调查时间: 2023 年 10 月 8 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合 格苗木)	造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
1	样地	1	97	15						
2	样地	1	99	17						
3	样地	1	96	20						
合计			292	42					111	87.6
苗木规格			合格							
整地规格										
混交比例										

造林验收样地调查表

永十八里乡鸭兰村 22 号小班 为建群种指 调查时间: 2023 年 10 月 8 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合 格苗木)	造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
1	样园	1	95	21						
2	样园	1	96	15						
3	样园	1	99	20						
合计			290	56					115	86.5
苗木规格			合格							
整地规格										
混交比例										

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨建群

郭亚西

造林验收样地调查表

十八里乡刘坡村 23 号小班 调查时间: 2023 年 10 月 8 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合 格苗木)	造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
1	样地	1	0	0						
2	样地	1	0	0						
3	样地	1	0	0						
合计			0	0					0	0
苗木规格			不合格							
整地规格										
混交比例										

汝阳县连翘种植项目验收图 (1/7)




坐标系: CGCS2000_GK_Zone_19

河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

汝阳县连翘种植项目验收图 (2/7)



汝阳县连翘种植项目验收图 (3/7)

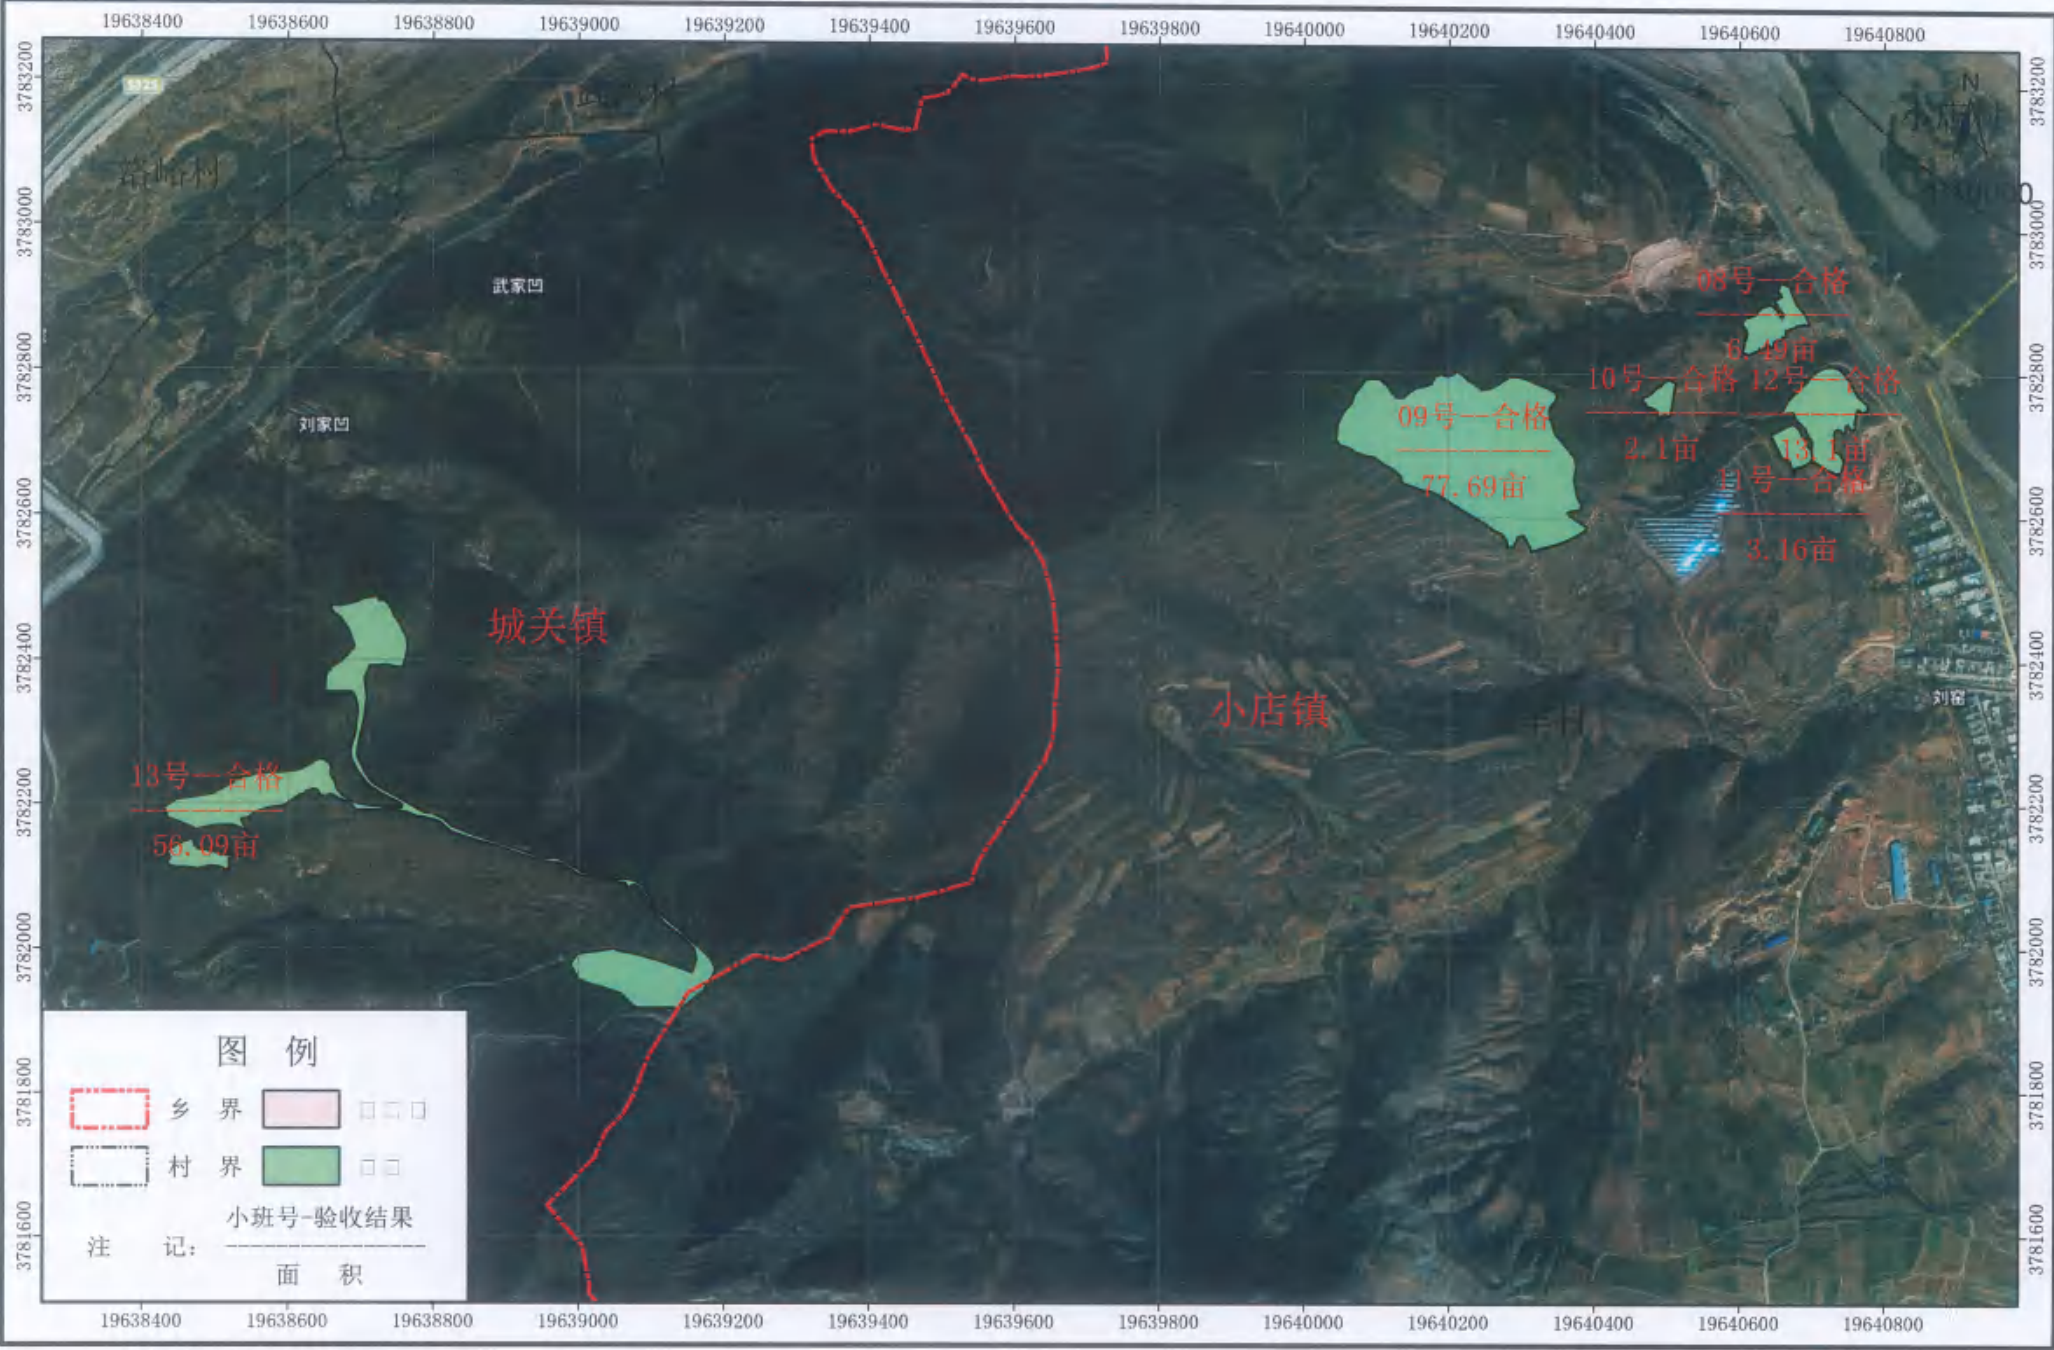

汝阳县连翘种植项目验收图 (4/7)



汝阳县连翘种植项目验收图 (5/7)



坐标系: CGCS2000_GK_Zone_19

河南省鑫森源林业勘查规划设计有限公司

汝阳县连翘种植项目验收图 (6/7)



坐标系: CGCS2000_GK_Zone_19

河南省鑫森源林业勘查规划设计有限公司

汝阳县连翘种植项目验收图 (7/7)



坐标系: CGCS2000_GK_Zone_19

河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

汝阳县连翘种植项目验收现场照片



汝阳县连翘种植项目验收现场照片



汝阳县上台隧道南侧困难地增绿添彩工程小班验收表

单位：亩、株/亩、株、kg、年

	乡镇	行政村	工程名称	小班号	规划面积									造林设计										验收意见		验收结果	
						混交比例	株行距	密度	树种1		树种2		树种3		造林方法	整地方法	树穴规格	栽植时间	扩穴标准	浇水	施肥	病虫害防治	除草	成活率	意见	合格面积	不合格面积
									名称	规格	名称	规格	名称	规格													
	合计				154.02																					154	0
设计	小店镇	龙泉村	上台隧道南侧困难地增绿添彩工程	1	82.08	5:5	2*2	167	侧柏	高度1.5cm以上冠幅饱满不偏冠不脱腿、营养钵一级苗			血皮槭	米径2公分以上，2.2米截干，带土球25公分，一级苗	植苗造林	机械清理杂草后按梯田标准整地	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次				
验收	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	94	合格	82.08	0
设计	小店镇	龙泉村	上台隧道南侧困难地增绿添彩工程	2	20.39	5:5	2*2	167	侧柏	高度1.5cm以上冠幅饱满不偏冠不脱腿、营养钵一级苗			血皮槭	米径2公分以上，2.2米截干，带土球25公分，一级苗	植苗造林	机械清理杂草后按梯田标准整地	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次				
验收	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	91	合格	20.39	0
设计	小店镇	龙泉村	上台隧道南侧困难地增绿添彩工程	3	25.49	5:5	2*2	167			白皮松	高度1.5m、全冠不脱腿土球25cm、一级苗	血皮槭	米径2公分以上，2.2米截干，带土球25公分，一级苗	植苗造林	机械清理杂草后按梯田标准整地	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次				

汝阳县上台隧道南侧困难地增绿添彩工程小班验收表

单位：亩、株/亩、株、kg、年

	乡镇	行政村	工程名称	小班号	规划面积										造林设计										验收意见		验收结果	
						混交比例	株行距	密度	树种1		树种2		树种3		造林方法	整地方法	树穴规格	栽植时间	扩穴标准	浇水	施肥	病虫害防治	除草	成活率	意见	合格面积	不合格面积	
									名称	规格	名称	规格	名称	规格														
验收	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	合格	25.49	0	
设计	小店镇	龙泉村	上台隧道南侧困难地增绿添彩工程	4	26.06	5:5	2*2	167			白皮松	高度1.5m、全冠不脱腿土球25cm，一级苗	血皮槭	米径2公分以上，2.2米截干，带土球25公分，一级苗	植苗造林	机械清理杂草后按梯田标准整地	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次					
验收	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	91	合格	26.06	0	

许昌县上阳街道南侧11困难地

造林验收样地调查表

小屯镇乡 龙泉村 1 号小班

调查时间:

2023 年 10 月 7 日



样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			侧柏		白皮松				造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样圆	1	80	3	79	80 4				
2	样圆	1	76	8	76	7				
3	样圆	1	79	5	74	9				
4	样圆	1	81	3	82	2				
5	样圆	1	75	8	82	2				
合计			391	28	392	24			167	94
苗木规格			合格		合格					
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨强

郭亚西

2023年10月7日 造林验收样地调查表

小庄乡 尤泉村 2 号小班

调查时间:

2023 年 10 月 7 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			侧柏		红皮槲				造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样圃	1	72	11	77	8				
2	样圃	1	76	8	79	5				
3	样圃	1	80	4	73	10				
合计			228	23	229	23			167	91
苗木规格			合格		合格					
整地规格			合格							
混交比例			合格							

新阳县上台街道南侧困难地

小坡乡 龙泉村 村 3 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023年 10 月 7 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			侧柏		细皮槭				造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样圃	1	75	9	80	4				
2	样圃	1	73	10	71	12				
3	样圃	1	79	5	74	9				
合计			227	24	225	25			167	90
苗木规格			全格		全格					
整地规格			全格							
混交比例			全格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨鹏

郭亚西

小庄鎮 乡 尤泉村 村 4 号小班

调查时间:

2023年 10月 7日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红皮松				造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样圆	1	80	3	79	5				
2	样圆	1	72	13	79	4				
3	样圆	1	70	13	78	6				
合计			222	29	236	15			167	91
苗木规格			全格		全格					
整地规格			全格							
混交比例			全格							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:



杨寒昂

郭正功


汝阳县上台隧道南侧困难地增绿添彩工程验收图 (1/1)



汝阳县上台隧道南侧困难地增绿添彩工程验收现场照片

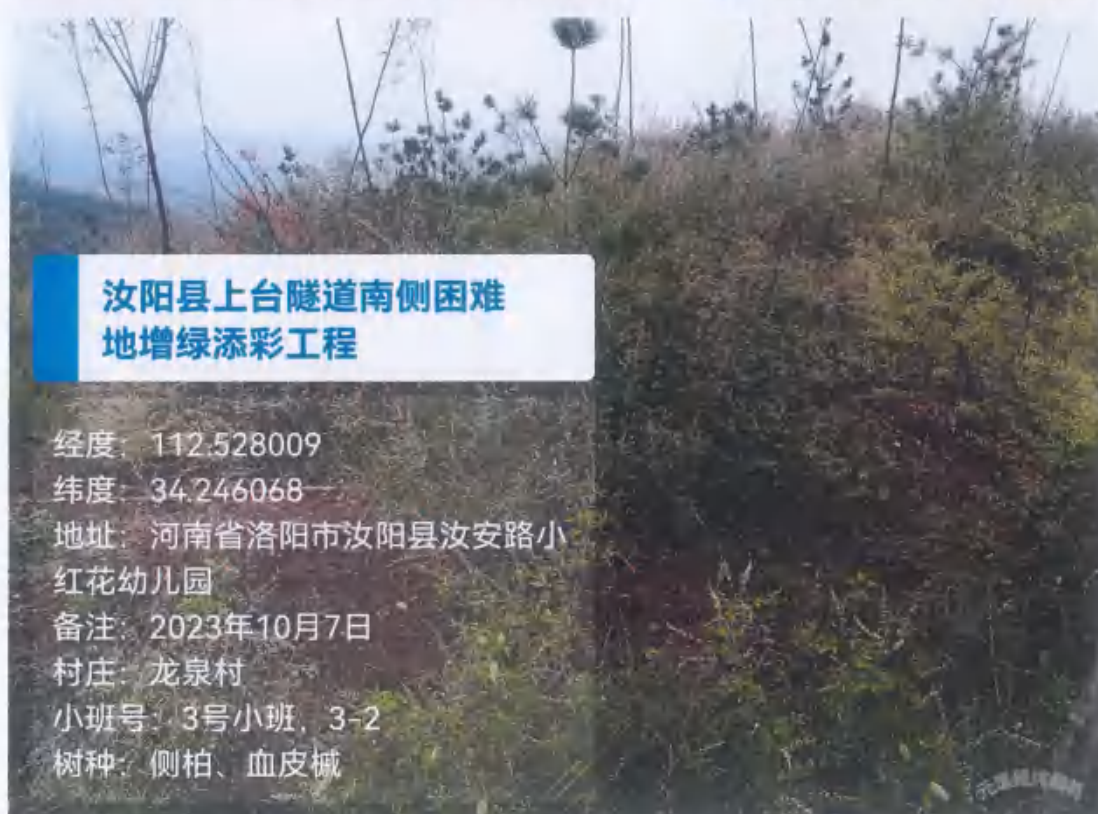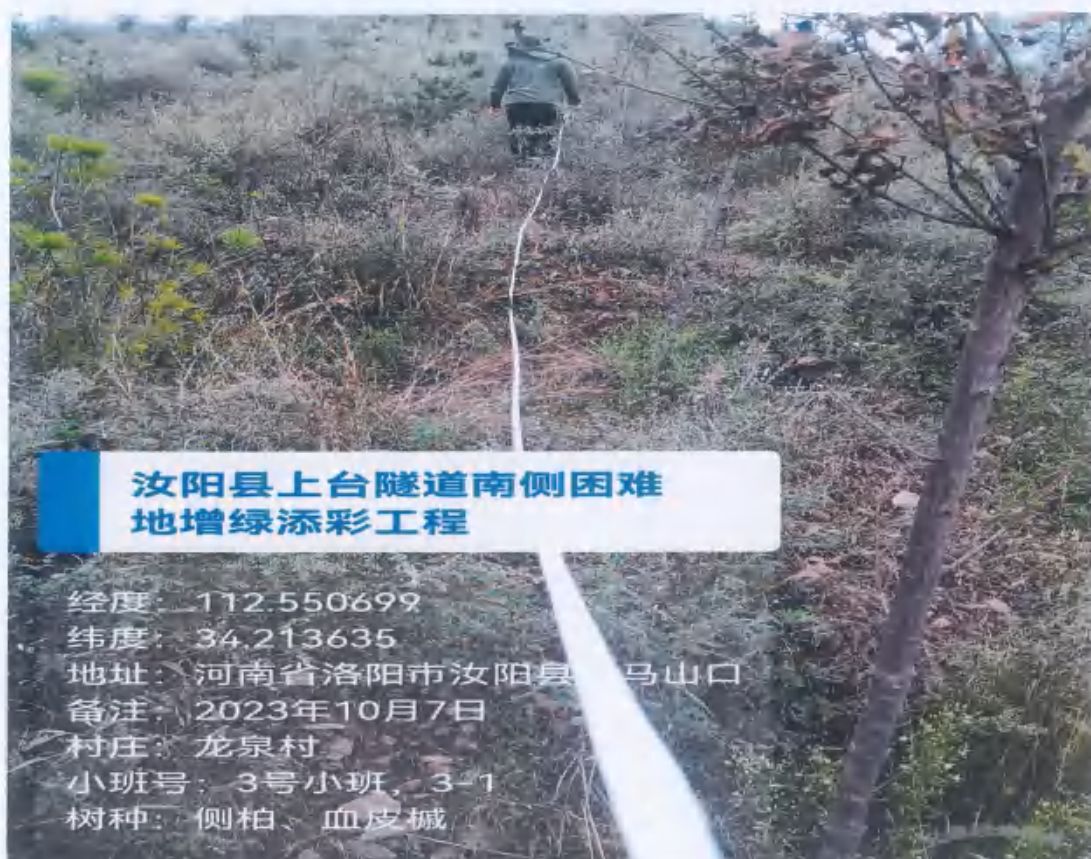

汝阳县上台隧道南侧困难地增绿添彩工程验收现场照片

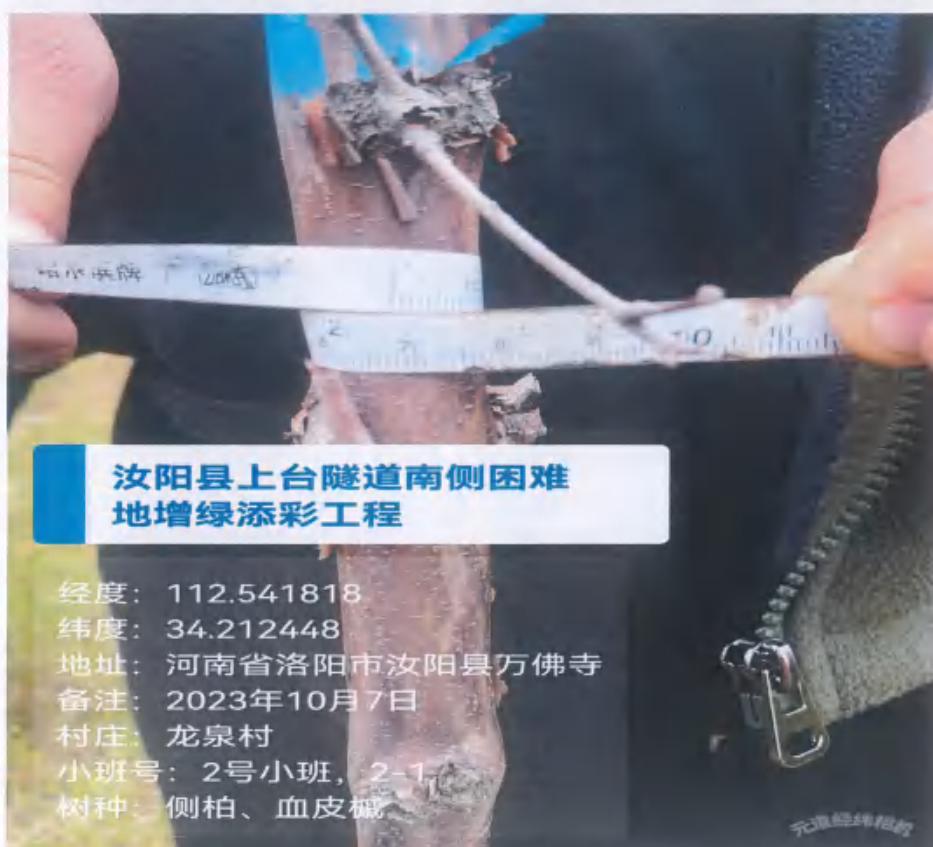

汝阳县生态廊道北环路绿化项目验收表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人

	乡镇	行政村	项目名称	小班号	规划面积	模型	苗木设计						造林设计										验收意见		验收结果			
							树种配置				造林密度	每亩株数	造林方法	整地方法	树穴规格	栽植时间	扩穴标准	浇水	施肥	病虫害防治	除草							
							树种1	树种2	树种3	树种4												比例						
合计					673.85																					590.96	82.89	
设计	柏树乡	漫流村	北环路	1	40.52	C	白皮松	红叶李		3:7	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次							
验收	柏树乡	漫流村	北环路	1	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	94.6	合格	40.52	0			
设计	柏树乡	漫流村	北环路	2	7.29	C	白皮松	红叶李		3:7	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次							
验收	柏树乡	漫流村	北环路	2	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	88	合格	7.29	0			
设计	柏树乡	漫流村	北环路	3	15.21	B	白皮松	红叶李	楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次							
验收	柏树乡	漫流村	北环路	3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	89	合格	15.21	0			
设计	柏树乡	漫流村	北环路	4	5.95	C	白皮松	红叶李		3:7	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次							
验收	柏树乡	漫流村	北环路	4	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	94	合格	5.95	0			
设计	柏树乡	漫流村	北环路	5	1.86	B	白皮松	红叶李	楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次							
验收	柏树乡	漫流村	北环路	5	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	87	合格	1.86	0			

汝阳县生态廊道北环路绿化项目验收表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人

	乡镇	行政村	项目名称	小班号	规划面积	模型	苗木设计					造林设计										验收意见		验收结果		
							树种配置				造林密度	每亩株数	造林方法	整地方法	树穴规格	栽植时间	扩穴标准	浇水	施肥	病虫害防治	除草	成活率	意见	合格面积	不合格面积	不合格原因
							树种1	树种2	树种3	树种4																
合计					673.85																			590.96	82.89	
设计	柏树乡	漫流村	北环路	6	11.38	B	白皮松	红叶李	楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次					
验收	柏树乡	漫流村	北环路	6	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	合格	11.38	0	
设计	柏树乡	漫流村	北环路		2.66	C	白皮松	红叶李		3:7	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次					
验收	柏树乡	漫流村	北环路	7	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	89	合格	2.66	0	
设计	柏树乡	漫流村	北环路		4.94	C	白皮松	红叶李		3:7	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次					
验收	柏树乡	漫流村	北环路	8	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	86	合格	4.94	0	
设计	柏树乡	漫流村	北环路	9	4.27	A	白皮松	红叶李	栎树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次					
验收	柏树乡	漫流村	北环路	9	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	88	合格	4.27	0	
设计	柏树乡	漫流村	北环路		1.54	A	白皮松	红叶李	栎树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次					
验收	柏树乡	漫流村	北环路	10	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	86	合格	1.54	0	

汝阳县生态廊道北环路绿化项目验收表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人

	乡镇	行政村	项目名称	小班号	规划面积	模型	苗木设计					造林设计										验收意见		验收结果		
							树种配置				造林密度	每亩株数	造林方法	整地方法	树穴规格	栽植时间	扩穴标准	浇水	施肥	病虫害防治	除草	成活率	意见	合格面积	不合格面积	不合格原因
							树种1	树种2	树种3	树种4																
合计					673.85																			590.96	82.89	
设计	柏树乡	漫流村	北环路		7.51	A	白皮松	红叶李	栎树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次					
验收	柏树乡	布岭村	北环路	11	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	91	合格	7.51	0	
设计	柏树乡	布岭村	北环路	12	4.2	A	白皮松	红叶李	栎树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次					
验收	柏树乡	布岭村	北环路		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	合格	4.2	0	
设计	柏树乡	布岭村	北环路		0.5	D	白皮松			10	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次					
验收	柏树乡	布岭村	北环路	13	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	89	合格	0.5	0	
设计	柏树乡	布岭村	北环路		2.05	D	白皮松			10	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	柏树乡	布岭村	北环路	14	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	合格	2.05	0	
设计	柏树乡	布岭村	北环路		9.54	A	白皮松	红叶李	栎树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					

汝阳县生态廊道北环路绿化项目验收表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人

	乡镇	行政村	项目名称	小班号	规划面积	模型	苗木设计					造林设计										验收意见		验收结果		
							树种配置				造林密度	每亩株数	造林方法	整地方法	树穴规格	栽植时间	扩穴标准	浇水	施肥	病虫害防治	除草	成活率	意见	合格面积	不合格面积	不合格原因
							树种1	树种2	树种3	树种4																
合计					673.85																			590.96	82.89	
验收	柏树乡	布岭村	北环路	15	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	\	√	\	\	\	\	90	合格	9.54	0	
设计	柏树乡	布岭村	北环路		0.64	A	白皮松	红叶李	栎树		3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次				
验收	柏树乡	布岭村	北环路	16	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	\	√	\	\	\	\	89	合格	0.64	0	
设计	柏树乡	布岭村	北环路		1.69	A	白皮松	红叶李	栎树		3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次				
验收	柏树乡	布岭村	北环路	17	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	\	√	\	\	\	\	88	合格	1.69	0	
设计	柏树乡	布岭村	北环路	18	2.61	A	白皮松	红叶李	栎树		3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次				
验收	柏树乡	布岭村	北环路	18	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	\	√	\	\	\	\	86	合格	2.61	0	
设计	柏树乡	布岭村	北环路		6.1	B	白皮松	红叶李	楸树		3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次				
验收	柏树乡	布岭村	北环路	19	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	\	√	\	\	\	\	88	合格	2.39	3.71	土地硬化

汝阳县生态廊道北环路绿化项目验收表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人

	乡镇	行政村	项目名称	小班号	规划面积	模型	苗木设计						造林设计										验收意见		验收结果			
							树种配置					造林密度	每亩株数	造林方法	整地方法	树穴规格	栽植时间	扩穴标准	浇水	施肥	病虫害防治	除草						
							树种1	树种2	树种3	树种4	比例																	
合计					673.85																					590.96	82.89	
设计	柏树乡	布岭村	北环路		10.8	B	白皮松	红叶李		楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次						
验收	柏树乡	布岭村	北环路	20	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	91	合格	10.8	0		
设计	柏树乡	布岭村	北环路		15.86	B	白皮松	红叶李		楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次						
验收	柏树乡	布岭村	北环路	21	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	91	合格	13.6	2.26	土地硬化	
设计	柏树乡	布岭村	北环路		2.15	B	白皮松	红叶李		楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次						
验收	柏树乡	布岭村	北环路	22	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	87	合格	2.15	0		
设计	柏树乡	布岭村	北环路		6.57	B	白皮松	红叶李		楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次						
验收	柏树乡	布岭村	北环路	23	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	合格	6.57	0		
设计	柏树乡	布岭村	北环路	24	8.65	B	白皮松	红叶李		楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次						

汝阳县生态廊道北环路绿化项目验收表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人

	乡镇	行政村	项目名称	小班号	规划面积	模型	苗木设计					造林设计										验收意见		验收结果		
							树种配置				造林密度	每亩株数	造林方法	整地方法	树穴规格	栽植时间	扩穴标准	浇水	施肥	病虫害防治	除草	成活率	意见	合格面积	不合格面积	不合格原因
							树种1	树种2	树种3	树种4																
合计					673.85																			590.96	82.89	
验收	柏树乡	布岭村	北环路	24	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	\	√	\	\	\	\	91	合格	8.65	0	
设计	城关镇	布岭村	北环路		1.54	A	白皮松	红叶李	栾树		3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次				
验收	城关镇	布岭村	北环路	25	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	\	√	\	\	\	\	57	不合格	0	1.54	成活率低
设计	城关镇	张河村	北环路		8.67	A	白皮松	红叶李	栾树		3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次				
验收	城关镇	张河村	北环路	26	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	\	√	\	\	\	\	87	合格	8.67	0	
设计	城关镇	张河村	北环路		9.45	A	白皮松	红叶李	栾树		3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次				
验收	城关镇	张河村	北环路	27	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	\	√	\	\	\	\	91	合格	9.45	0	
设计	城关镇	张河村	北环路		3.01	A	白皮松	红叶李	栾树		3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次				
验收	城关镇	张河村	北环路	28	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	\	√	\	\	\	\	94	合格	3.01	0	

汝阳县生态廊道北环路绿化项目验收表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人

	乡镇	行政村	项目名称	小班号	规划面积	模型	苗木设计					造林设计										验收意见		验收结果		
							树种配置				造林密度	每亩株数	造林方法	整地方法	树穴规格	栽植时间	扩穴标准	浇水	施肥	病虫害防治	除草	成活率	意见	合格面积	不合格面积	不合格原因
							树种1	树种2	树种3	树种4																
合计					673.85																			590.96	82.89	
设计	城关镇	张河村	北环路		10.33	A	白皮松	红叶李	栾树		3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次				
验收	城关镇	张河村	北环路	29	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	合格	10.33	0	
设计	城关镇	张河村	北环路	30	9.26	A	白皮松	红叶李	栾树		3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次				
验收	城关镇	张河村	北环路	30	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	合格	9.26	0	
设计	城关镇	张河村	北环路		9.71	A	白皮松	红叶李	栾树		3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次				
验收	城关镇	张河村	北环路	31	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	合格	9.71	0	
设计	城关镇	张河村	北环路		17.21	A	白皮松	红叶李	栾树		3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次				
验收	城关镇	张河村	北环路	32	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	合格	17.21	0	
设计	城关镇	张河村	北环路		6.06	A	白皮松	红叶李	栾树		3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次				

汝阳县生态廊道北环路绿化项目验收表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人

	乡镇	行政村	项目名称	小班号	规划面积	模型	苗木设计						造林设计										验收意见		验收结果			
							树种配置				造林密度	每亩株数	造林方法	整地方法	树穴规格	栽植时间	扩穴标准	浇水	施肥	病虫害防治	除草							
							树种1	树种2	树种3	树种4												比例						
合计					673.85																					590.96	82.89	
验收	城关镇	张河村	北环路	33	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	95	合格	6.06	0			
设计	城关镇	张河村	北环路		7.97	A	白皮松	红叶李	栎树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次							
验收	城关镇	张河村	北环路	34	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	93	合格	7.97	0			
设计	城关镇	张河村	北环路		7.06	A	白皮松	红叶李	栎树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次							
验收	城关镇	张河村	北环路	35	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	95	合格	7.06	0			
设计	城关镇	张河村	北环路	36	4.23	A	白皮松	红叶李	栎树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次							
验收	城关镇	张河村	北环路	36	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	92	合格	4.23	0			
设计	城关镇	张河村	北环路		4.53	A	白皮松	红叶李	栎树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次							
验收	城关镇	张河村	北环路	37	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	94	合格	4.53	0			

汝阳县生态廊道北环路绿化项目验收表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人

	乡镇	行政村	项目名称	小班号	规划面积	模型	苗木设计						造林设计										验收意见		验收结果			
							树种配置				造林密度	每亩株数	造林方法	整地方法	树穴规格	栽植时间	扩穴标准	浇水	施肥	病虫害防治	除草							
							树种1	树种2	树种3	树种4												比例						
合计					673.85																					590.96	82.89	
设计	城关镇	张河村	北环路		9.66	A	白皮松	红叶李	栾树		3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次						
验收	城关镇	张河村	北环路	38	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	95	合格	9.66	0		
设计	城关镇	张河村	北环路		9.84	A	白皮松	红叶李	栾树		3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次						
验收	城关镇	张河村	北环路	39	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	94	合格	9.84	0		
设计	城关镇	张河村	北环路		23.52	A	白皮松	红叶李	栾树		3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次						
验收	城关镇	张河村	北环路	40	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	93	合格	23.52	0		
设计	城关镇	张河村	北环路		10.71	A	白皮松	红叶李	栾树		3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次						
验收	城关镇	张河村	北环路	41	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	93	合格	10.71	0		
设计	城关镇	张河村	北环路	42	9.16	A	白皮松	红叶李	栾树		3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次						

汝阳县生态廊道北环路绿化项目验收表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人

	乡镇	行政村	项目名称	小班号	规划面积	模型	苗木设计					造林设计										验收意见		验收结果		
							树种配置				造林密度	每亩株数	造林方法	整地方法	树穴规格	栽植时间	扩穴标准	浇水	施肥	病虫害防治	除草	成活率	意见	合格面积	不合格面积	不合格原因
							树种1	树种2	树种3	树种4																
合计					673.85																			590.96	82.89	
验收	城关镇	张河村	北环路	42	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	92	合格	9.16	0	
设计	城关镇	张河村	北环路		4.9	A	白皮松	红叶李	栎树		3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次				
验收	城关镇	张河村	北环路	43	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	95	合格	4.9	0	
设计	城关镇	张河村	北环路		5.97	A	白皮松	红叶李	栎树		3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次				
验收	城关镇	张河村	北环路	44	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	94	合格	5.97	0	
设计	城关镇	张河村	北环路		5.42	A	白皮松	红叶李	栎树		3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次				
验收	城关镇	张河村	北环路	45	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	94	合格	5.42	0	
设计	城关镇	张河村	北环路		20.76	A	白皮松	红叶李	栎树		3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次				
验收	城关镇	张河村	北环路	46	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0	不合格	0	20.76	桃园

汝阳县生态廊道北环路绿化项目验收表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人

	乡镇	行政村	项目名称	小班号	规划面积	模型	苗木设计						造林设计										验收意见		验收结果			
							树种配置				造林密度	每亩株数	造林方法	整地方法	树穴规格	栽植时间	扩穴标准	浇水	施肥	病虫害防治	除草							
							树种1	树种2	树种3	树种4												比例						
合计					673.85																					590.96	82.89	
设计	城关镇	张河村	北环路		5.11	A	白皮松	红叶李	栾树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次							
验收	城关镇	张河村	北环路	47	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	92	合格	5.11	0			
设计	城关镇	井沟村	北环路	48	23.89	A	白皮松	红叶李	栾树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次							
验收	城关镇	井沟村	北环路	48	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0	不合格	0	23.89	桃园		
设计	城关镇	井沟村	北环路		7.99	B	白皮松	红叶李	楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次							
验收	城关镇	井沟村	北环路	49	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	92	合格	7.99	0			
设计	城关镇	井沟村	北环路		8.22	B	白皮松	红叶李	楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次							
验收	城关镇	井沟村	北环路	50	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	93	合格	8.22	0			
设计	城关镇	井沟村	北环路		10.5	B	白皮松	红叶李	楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次							

汝阳县生态廊道北环路绿化项目验收表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人

	乡镇	行政村	项目名称	小班号	规划面积	模型	苗木设计						造林设计										验收意见		验收结果		
							树种配置				造林密度	每亩株数	造林方法	整地方法	树穴规格	栽植时间	扩穴标准	浇水	施肥	病虫害防治	除草						
							树种1	树种2	树种3	树种4												比例					
合计					673.85																				590.96	82.89	
验收	城关镇	井沟村	北环路	51	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	93	合格	10.5	0		
设计	城关镇	井沟村	北环路		11.95	B	白皮松	红叶李		楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷药	3-5次					
验收	城关镇	井沟村	北环路	52	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	92	合格	11.95	0		
设计	城关镇	井沟村	北环路		1.88	B	白皮松	红叶李		楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷药	3-5次					
验收	城关镇	井沟村	北环路	53	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	89	合格	1.88	0		
设计	城关镇	杨庄村	北环路	54	11.07	B	白皮松	红叶李		楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷药	3-5次					
验收	城关镇	杨庄村	北环路	54	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	92	合格	11.07	0		
设计	城关镇	井沟村	北环路		3.42	B	白皮松	红叶李		楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷药	3-5次					
验收	城关镇	井沟村	北环路	55	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	94	合格	3.42	0		

汝阳县生态廊道北环路绿化项目验收表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人

	乡镇	行政村	项目名称	小班号	规划面积	模型	苗木设计					造林设计										验收意见		验收结果		
							树种配置				造林密度	每亩株数	造林方法	整地方法	树穴规格	栽植时间	扩穴标准	浇水	施肥	病虫害防治	除草	成活率	意见	合格面积	不合格面积	不合格原因
							树种1	树种2	树种3	树种4																
合计					673.85																			590.96	82.89	
设计	城关镇	杨庄村	北环路		12.52	B	白皮松	红叶李		楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次				
验收	城关镇	杨庄村	北环路	56	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	92	合格	12.52	0	
设计	城关镇	杨庄村	北环路		2.65	B	白皮松	红叶李		楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次				
验收	城关镇	杨庄村	北环路	57	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	89	合格	2.65	0	
设计	城关镇	杨庄村	北环路		8	B	白皮松	红叶李		楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次				
验收	城关镇	杨庄村	北环路	58	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	91	合格	8	0	
设计	城关镇	杨庄村	北环路		15.26	B	白皮松	红叶李		楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次				
验收	城关镇	杨庄村	北环路	59	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	91	合格	15.26	0	
设计	城关镇	杨庄村	北环路	60	10.15	A	白皮松	红叶李	栾树		3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次				

汝阳县生态廊道北环路绿化项目验收表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人

	乡镇	行政村	项目名称	小班号	规划面积	模型	苗木设计						造林设计										验收意见		验收结果			
							树种配置				造林密度	每亩株数	造林方法	整地方法	树穴规格	栽植时间	扩穴标准	浇水	施肥	病虫害防治	除草							
							树种1	树种2	树种3	树种4												比例						
合计					673.85																					590.96	82.89	
验收	城关镇	杨庄村	北环路	60	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	68	不合格	10.15	0		
设计	城关镇	杨庄村	北环路		0.54	A	白皮松	红叶李	栾树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷药	3-5次							
验收	城关镇	杨庄村	北环路	61	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	89	合格	0.54	0			
设计	城关镇	杨庄村	北环路		2.49	A	白皮松	红叶李	栾树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷药	3-5次							
验收	城关镇	杨庄村	北环路	62	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0	不合格	0	2.49	未种植		
设计	城关镇	杨庄村	北环路		4.23	A	白皮松	红叶李	栾树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷药	3-5次							
验收	城关镇	杨庄村	北环路	63	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0	不合格	0	4.23	工地		
设计	城关镇	杨庄村	北环路		3.12	A	白皮松	红叶李	栾树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷药	3-5次							
验收	城关镇	杨庄村	北环路	64	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	91	合格	3.12	0			
设计	城关镇	杨庄村	北环路		8	A	白皮松	红叶李	栾树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷药	3-5次							

汝阳县生态廊道北环路绿化项目验收表

单位: 亩、株/亩、株、kg、年、次、人

	乡镇	行政村	项目名称	小班号	规划面积	模型	苗木设计					造林设计										验收意见		验收结果				
							树种配置				造林密度	每亩株数	造林方法	整地方法	树穴规格	栽植时间	扩穴标准	浇水	施肥	病虫害防治	除草							
							树种1	树种2	树种3	树种4												比例						
合计					673.85																				590.96	82.89		
验收	城关镇	杨庄村	北环路	65	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
设计	城关镇	杨庄村	北环路	66	6.41	A	白皮松	红叶李	栾树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次							
验收	城关镇	杨庄村	北环路	66	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
设计	城关镇	杨庄村	北环路		4.49	B	白皮松	红叶李	楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次							
验收	城关镇	杨庄村	北环路	67	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
设计	城关镇	杨庄村	北环路		16.38	B	白皮松	红叶李	楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次							
验收	城关镇	杨庄村	北环路	68	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
设计	城关镇	杨庄村	北环路		24.74	B	白皮松	红叶李	楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷施	3-5次							
验收	城关镇	杨庄村	北环路	69	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

汝阳县生态廊道北环路绿化项目验收表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人

	乡镇	行政村	项目名称	小班号	规划面积	模型	苗木设计						造林设计										验收意见		验收结果			
							树种配置				造林密度	每亩株数	造林方法	整地方法	树穴规格	栽植时间	扩穴标准	浇水	施肥	病虫害防治	除草							
							树种1	树种2	树种3	树种4												比例						
合计					673.85																					590.96	82.89	
设计	城关镇	杨庄村	北环路		14.51	B	白皮松	红叶李	楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次							
验收	城关镇	杨庄村	北环路	70	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	91	合格	14.51	0			
设计	城关镇	杨庄村	北环路		5.1	B	白皮松	红叶李	楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次							
验收	城关镇	杨庄村	北环路	71	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	合格	5.1	0			
设计	城关镇	杨庄村	北环路	72	10.4	B	白皮松	红叶李	楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次							
验收	城关镇	杨庄村	北环路	72	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	89	合格	10.4	0			
设计	城关镇	杨庄村	北环路		3.3	B	白皮松	红叶李	楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次							
验收	城关镇	杨庄村	北环路	73	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	89	合格	3.3	0			
设计	城关镇	杨庄村	北环路		5.67	B	白皮松	红叶李	楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次							

汝阳县生态廊道北环路绿化项目验收表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人

	乡镇	行政村	项目名称	小班号	规划面积	模型	苗木设计						造林设计										验收意见		验收结果		
							树种配置					造林密度	每亩株数	造林方法	整地方法	树穴规格	栽植时间	扩穴标准	浇水	施肥	病虫害防治	除草	成活率	意见	合格面积	不合格面积	不合格原因
							树种1	树种2	树种3	树种4	比例																
合计					673.85																				590.96	82.89	
验收	城关镇	杨庄村	北环路	74	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	合格	5.67	0	
设计	城关镇	杨庄村	北环路		2.71	B	白皮松	红叶李		楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷药	3-5次					
验收	城关镇	杨庄村	北环路	75	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	88	合格	2.71	0	
设计	城关镇	洛峪村	北环路		26.05	B	白皮松	红叶李		楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷药	3-5次					
验收	城关镇	洛峪村	北环路	76	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90	合格	26.05	0	
设计	城关镇	洛峪村	北环路		5.63	B	白皮松	红叶李		楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷药	3-5次					
验收	城关镇	洛峪村	北环路	77	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	89	合格	5.63	0	
设计	城关镇	洛峪村	北环路	78	14.31	B	白皮松	红叶李		楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷药	3-5次					
验收	城关镇	洛峪村	北环路	78	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	0	不合格	0	14.31	工地

汝阳县生态廊道北环路绿化项目验收表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人

	乡镇	行政村	项目名称	小班号	规划面积	模型	苗木设计						造林设计								验收意见		验收结果				
							树种配置				造林密度	每亩株数	造林方法	整地方法	树穴规格	栽植时间	扩穴标准	浇水	施肥	病虫害防治						除草	
							树种1	树种2	树种3	树种4											比例						
合计					673.85																				590.96	82.89	
设计	城关镇	洛峪村	北环路	79	9.7	B	白皮松	红叶李		楸树	3:3:4	3*3	74	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥 生长肥	预防为主 科学喷药	3-5次					
验收	城关镇	洛峪村	北环路	79	√	\	\	\		\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	0	不合格	0	9.7	工地

沁阳县生态廊道北环路

柏树乡 漫流村 1号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023年 9月 23日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红叶李				造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	21	1	49	3				
2	样段	1	20	2	50	2				
3	样段	1	20	1	50	3				
合计			61	4	149	8			74	94.6
苗木规格			合格		合格					
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨晓军

郭玉西

冲阳县镇郑道北环路

造林验收样地调查表

柏树乡漫坑村2号小班

调查时间:

2023年9月23日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			银杏		红杉				造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	18	3	46	6				
2	样段	1	19	3	47	5				
3	样段	1	20	1	46	7				
合计			57	7	139	18			74	88
苗木规格			合格		合格					
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨奥昂

邵少西

沁阳县沁阳镇北环路

造林验收样地调查表

柏树乡漫流村 3 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		丝叶李		木秋树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	20	2	19	3	27	3		
2	样段	1	21	1	19	3	26	4		
3	样段	1	21	1	20	2	25	5		
合计			62	4	58	8	78	12	74	89
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨兴

郭亚

汝阳县生态廊道北环路

柏树乡漫流

村 4 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		62叶李				造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	20	2	49	3				
2	样地	1	21	1	50	2				
3	样地	1	20	3	49	2				
合计			61	6	148	7			74	94
苗木规格			合格		合格					
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨奥昂

刘玉号

冲阳县生态廊道北环路

梅树乡漫流村 5 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白松		红叶松		木荷		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	0.5	11	1	10	2	11	2		
2	样地	0.5	12	0	11	1	10	3		
3	样地	0.5	9	3	12	1	11	1		
合计			32	4	33	4	32	6	74	87
苗木规格			全株		全株		全株			
整地规格			全株							
混交比例			全株							

相树乡漫坡村 6 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		华山松		木荷		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	19	3	21	1	25	5		
2	样段	1	20	1	20	3	26	4		
3	样段	1	21	1	19	3	28	2		
合计			60	5	60	7	79	11	74	84.6 90
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典

郭亚男

造林验收样地调查表

柏树乡漫滩村 7 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白栎		红叶李				造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	0.5	12	1	22	3				
2	样地	0.5	11	2	23	2				
3	样地	0.5	10	2	24	3				
合计			33	5	69	8			76	89
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨奥昂

郭亚西

濮阳县生态廊道北环路
柳林乡 濮阳县 村 8 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			国槐		红叶李				造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	19	3	45	7				
2	样地	1	20	2	44	8				
3	样地	1	18	4	47	4				
合计			57	9	136	19			74	86
苗木规格			合格		合格					
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨建邦 郭亚男

造林验收样地调查表

杞县 桑园乡 漫流村

9 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			泡桐		侧柏		榿树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	18	4	21	1	26	4		
2	样地	1	19	3	18	4	28	2		
3	样地	1	20	2	19	2	27	4		
合计			57	9	58	7	81	10	74	88
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

许昌县生态廊道柏环路

柏树乡漫流村 10 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红松		落叶松		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	0.5	12	1	12	0	10	3		
2	样地	0.5	10	1	10	2	12	2		
3	样地	0.5	9	2	9	2	12	3		
合计			31	4	31	4	34	7	74	86
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

淇县生态廊道北环路

造林验收样地调查表

柏树乡漫流村 11 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红叶李		榉树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	20	2	19	3	27	3		
2	样地	1	19	2	21	1	27	3		
3	样地	1	21	2	20	1	28	2		
合计			60	6	60	4	82	8	74	91
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员: 杨建邦 郭亚西

沁阳县生态廊道北环路
柏树乡布岭村 12 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		落叶松		栎树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	19	3	20	2	25	5		
2	样地	1	21	1	19	3	27	3		
3	样地	1	21	2	19	2	29	2		
合计			61	6	58	7	81	10	74	90
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨建昂

郭业西

柏树乡布岭村 13 号小班

汝阳县生态廊道北环路

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松						造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	0.5	33	4						
合计									74	89
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

柏树乡 布岭村

中阳县镇南道北环路
柳林乡 存岭 村 14号小班

造林验收样地调查表

调查时间：2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白栎						造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	0.5	33	4						
2	样地	0.5	32	5						
3	样地	0.5	35	3						
合计			100						74	90
苗木规格			1.5m							
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨典昂 郭亚西

植树乡 南岭村 15 号小班

淇阳县廊道北环路

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			侧柏		落叶松		其他		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	21	1	19	3	28	5		
2	样地	1	20	2	20	2	27	3		
3	样地	1	20	2	18	4	26	4		
合计			61	5	57	9	81	12	74	90
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨 强 郭 亚西

沁阳县绿廊道北环路

柏树乡 有坡

村 16 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红松		落叶松		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	0.5	9	3	12	0	12	1		
合计			9	3	12	0	12	1	74	89
苗木规格			全格		全格		全格			
整地规格			全格							
混交比例			全格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨晓阳

郭亚西

淇阳县生态廊道北环路

造林验收样地调查表

柏树乡 东山村 17 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白栎		侧柏		黑桤木		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	0.5	11	1	12	0	12	1		
2	样地	0.5	9	3	11	1	13	1		
3	样地	0.5	10	2	10	3	11	2		
合计			30	6	32	4	36	4	74	88
苗木规格			全格		全格		全格			
整地规格			全格							
混交比例			全格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨洪昂

郭亚西

2400县生态廊道北环路
 槐树乡 柏岭村 18号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红叶李		臭椿		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	0.5	12	0	9	3	11	1		
2	样地	0.5	10	2	12	1	10	2		
3	样地	0.5	11	2	10	1	11	2		
合计			33	4	31	5	32	5	74	86
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨晓昂

郭亚西

汝阳县生态廊道环境造林验收样地调查表

柏树乡 南岭村 19 号小班

调查时间: 2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红椿		榿树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样圃	1	22	0	26	0	27	1		
2	样圃	1	20	0	21	2	24	2		
3	样圃	1	19	0	21	3	28	4		
合计			61	0	68	5	79	7	74	93
苗木规格			全检		全检		全检			
整地规格			全检							
混交比例			全检							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨宝军

郭玉强

柘城县支路道北路
 柘城县 柘城县 村 20 号小班
 造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红杉		杉木		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	21	1	21	2	27	3		
2	样地	1	19	3	20	1	26	4		
3	样地	1	20	2	19	3	28	2		
合计			61	6	61	6	81	9	74	91
苗木规格			全株		全株		全株			
整地规格			全株							
混交比例			全株							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨德昂

郭亚西

柳林乡 柳林村 21 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白松		红松		樟子松		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	21	1	19	3	26	4		
2	样段	1	20	2	20	3	27	2		
3	样段	1	21	2	19	2	28	2		
合计			62	5	58	8	81	8	74	91
苗木规格			全松		全松		全松			
整地规格			全松							
混交比例			全松							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

郭亚西

淇阳县生态廊道北环路

柏树乡 布政村 22 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红叶李		栎类		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	0.5	10	2	9	2	13	1		
2	样地	0.5	11	1	11	2	11	1		
3	样地	0.5	12	1	10	1	10	3		
合计			33	5	30	5	34	5	74	87
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

汝阳县生态廊道柏环路

柏树乡布岭村 23 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白栎		红叶李		板栗		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	19	3	20	2	25	4		
2	样段	1	20	2	21	1	27	3		
3	样段	1	20	1	21	2	27	3		
合计			59	6	62	5	79	10	74	90
苗木规格										
整地规格										
混交比例										

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

李德昂 郭亚男

柏樹 乡 布岭

村 24 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			侧柏		红松		柞木		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	21	2	20	1	27	3		
2	样地	1	20	2	19	3	28	2		
3	样地	1	18	2	21	2	27	4		
合计			59	6	60	6	82	9	74	91
苗木规格			全株		全株		全株			
整地规格			全株							
混交比例			全株							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨惠昂

郭亚西

坡美乡布岭村 25 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

楊寒昂

郭世昌

张明县生态廊道北段造林验收样地调查表

城关乡 张河村 26号小班

调查时间:

2023年 9 月23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白松		红叶李		桧树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	20	2	21	3	26	4	76	88%
2	样地	1	19	2	23	3	24	2		
3	样地	1	18	4	21	4	25	4		
合计			57	8	68	10	75	10	75	87
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨建伟

祁亚男

260824
260824

造林验收样地调查表

城关乡 孤间村 27 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白栎		红叶李		李树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	21	1	19	2	25	4		
2	样段	1	19	2	20	1	27	3		
3	样段	1	19	1	21	1	27	4		
合计			59	4	60	4	79	11	74	91
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

李德昂

郭亚强

造林验收样地调查表

召长洞村

28 号小班

调查时间:

2023年 9月 23日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白栎		红杉		杉木		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	20	2	20	1	28	2		
2	样段	1	19	2	20	2	29	1		
3	样段	1	21	1	19	1	28	1		
合计			60	5	59	4	85	4	74	94
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查人员:

杨典昂

邵玉西

洛阳市鑫森源林业勘察规划设计有限公司

造林验收样地调查表

城关乡 张河 村 29 号小班

调查时间: 2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白栎		红心木		李树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	20	1	19	2	29	3		
2	样段	1	19	2	21	2	28	2		
3	样段	1	20	1	18	4	28	1		
合计			59	4	58	8	85	6	74	92
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典

郭亚男

洛川县自然资源局

造林验收样地调查表

城关乡 张河村 30号小班

调查时间:

2023年 9月 23日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白栎		红叶李		海桐		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	21	0	20	1	28	1		
3	样地	1	20	1	16	2	32	4		
3	样地	1	18	0	22	1	27	2		
合计			59	1	58	4	87	7	74	94
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例										

汝城县生态廊道北段造林

造林验收样地调查表

城关乡 张河

村 31 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样 地 号	样地类型	样地面 积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红叶李		李树		造林密度 (株 /亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合 格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合 格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合 格苗木)		
1	样地	1	20	1	21	0	27	2		
2	样地	1	20	2	22	1	26	3		
3	样地	1	20	0	19	0	29	3		
合计			60	3	62	1	82	8	74	94
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

李亚西

张岭乡张岭村 32 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白栎		红叶李		李树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	19	2	20	3	27	2		
2	样地	1	22	0	18	3	29	1		
3	样地	1	18	0	24	2	29	2		
合计			59	2	62	8	85	5	74	93
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

洛阳市洛宁县北张乡 张河村 33 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白栎		侧柏		李树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	19	0	22	1	29	0		
2	样地	1	22	1	20	1	28	1		
3	样地	1	20	2	17	2	29	2		
合计			61	3	59	4	86	3	74	95
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

汝阳县老庙镇北园村

造林验收样地调查表

七渡乡王屯村 34 号小班

调查时间:

2013 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白栎		红叶李		李树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	20	0	22	1	30	3		
2	样地	1	21	1	19	2	28	2		
3	样地	1	19	2	22	1	30	3		
合计			60	3	63	4	88	8	74	93
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

郭亚力

张明县毛茛科植物种子

造林验收样地调查表

七级乡 张村 35 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白栎		红叶李		李树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	21	0	20	2	30	0		
2	样地	1	22	1	20	2	29	2		
3	样地	1	18	2	17	3	31	0		
合计			61	3	57	7	90	2	73	95
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨建昂

郭亚西

海阳县自然资源局

造林验收样地调查表

城关乡张河

村 36 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红松		落叶松		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	20	0	21	2	29	3		
2	样地	1	21	2	20	1	27	4		
3	样地	1	17	2	24	2	29	3		
合计			58	4	65	5	85	10	76	92
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

邵亚西

造林验收样地调查表

七坡乡张河

村

37 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白栎		红叶李		李树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地1	1	17	2	22	2	29	1		
2	样地2	1	20	0	22	1	28	4		
3	样地3	1	22	1	21	0	27	3		
合计			59	3	65	3	84	8	74	94
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

邵亚西

长明乡解店村

造林验收样地调查表

城发乡 5810 村 38 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白栎		红叶李		李树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	20	0	22	1	29	2		
2	样地	1	19	1	22	0	28	1		
3	样地	1	20	2	20	1	27	4		
合计			59	3	64	2	84	7	73	95
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

郭亚西

河南鑫森源林业勘察规划设计有限公司

造林验收样地调查表

濮阳市濮阳县 濮阳县 39 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白栎		红杉		刺槐		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	22	2	20	1	30	2		
2	样地	1	19	1	24	2	31	1		
3	样地	1	23	1	22	2	28	1		
合计			64	4	66	5	89	5	78	94
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

张明县经编镇北村造林验收

造林验收样地调查表

城关乡 孙河 村 40 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白栎		臭椿		香椿		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	22	0	20	2	30	1		
2	样地	1	23	1	19	4	28	3		
3	样地	1	22	3	21	1	27	2		
合计			67	4	60	7	85	6	76	93
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

郭亚强

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

村 41 号小班

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红杉		樟树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	21	0	23	2	29	3		
2	样地	1	18	2	23	0	31	0		
3	样地	1	23	1	19	4	28	4		
合计			62	3	68	6	88	7	77	93
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨寒昂 郭亚西

汝阳县森林资源调查队

造林验收样地调查表

十成乡 张河

村

42号小班

调查时间:

2023年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白栎		红叶李		青杠		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	21	1	20	2	31	0		
2	样地	1	19	3	22	1	29	3		
3	样地	1	23	1	19	4	27	4		
合计			63	5	61	7	87	7	77	92
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨德昂

郭亚西

造林验收样地调查表

造林验收样地调查表

城关乡 3820 村 43 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白栎		红叶李		李树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	21	2	19	3	30	0		
2	样地	1	24	0	22	1	27	1		
3	样地	1	22	1	19	2	27	2		
合计			67	3	60	6	84	3	74	95
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨贵军

郭亚男

汝州市毛条道北 环境绿化

造林验收样地调查表

古城乡 张河 村 48 号小班

调查时间:

2023年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白栎		红叶李		李树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	21	1	22	0	30	1		
2	样地	1	20	2	21	1	28	1		
3	样地	1	20	2	19	2	29	3		
合计			61	5	52	3	87	5	74	94
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨庚昂

郭业西

造林验收样地调查表

城关乡 井店村 46 号小班

调查时间：2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
									造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1								
2	样段	1								
3	样段	1								
	柳树									
合计									0	0
苗木规格			不合格		不合格		不合格		不合格	
整地规格			不合格							
混交比例			不合格							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

刘典昂 郭亚西

河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

造林验收样地调查表

七坡乡 张河 村 47 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白栎		红叶李		李		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	20	0	21	1	30	0		
2	样地	1	19	0	22	2	27	3		
3	样地	1	17	4	22	3	26	4		
合计			56	4	68	6	83	7	76	92
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨建昂 郭亚西

4400 经济地理学

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

楊寒昂

郭廷西

26000 2020年10月28日

造林验收样地调查表

七级乡 杨沟 村 49 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 21 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白栎		红松		樟子松		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	22	0	19	3	30	2		
2	样地	1	21	2	17	4	28	4		
3	样地	1	19	3	22	0	27	3		
合计			62	5	58	7	85	9	75	92
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨惠昂

郭进勇

造林验收样地调查表

城父乡林沟

村 50 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白栎		红刺楸		樟树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	20	2	21	2	30	1		
2	样地	1	19	3	19	2	28	4		
3	样地	1	22	0	21	3	30	0		
合计			61	5	61	7	88	5	76	93
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

郭亚西

16明见总廊通北地路绿化

造林验收样地调查表

七武乡 井沟 村 51号小班

调查时间:

2023年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白栎		红叶李		桤木		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	20	0	22	1	29	3		
2	样地	1	18	4	20	2	27	4		
3	样地	1	22	0	19	3	28	3		
合计			60	4	63	6	84	10	76	93
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂 郭亚西

造林验收样地调查表

城关乡 井沟 村 52 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		侧柏		樟子松		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	21	2	19	4	27	3		
2	样地	1	20	1	22	1	27	4		
3	样地	1	22	0	20	2	28	2		
合计			63	3	61	7	82	9	75	92
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

郭亚西

汝阳县生态廊道北环路
城关乡 井岗村 53号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白栎		红叶李		桉树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	0.5	11	2	10	1	12	2		
2	样地	0.5	10	2	12	0	11	3		
3	样地	0.5	12	1	11	1	13	1		
合计			33	5	33	2	35	6	76	89
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂 祁亚西

造林验收样地调查表

城关乡 杨庄村

54号小班

调查时间:

2023年 9月 23日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红松		槲栎		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	21	2	19	3	28	1		
2	样地	1	22	1	19	2	27	4		
3	样地	1	20	2	20	1	29	2		
合计			63	5	58	6	84	7	74	92
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司 调查人员: 杨寒雨 邵亚西

城关乡井沟村 潮阳县生态廊道北环路 55号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023年 9月 23日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红叶李		朴树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	21	1	20	2	28	2		
2	样段	1	22	0	21	1	29	2		
3	样段	1	21	1	22	1	27	3		
合计			64	2	63	4	84	7	75	94
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员: 杨奥昂 邵亚西

城关乡 杨庄村 56 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红叶松		榿树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	20	2	22	1	27	3		
2	样段	1	21	1	20	1	28	2		
3	样段	1	19	3	21	2	29	2		
合计			60	6	63	4	84	7	75	92
苗木规格			全格		全格		全格			
整地规格			全格							
混交比例			全格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

郭亚西

城关乡杨庄村 57 号小班

湖阳县森源林业勘察规划设计有限公司

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 23 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红叶松		樟树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	0.5	10	2	12	1	12	1		
2	样段	0.5	11	1	10	3	11	2		
3	样段	0.5	12	1	11	2	12	2		
合计			33	4	33	6	35	5	77	89
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

李典昂

郭亚西

冲阳县生态廊道北环线造林验收样地调查表
 土城乡 杨庄村 58 号小班

调查时间: 2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白栎		红杉		榿树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	23	0	19	3	27	4		
2	样段	1	21	2	21	2	26	4		
3	样段	1	20	2	22	1	28	2		
合计			64	4	62	6	81	10	76	91
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员: 杨寒昂 邵亚西

城关乡杨庄村 59号小班 造林验收样地调查表

调查时间:

2023年 9月 18日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红叶李		榉树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	20	1	19	3	28	3		
2	样段	1	22	0	21	2	27	4		
3	样段	1	20	3	22	1	29	2		
合计			62	4	62	6	84	9	76	91
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

城关乡 招庄村 60号小班 造林验收样地调查表

调查时间：2023年9月18日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红叶松		栎树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	17	6	16	8	20	10		
2	样段	1	16	7	15	7	21	9		
3	样段	1	15	7	14	8	20	10		
合计			48	20	45	23	61	29	75	68
苗木规格			不合格		不合格		不合格			
整地规格			不合格							
混交比例			不合格							

汝阳县生态廊道北环路

城关乡 杨庄村 61 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			红皮松		红叶李		栎树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	0.5	10	1	12	1	12	2		
合计			10	1	12	1	12	2	76	89
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨洪昂

郭亚西

2023年生态廊道环境

造林验收样地调查表

城关乡 杨庄村 62号小班

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红松		柞木		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	0.5	0	0	0	0	0	0		
2	样地	0.5	0	0	0	0	0	0		
3	样地	0.5	0	0	0	0	0	0		
		未种植								
合计			0	0	0	0	0	0	0	0
	苗木规格		不合格		不合格		不合格			
	整地规格		不合格							
	混交比例		不合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨寒昂

邵亚西

沁阳县生态廊道和环线

造林验收样地调查表

城关乡杨庄村

63号小班

调查时间:

2023年9月18日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红叶李		刺槐		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	0	0	0	0	0	0		
1	样段	1	0	0	0	0	0	0		
1	样段	1	0	0	0	0	0	0		
		未种植								
合计			0	0	0	0	0	0	0	0
苗木规格			不合格		不合格		不合格			
整地规格			不合格							
混交比例			不合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨奥昂

郭亚西

城父乡杨庄村 64 号小班
 2023 年 9 月 18 日
 调查时间：

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			侧柏		红叶李		枣树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	20	2	21	2	28	2		
2	样段	1	19	3	20	3	27	3		
3	样段	1	21	2	19	2	29	1		
合计			60	7	60	7	84	6	75	91
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

潮阳县生态廊道北环路

造林验收样地调查表

城关乡 杨庄村 65 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红松		樟子松		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	20	2	21	2	27	3		
2	样地	1	22	0	21	0	29	2		
3	样地	1	20	3	20	2	26	4		
合计			62	5	62	4	82	9	75	92
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

造林验收样地调查表

城关乡 杨庄村

66号小班

调查时间:

2023年 9月 18日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红叶松		栎类		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	23	0	19	3	28	3		
2	样段	1	22	0	19	2	27	3		
3	样段	1	20	2	22	1	30	1		
合计			65	2	60	6	85	7	75	93
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂 郭亚西

许昌县生态廊道和环路

造林验收样地调查表

城关乡 相庄村

67号小班

调查时间:

2023年 9月 18日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白松		红叶松		杉 树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	22	0	20	2	27	3		
2	样段	1	21	2	23	0	29	2		
3	样段	1	20	3	21	1	25	5		
合计			63	5	64	3	81	10	75	92
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨寒昂

郭少西

许昌县生态廊道北环路

造林验收样地调查表

城郊乡 郝庄村 68 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			阔 松		落叶松		其他树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	23	0	21	2	28	2		
2	样段	1	22	0	20	2	29	1		
3	样段	1	20	2	19	3	26	4		
合计			65	2	60	7	83	7	75	92
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

邵亚西

城父乡 杨庄村 69号小班 造林验收样地调查表

调查时间:

2023年 9月 18日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白栎		红叶李		木槲		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	20	2	20	1	26	4		
2	样段	1	21	2	23	0	27	3		
3	样段	1	19	3	22	1	28	3		
合计			60	7	65	2	81	10	75	91
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员: 杨典昂 邵玉西

汝阳县生态廊道北环路

造林验收样地调查表

城关乡 栎庄村 70 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红松		落叶松		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	19	3	21	1	25	5		
2	样段	1	20	2	22	0	28	2		
3	样段	1	20	3	21	2	29	1		
合计			59	8	64	3	82	8	75	91
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂 郭亚海

城关乡杨庄村 71 号小班
 造林验收样地调查表

调查时间：2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			红松		红松		杉木		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	19	3	19	2	28	3		
2	样地	1	19	2	20	1	27	2		
3	样地	1	21	2	20	2	25	5		
合计			59	7	59	5	79	10	74	90
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

中阳县生态廊道北环路

造林验收样地调查表

城关乡 杨庄村 72 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			侧柏		红叶李		槭树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	19	3	20	1	26	4		
2	样段	1	19	3	19	3	27	4		
3	样段	1	20	2	21	2	29	2		
合计			58	8	60	6	82	10	75	89
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂 郭亚西

沁阳县生态廊道北环路

造林验收样地调查表

土坡乡 杨庄村 73 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		丝叶李		槭树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	21	1	20	3	26	4		
2	样段	1	20	2	19	3	27	3		
3	样段	1	19	3	20	2	29	2		
合计			60	6	59	8	82	9	75	89
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂 邵亚西

城关乡洛峪村 74 号小班

潮阳县生态廊道和环路

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红松		桧树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	19	0	20	3	27	3		
2	样段	1	22	0	21	2	26	4		
3	样段	1	20	3	19	2	28	3		
合计			61	3	60	7	81	10	74	90
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨兴昂

郭亚西

造林验收样地调查表

城关乡 杨庄 村

75 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红叶李		木荷		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	0.5	9	2	10	2	10	2		
2	样段	0.5	10	1	11	1	13	0		
3	样段	0.5	9	1	8	3	14	1		
合计			28	4	29	6	37	3	74	88
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

郭亚西

城 乡 洛 山 村 76 号小班 造林验收样地调查表

调查时间: 2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红松		木松		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	19	3	22	0	27	3		
1	样段	1	19	3	23	0	28	3		
1	样段	1	21	1	19	3	25	6		
合计			59	7	64	3	80	12	75	90
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

沁阳县生态廊道北环路

造林验收样地调查表

城关乡 崤峪村 77号小班

调查时间:

2023年 9月 18日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红叶松		樟子松		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	19	3	20	1	25	4		
2	样段	1	20	2	22	1	26	5		
3	样段	1	19	2	19	3	28	3		
合计			58	7	61	5	79	12	74	89
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

郭亚西

豫北生态廊道环线绿化

造林验收样地调查表

城关乡 洛峪村 78 号小班

调查时间： 2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
									造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1								
2	样段	1								
3	样段	1								
		2地								
合计									0	0
苗木规格			不合格		不合格		不合格		不合格	
整地规格			不合格							
混交比例			不合格							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨建昂 郭亚西

郑州市生态廊道和环路

造林验收样地调查表

城关乡洛峪村 79 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			国槐		红叶李		木犀树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	0	0	0	0	0	0		
2	样段	1	0	0	0	0	0	0		
3	样段	1	0	0	0	0	0	0		
		2地								
合计			0	0	0	0	0	0	0	0
苗木规格			不合格		不合格		不合格			
整地规格			不合格							
混交比例			不合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨寒昂 郭亚西

汝阳县生态廊道北环路绿化项目验收图 (1/5)



汝阳县生态廊道北环路绿化项目验收图 (2/5)



汝阳县生态廊道北环路绿化项目验收图 (3/5)



坐标系: CGCS2000 GK Zone 19

河南省鑫森源林业勘查规划设计有限公司


汝阳县生态廊道北环路绿化项目验收图 (4/5)




汝阳县生态廊道北环路绿化项目验收图 (5/5)




汝阳县生态廊道北环路绿化项目验收现场照片

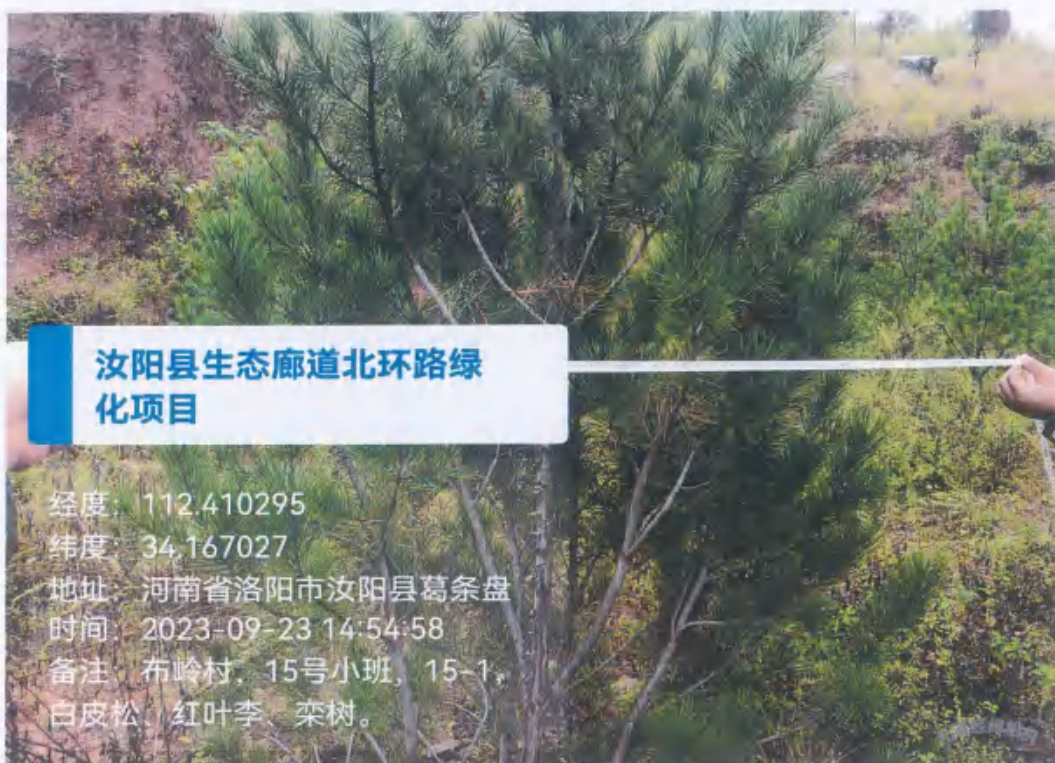

汝阳县生态廊道北环路绿化项目验收现场照片

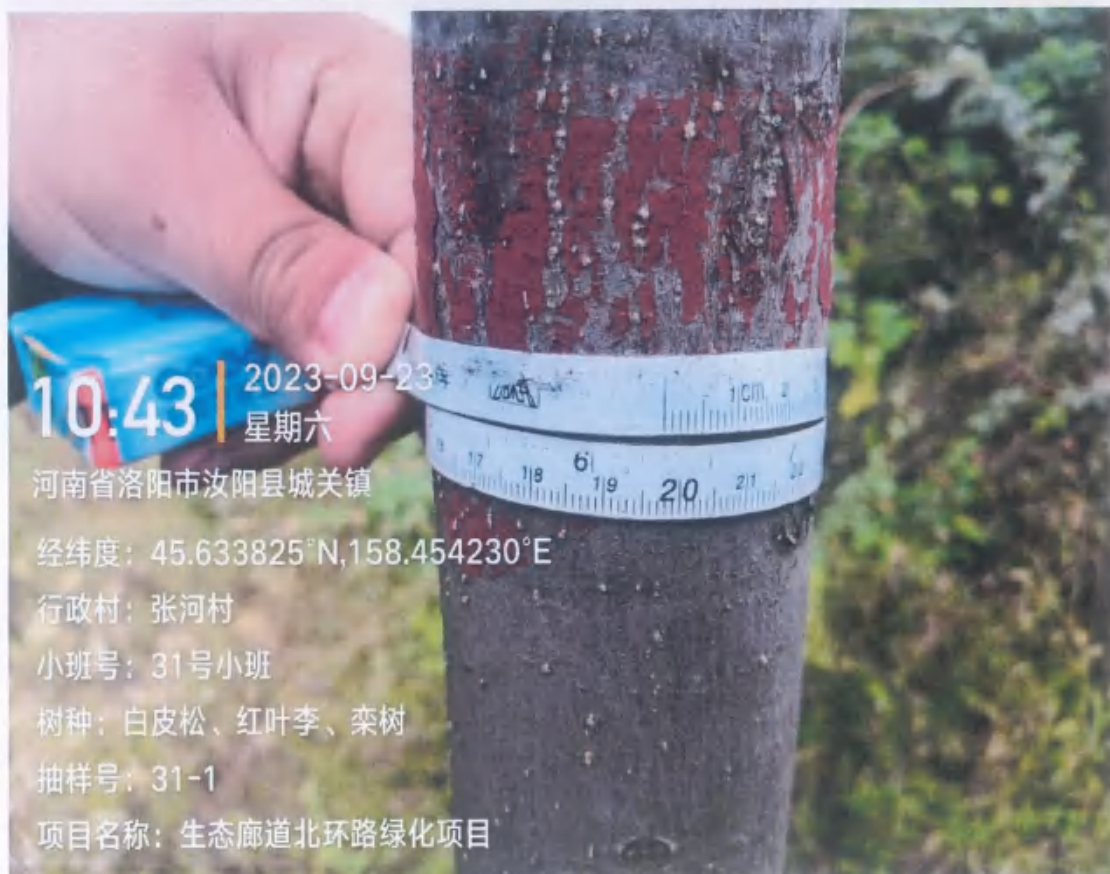

汝阳县生态廊道北环路绿化项目验收现场照片

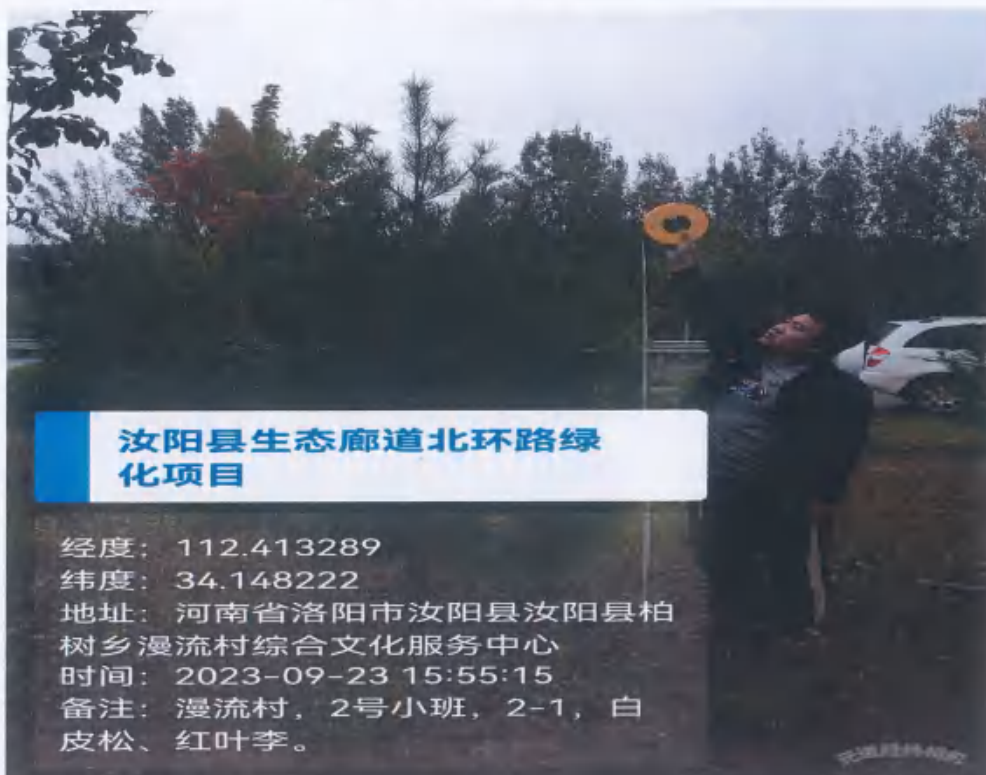

汝阳县生态廊道北环路绿化项目

经度: 112.413289
纬度: 34.148222
地址: 河南省洛阳市汝阳县汝阳县柏树乡漫流村综合文化服务中心
时间: 2023-09-23 15:55:15
备注: 漫流村, 2号小班, 2-1, 白皮松、红叶李。



汝阳县生态廊道北环路绿化项目

经度: 112.413106
纬度: 34.150337
地址: 河南省洛阳市汝阳县汝阳县柏树乡漫流村综合文化服务中心
时间: 2023-09-23 15:46:33
备注: 漫流村, 3号小班, 3-1, 白皮松、红叶李、楸树。

汝阳县生态廊道汝安路绿化工程小班验收表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人

	乡镇	行政村	工程名称	小班号	规划面积	模式	苗木设计										造林设计										验收意见		验收结果		
							树种配置								混交		造林密度	造林方法	整地方法	树穴规格	栽植时间	扩穴标准	浇水	施肥	病虫害防治	除草	成活率	意见	合格面积	不合格面积	不合格原因
							树种1	树种2	树种3	树种4	树种5	树种6	树种7	树种8	方式	比例															
	合计				378.33																								322.04	56.28	
设计	内埠镇	内埠村	汝安路	1	2	E	白皮松								块状	10	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	内埠镇	内埠村	汝安路	1	2	√	√								√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	88	合格	2	0	
设计	内埠镇	内埠村	汝安路	2	0.82	E	白皮松								块状	10	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	内埠镇	内埠村	汝安路	2	0.82	√	√								√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	93	合格	0.82	0	
设计	内埠镇	内埠村	汝安路	3	0.28	E	白皮松								块状	10	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	内埠镇	内埠村	汝安路	3	0.28	√	√								√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	86	合格	0.28	0	
设计	内埠镇	内埠村	汝安路	4	0.87	E	白皮松								块状	10	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	内埠镇	内埠村	汝安路	4	0.87	√	√								√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	91	合格	0.87	0	
设计	内埠镇	内埠村	汝安路	5	2.97	E	白皮松								块状	10	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	内埠镇	内埠村	汝安路	5	2.97	√	√								√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	88	合格	2.97	0	

汝阳县生态廊道汝安路绿化工程小班验收表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人

	乡镇	行政村	工程名称	小班号	规划面积	模型	苗木设计										造林设计										验收意见		验收结果		
							树种配置								混交		造林密度	造林方法	整地方法	树穴规格	栽植时间	扩穴标准	浇水	施肥	病虫害防治	除草	成活率	意见	合格面积	不合格面积	不合格原因
							树种1	树种2	树种3	树种4	树种5	树种6	树种7	树种8	方式	比例															
	合计				378.33																								322.04	56.28	
设计	内埠镇	内埠村	汝安路	6	1.18	E	白皮松								块状	10	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	内埠镇	内埠村	汝安路	6	1.18	√	√								√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	97	合格	1.18	0	
设计	内埠镇	内埠村	汝安路	7	1.62	E	白皮松								块状	10	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	内埠镇	内埠村	汝安路	7	1.62	√	√								√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	89	合格	1.62	0	
设计	陶营镇	柿园村	汝安路	8	7.43	B	白皮松	红叶李		楸树					块状	3:3:4	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	内埠镇	内埠村	汝安路	8	7.43	√	√	√		√					√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	89	合格	7.43	0	
设计	内埠镇	内埠村	汝安路	9	11.79	B	白皮松	红叶李		楸树					块状	3:3:4	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	内埠镇	内埠村	汝安路	9	11.79	√	√	√		√					√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	90	合格	11.79	0	
设计	内埠镇	内埠村	汝安路	10	16.03	B	白皮松	红叶李		楸树					块状	3:3:4	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	内埠镇	内埠村	汝安路	10	16.03	√	√	√		√					√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	88	合格	16.03	0	

汝阳县生态廊道汝安路绿化工程小班验收表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人

	乡镇	行政村	工程名称	小班号	规划面积	模式	苗木设计										造林设计										验收意见		验收结果		
							树种配置								混交		造林密度	造林方法	整地方法	树穴规格	栽植时间	扩穴标准	浇水	施肥	病虫害防治	除草	成活率	意见	合格面积	不合格面积	不合格原因
							树种1	树种2	树种3	树种4	树种5	树种6	树种7	树种8	方式	比例															
	合计				378.33																								322.04	56.28	
设计	内埠镇	内埠村	汝安路	11	3.91	B	白皮松	红叶李		楸树					块状	3:3:4	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	内埠镇	内埠村	汝安路	11	3.91	√	√	√		√					√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	89	合格	3.91	0	
设计	内埠镇	内埠村	汝安路	12	1.41	B	白皮松	红叶李		楸树					块状	3:3:4	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	内埠镇	内埠村	汝安路	12	1.41	√	√	√		√					√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	89	合格	1.41	0	
设计	内埠镇	内埠村	汝安路	13	4.07	B	白皮松	红叶李		楸树					块状	3:3:4	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	内埠镇	内埠村	汝安路	13	4.07	√	√	√		√					√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	89	合格	4.07	0	
设计	内埠镇	内埠村	汝安路	14	30.29	B	白皮松	红叶李		楸树					块状	3:3:4	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	内埠镇	内埠村	汝安路	14	30.29	√	√	√		√					√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	89	合格	30.29	0	
设计	内埠镇	内埠村	汝安路	15	14.04	B	白皮松	红叶李		楸树					块状	3:3:4	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	内埠镇	内埠村	汝安路	15	14.04	√	√	√		√					√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	88	合格	14.04	0	

汝阳县生态廊道汝安路绿化工程小班验收表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人

	乡镇	行政村	工程名称	小班号	规划面积	模式	苗木设计										造林设计										验收意见		验收结果		
							树种配置								混交		造林密度	造林方法	整地方法	树穴规格	栽植时间	扩穴标准	浇水	施肥	病虫害防治	除草	成活率	意见	合格面积	不合格面积	不合格原因
							树种1	树种2	树种3	树种4	树种5	树种6	树种7	树种8	方式	比例															
	合计				378.33																								322.04	56.28	
设计	内埠镇	内埠村	汝安路	16	3.89	B	白皮松	红叶李		楸树					块状	3:3:4	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	内埠镇	内埠村	汝安路	16	3.89	√	√	√		√					√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	90	合格	3.89	0	
设计	内埠镇	内埠村	汝安路	17	8.13	B	白皮松	红叶李		楸树					块状	3:3:4	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	内埠镇	内埠村	汝安路	17	8.13	√	√	√		√					√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	91	合格	8.13	0	
设计	陶营镇	罗营村	汝安路	18	10.23	B	白皮松	红叶李		楸树					块状	3:3:4	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	陶营镇	罗营村	汝安路	18	10.23	√	√	√		√					√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	92	合格	10.23	0	
设计	陶营镇	罗营村	汝安路	19	4.8	F		红叶李							块状	10	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	陶营镇	罗营村	汝安路	19	4.8	√		√							√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	95	合格	4.8	0	
设计	小店镇	紫罗村	汝安路	20	19.2	B	白皮松	红叶李		楸树					块状	3:3:4	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	小店镇	紫罗村	汝安路	20	19.2	√	√	√		√					√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	93	合格	19.2	0	

汝阳县生态廊道汝安路绿化工程小班验收表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人

	乡镇	行政村	工程名称	小班号	规划面积	模式	苗木设计										造林设计										验收意见		验收结果		
							树种配置								混交		造林密度	造林方法	整地方法	树穴规格	栽植时间	扩穴标准	浇水	施肥	病虫害防治	除草	成活率	意见	合格面积	不合格面积	不合格原因
							树种1	树种2	树种3	树种4	树种5	树种6	树种7	树种8	方式	比例															
合计					378.33																								322.04	56.28	
设计	小店镇	龙泉村	汝安路	21	6.22	B	白皮松	红叶李		楸树					块状	3:3:4	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	小店镇	龙泉村	汝安路	21	6.22		√	√	√	√					√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	92	合格	6.22	0	
设计	小店镇	龙泉村	汝安路	22	75.88	G				楸树					块状	3:3:4	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	小店镇	龙泉村	汝安路	22	75.88		√			√					√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	95	合格	75.88	0	
设计	小店镇	龙泉村	汝安路	23	40.91	G				楸树					块状	10	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	小店镇	龙泉村	汝安路	23	40.91		√			√					√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	0	合格	18.69	22.21	未种植
设计	小店镇	龙泉村	汝安路	24	2.11	F		红叶李							块状	10	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	小店镇	龙泉村	汝安路	24	2.11	/	/	/							/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	不合格	0	2.11	未种植
设计	小店镇	小店村	汝安路	25	4.53	E	白皮松								块状	10	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	小店镇	小店村	汝安路	25	4.53		√	√							√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	93	合格	4.53	0	

汝阳县生态廊道汝安路绿化工程小班验收表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人

	乡镇	行政村	工程名称	小班号	规划面积	模型	苗木设计							造林设计										验收意见		验收结果					
							树种配置								混交		造林密度	造林方法	整地方法	树穴规格	栽植时间	扩穴标准	浇水	施肥	病虫害防治	除草	成活率	意见	合格面积	不合格面积	不合格原因
							树种1	树种2	树种3	树种4	树种5	树种6	树种7	树种8	方式	比例															
	合计				378.33																								322.04	56.28	
设计	小店镇	小店村	汝安路	26	2.83	E	白皮松							块状	10	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次						
验收	小店镇	小店村	汝安路	26	2.83	/	/							/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	不合格	0	2.83	未种植	
设计	小店镇	小店村	汝安路	27	8	A	白皮松	红叶李	栎树					块状	3:3:4	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次						
验收	小店镇	小店村	汝安路	27	8	√	√	√	√					√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	91	合格	8	0		
设计	小店镇	小店村	汝安路	28	6.74	B	白皮松	红叶李		楸树				块状	3:3:4	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次						
验收	小店镇	小店村	汝安路	28	6.74	/	/	/		/				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	不合格	0	6.74	未种植	
设计	小店镇	小店村	汝安路	29	3.74	A	白皮松	红叶李	栎树					块状	3:3:4	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次						
验收	小店镇	小店村	汝安路	29	3.74	/	/	/	/					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	不合格	0	3.74	未种植	
设计	小店镇	小店村	汝安路	30	2.48	A	白皮松	红叶李	栎树					块状	3:3:4	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次						
验收	小店镇	小店村	汝安路	30	2.48	/	/	/	/					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	不合格	0	2.48	未种植	

汝阳县生态廊道汝安路绿化工程小班验收表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人

	乡镇	行政村	工程名称	小班号	规划面积	模式	苗木设计										造林设计										验收意见		验收结果		
							树种配置								混交		造林密度	造林方法	整地方法	树穴规格	栽植时间	扩穴标准	浇水	施肥	病虫害防治	除草	成活率	意见	合格面积	不合格面积	不合格原因
							树种1	树种2	树种3	树种4	树种5	树种6	树种7	树种8	方式	比例															
	合计				378.33																								322.04	56.28	
设计	小店镇	小店村	汝安路	31	4.03	A	白皮松	红叶李	栎树					块状	3:3:4	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次						
验收	小店镇	小店村	汝安路	31	4.03	/	/	/	/					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	不合格	0	4.03	未种植	
设计	小店镇	小店村	汝安路	32	1.64	B	白皮松	红叶李	楸树					块状	3:3:4	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次						
验收	小店镇	小店村	汝安路	32	1.64	/	/	/	/					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	不合格	0	1.64	未种植	
设计	小店镇	小店村	汝安路	33	0.94	D	白皮松		栎树					块状	5:5	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次						
验收	小店镇	小店村	汝安路	33	0.94	√	√		√					√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	91	合格	0.94	0		
设计	小店镇	小店村	汝安路	34	2.4	E	白皮松							块状	10	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次						
验收	小店镇	小店村	汝安路	34	2.4	/	/							/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	不合格	0	2.4	未种植	
设计	小店镇	小店村	汝安路	35	4.02	E	白皮松							块状	10	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次						
验收	小店镇	小店村	汝安路	35	4.02	√	√							√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	94	合格	4.02	0		

汝阳县生态廊道汝安路绿化工程小班验收表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人

	乡镇	行政村	工程名称	小班号	规划面积	模式	苗木设计										造林设计										验收意见		验收结果		
							树种配置								混交		造林密度	造林方法	整地方法	树穴规格	栽植时间	扩穴标准	浇水	施肥	病虫害防治	除草	成活率	意见	合格面积	不合格面积	不合格原因
							树种1	树种2	树种3	树种4	树种5	树种6	树种7	树种8	方式	比例															
	合计				378.33																								322.04	56.28	
设计	小店镇	小店村	汝安路	36	1.25	E	白皮松								块状	10	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	小店镇	小店村	汝安路	36	1.25	/	/								/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	不合格	0	1.25	未种植
设计	小店镇	小店村	汝安路	37	9.05	C	白皮松	红叶李			银杏				块状	3:3:4	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	小店镇	小店村	汝安路	37	9.05	√	√	√			√				√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	90	合格	9.05	0	
设计	小店镇	小店村	汝安路	38	8.43	C	白皮松	红叶李			银杏				块状	3:3:4	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	小店镇	小店村	汝安路	38	8.43	√	√	√			√				√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	91	合格	8.43	0	
设计	小店镇	小店村	汝安路	39	16.89	C	白皮松	红叶李			银杏				块状	3:3:4	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	小店镇	小店村	汝安路	39	16.89	√	√	√			√				√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	0	合格	12.05	4.84	未种植
设计	小店镇	小店村	汝安路	40	13.04	H		红叶李				油松	雪松	杜仲	块状	3:3:1:3	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	小店镇	小店村	汝安路	40	13.04	√		√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	90	合格	13.04	0	

汝阳县生态廊道汝安路绿化工程小班验收表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人

	乡镇	行政村	工程名称	小班号	规划面积	模式	苗木设计										造林设计										验收意见		验收结果		
							树种配置								混交		造林密度	造林方法	整地方法	树穴规格	栽植时间	扩穴标准	浇水	施肥	病虫害防治	除草	成活率	意见	合格面积	不合格面积	不合格原因
							树种1	树种2	树种3	树种4	树种5	树种6	树种7	树种8	方式	比例															
	合计				378.33																								322.04	56.28	
设计	小店镇	小店村	汝安路	41	1.31	I							雪松		块状	10	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	小店镇	小店村	汝安路	41	1.31	√							√		√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	91	合格	1.31	0	
设计	小店镇	小店村	汝安路	42	1.17	I							雪松		块状	10	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	小店镇	小店村	汝安路	42	1.17	√							√		√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	89	合格	1.17	0	
设计	小店镇	小店村	汝安路	43	13.67	C	白皮松	红叶李			银杏				块状	3:3:4	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	小店镇	小店村	汝安路	43	13.67	√	√	√			√				√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	0	合格	11.66	2.01	水泥路
设计	小店镇	小寺村	汝安路	44	2.09	I							雪松		块状	10	3*3	植苗造林	机械挖穴	80*80*80	冬季或春季	直径1m、堰高30cm	3-6次	施足底肥生长肥	预防为主科学喷	3-5次					
验收	小店镇	小寺村	汝安路	44	2.09	√							√		√	√	√	√	√	√	/	√	/	/	/	/	94	合格	2.09	0	

濮阳县鑫森源林业勘察规划设计有限公司

造林验收样地调查表

内黄县 11号小班

调查时间:

2023年9月18日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			侧柏						造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	0.5	35	2						
2	样地	0.5	30	7						
3	样地	0.5	34	4						
合计			99	13					75	88
苗木规格			全株							
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨 郭 郭 郭

造林验收样地调查表

内埠镇乡 内埠村 2 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松						造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	0.82	57	4						
合计			57	4					74	93
苗木规格			全格							
整地规格			全格							
混交比例			全格							

汝阳县生药部通安路

造林验收样地调查表

内埠镇乡内埠村 村 3 号小班

调查时间:

2023年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松						造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	0.28	19	3						
合计			19	3					79	86
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂 郭玉磊

汝阳县生态廊道建设

造林验收样地调查表

内埠镇 乡内埠村 村 4 号小班

调查时间:

2023年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松						造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	0.87	59	6						
合计			59	6					74	91
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨建昂 郭亚力

洪阳县生态廊道建设

造林验收样地调查表

内埠镇乡 内埠村 5 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松						造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	0.5	33	4						
2	样地	0.5	35	3						
3	样地	0.5	30	6						
合计			98	13					74	88
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			合格							

内埠镇乡 内埠村 村 6 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

楊惠昂

邵正强

内埠镇乡内埠村 7 号小班

汝阳县生态廊道建设路

造林验收样地调查表

调查时间：2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松						造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	0.5	31	6						
2	样段	0.5	36	2						
3	样段	0.5	33	4						
合计			100	12					75	89
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨典昂 郭亚男

新阳县生态廊道建设路
陶营镇乡村园村 村 8 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红叶松		秋 栎		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	19	3	20	1	26	4		
2	样段	1	21	2	22	1	27	4		
3	样段	1	20	3	19	3	25	6		
合计			60	8	61	5	78	14	75	89
苗木规格										
整地规格										
混交比例										

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

刘亚西

沈阳县生态廊道建设路
 陶营镇 乡村园林村 9 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红松		椴树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	18	4	20	3	28	2		
2	样段	1	21	1	19	2	26	4		
3	样段	1	22	0	21	2	27	4		
合计			61	5	60	7	81	10	75	90
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨寒昂

邵亚男

许昌县生态廊道工程
 陶营镇 乡 柿园村 村 10 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红松		樟子松		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	21	2	19	3	25	5		
2	样段	1	18	4	21	1	27	4		
3	样段	1	19	4	22	1	26	4		
合计			48	10	62	5	78	13	75	88
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨惠昂

郭亚西

沁阳县至太康公路
 陶营镇乡 柿园村 村 11 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红叶松		木松木树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	18	3	21	2	26	4		
2	样段	1	21	2	19	2	27	4		
3	样段	1	20	2	22	1	25	6		
合计			59	7	62	5	78	14	75	89
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨庚昂

郭亚西

汝阳县生态廊道建设路
陶营镇乡棉园村村 12 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红叶李		桧树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	19	3	21	1	26	4		
合计			19	3	21	1	26	4	74	89
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

祁亚男

沁阳县生态廊道建设路

陶营镇乡 柿园村 村 13 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红松		樟子松		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	19	3	18	4	27	3		
2	样地	1	22	1	19	4	29	2		
3	样地	1	20	3	20	3	26	4		
合计			61	7	57	11	82	9	76	89
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨秉昂

邵亚男

汝阳县生态廊道建设路
陶营镇乡 柿园村 村 14 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2019 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红叶松		樟树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	21	1	19	4	25	5		
2	样段	1	20	2	19	3	27	4		
3	样段	1	22	1	21	1	26	4		
合计			63	4	59	8	78	13	75	89
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨恩昂

郭玉玉

26 阳县生态廊道建设路
陶营镇乡 柳堤村 15 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2019 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红叶松		榿树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	19	4	18	4	29	2		
2	样段	1	21	1	19	3	24	6		
3	样段	1	20	2	22	0	27	3		
合计			60	7	59	7	80	11	75	88
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

郭亚男

汝阳县生态廊道建设

陶营镇乡 柿园村 村 16 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2019 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红松		樟子松		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	19	4	20	3	26	4		
2	样段	1	21	3	21	2	28	3		
3	样段	1	22	1	19	2	29	1		
合计			62	8	60	7	83	8	76	90
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典邦

郭亚西

中阳县生态廊道建设路

陶营镇乡村园村 村 17 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		侧柏		红叶李		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	21	2	19	3	28	3		
2	样段	1	21	1	20	2	26	4		
3	样段	1	22	1	20	2	28	2		
合计			64	4	59	7	82	9	75	91
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

郭业西

许昌县生态廊道工程
陶营镇乡 罗营村 村 18 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红松		樟子松		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	20	2	19	3	29	2		
2	样地	1	21	2	19	2	28	3		
3	样地	1	21	1	22	0	29	1		
合计			62	5	60	5	86	6	75	92
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨建邦

邵亚西

陶莹镇乡 罗莹村 村 19 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			4201						造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	70	4						
2	样地	1	71	2						
3	样地	1	68	5						
合计			209	12					74	95
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

名譽

部 25 部

沁阳县生态廊道建设路

小庄镇乡 紫罗村 村 20 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红松		杉 树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	21	2	19	2	28	3		
2	样地	1	20	0	20	3	29	2		
3	样地	1	22	1	18	2	27	2		
合计			63	3	57	7	84	7	74	93
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨奥昂

郭亚西

濮阳县生态廊道工程
小屯镇乡 龙泉村 村 21 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红叶李		榉树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	21	1	18	3	27	4		
2	样段	1	20	3	19	2	26	3		
3	样段	1	20	2	22	0	29	0		
合计			61	6	59	5	82	7	73	92
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

郭亚西

汝阳县生态廊道建设路
小屯镇乡 右泉村 村 22 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			柳 柳						造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	70	3						
2	样段	1	69	5						
3	样段	1	69	4						
4	样段	1	72	3						
合计			280	15					74	95
苗木规格			全格							
整地规格			全格							
混交比例			全格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨建昂

郭亚西

造林验收样地调查表

陶营镇

乡

罗莹

村

改30里生态廊道，改23号小班

调查时间：

2023

年

9

月

18

日

分树种调查(株)

综合

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查(株)						综合	
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	造林密 度(株/ 亩)	成活率 (%)
1	样段	1	72	3						
2	样段	1	71	5						
3	样段	1	69	6						
合计			212	14					74	95.4
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨彦昂

邵亚男

汝阳县生态廊道建设

小屯镇乡 后梁村 村 24 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			红 叶 李						造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	0.5	0	0						
2	样段	0.5	0	0						
3	样段	0.5	0	0						
		未种植								
合计			0	0					0	0
苗木规格			不合格						不合格	
整地规格			不合格							
混交比例			不合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

邵亚明

湖阳县生态廊道24号路
小庄乡小庄村 25 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松						造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	66	7						
2	样地	1	69	5						
3	样地	1	72	4						
合计			207	16					74	93
苗木规格			合格					合格		
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨奥昂

郭亚西

沁阳县沁阳大道24号路
小堡乡 小堡村 26 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			侧柏						造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	0.5	0	0						
2	样地	0.5	0	0						
3	样地	0.5	0	0						
		未种植								
合计			0	0					0	0
苗木规格			不合格						不合格	
整地规格			不合格							
混交比例			不合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

邵立西

泌阳县生态廊道工程
官旗乡 小寨村村 27 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红叶松		杂树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	21	0	19	4	28	3		
2	样地	1	20	2	17	5	27	2		
3	样地	1	22	1	23	0	25	3		
合计			63	3	59	9	80	8	74	91
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

邵业强

小营镇 乡 小营村 村 28 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红 叶 松		木 松		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	0	0	0	0	0	0		
2	样段	1	0	0	0	0	0	0		
3	样段	1	0	0	0	0	0	0		
		种植								
合计			0	0	0	0	0	0	0	0
苗木规格			不合格		不合格		不合格			
整地规格			不合格							
混交比例			不合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

郭亚西

小店镇 乡 小店村 29 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红叶李		臭椿		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	0	0	0	0	0	0		
2	样地	1	0	0	0	0	0	0		
3	样地	1	0	0	0	0	0	0		
		种植								
合计			0	0	0	0	0	0	0	0
苗木规格			不合格		不合格		不合格			
整地规格			不合格							
混交比例			不合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

郭亚西

小店镇 小店村 村 30 号小班

汝阳县生态廊道中穿路

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红松		杂树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	0.5	0	0	0	0	0	0		
2	样段	0.5	0	0	0	0	0	0		
3	样段	0.5	0	0	0	0	0	0		
		未种植								
合计			0	0	0	0	0	0	0	0
苗木规格			不合格		不合格		不合格			
整地规格			不合格							
混交比例			不合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

郭亚西

汝阳县生态廊道工程

小屯镇乡 小屯村 村 31 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红叶李		刺楸		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	0	0	0	0	0	0		
2	样段	1	0	0	0	0	0	0		
3	样段	1	0	0	0	0	0	0		
		柳梢								
合计			0	0	0	0	0	0	0	0
苗木规格			不合格		不合格		不合格			
整地规格			不合格							
混交比例			不合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨海昂

郭业西

河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司
唐镇乡 小店村 32 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红叶松		栎树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	0.5	0	0	0	0	0	0		
2	样段	0.5	0	0	0	0	0	0		
3	样段	0.5	0	0	0	0	0	0		
		未种植								
合计			0	0	0	0	0	0	0	0
苗木规格			不合格		不合格		不合格			
整地规格			不合格							
混交比例			不合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典男

郭亚男

潮县生态廊道建设路
小店镇乡小店村村 33 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		臭椿				造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	0.94	31	4	32	2				
合计			31	4	32	2			73	91
苗木规格			合格		合格					
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

郭亚男

汝阳县生态廊道建设路

小屯乡小庄村 村 34 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松						造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	0.5	0	0	0					
2	样地	0.5	0	0	0					
3	样地	0.5	0	0	0					
		未种植								
合计			0	0					0	0
苗木规格			不合格							
整地规格			不合格							
混交比例			不合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨奥昂

郭书昌

濮阳县生态廊道建设路
小堡乡 小店村 村 35 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松						造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	71	5						
2	样地	1	68	6						
3	样地	1	70	3						
合计			209	14					74	94
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			合格							

小店镇乡 小店村 村 36 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			金松						造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	0	0						
		样种植								
合计			0	0					0	0
苗木规格			不合格							
整地规格			不合格							
混交比例			不合格							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨建宁

邵武

沁阳县生态廊道建设

造林验收样地调查表

小屯镇乡 小店村 村 37 号小班

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		小叶黄杨		金银木		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	22	0	18	4	27	3		
2	样段	1	21	2	17	3	29	3		
3	样段	1	21	1	22	1	26	4		
合计			64	3	57	8	82	10	75	90
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨奥昂

郭亚东

濮阳县东廊道海河路
小屯乡小屯村 村 58 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红杉		银杉		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	19	2	22	0	26	4		
2	样地	1	21	0	17	3	28	3		
3	样地	1	23	1	18	3	26	4		
合计			63	3	57	6	80	11	73	91
苗木规格			合格		合格		合格			
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

邵少强

汝阳县生龙街道汝洛村

造林验收样地调查表

小屯镇 乡 小屯 村 39号小班 2023 调查时间: 2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红杉		桉树		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	22	1	21	2	25	2		
2	样地	1	23	2	19	3	23	1		
3	样地	1	19	4	19	4	27	1		
合计			64	7	59	9	75	4	74	89.1
苗木规格			全杆		全杆		全杆			
整地规格			全杆							
混交比例			全杆							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员: 杨少华 郭亚亚

小店镇乡 小店村 村 40 号小班

冲阳生态廊道沿路

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)								综合	
			红叶李		油松		雪松		杜仲		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	19	2	20	1	8	2	17	3		
2	样段	1	18	3	19	3	7	2	19	1		
3	样段	1	22	1	18	3	10	0	21	1		
合计			59	6	57	7	25	4	57	5	73	90
苗木规格			合格		合格		合格		合格			
整地规格					合格							
混交比例					合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

郭亚巧

冲阳县郑道冲路

小庄乡小庄村 村 41 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			雪松						造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	68	7						
合计			68	7					75	91
苗木规格			全格							
整地规格			全格							
混交比例			全格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

邵书芳

小唐镇 乡 小店村 村 42 号小班

汝阳县生态廊道汝南路

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			雪松						造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	1	66	8						
合计			66	8					74	89
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨勇昂

郭玉芳

造林验收样地调查表

小屯乡 斗店村 45 号小班

调查时间: 2013 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			白皮松		红叶李		银杉		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样地	1	21	1	22	1	26	3		
2	样地	1	21	2	19	2	28	1		
3	样地	1	23	6	17	4	27	2		
合计			65	3	58	7	81	6	74	91
苗木规格										
整地规格										
混交比例										

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨群

邓业

汝阳县铁匠沟乡小寨村 44 号小班

造林验收样地调查表

调查时间:

2023 年 9 月 18 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			雪松						造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)		
1	样段	0.5	33	4						
2	样段	0.5	36	2						
3	样段	0.5	35	1						
合计			104	7					74	94
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			合格							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

郭亚男

汝阳县生态廊道汝安路绿化项目验收图 (1/6)



汝阳县生态廊道汝安路绿化项目验收图（2/6）




汝阳县生态廊道汝安路绿化项目验收图 (3/6)



汝阳县生态廊道汝安路绿化项目验收图 (4/6)



汝阳县生态廊道汝安路绿化项目验收图 (5/6)

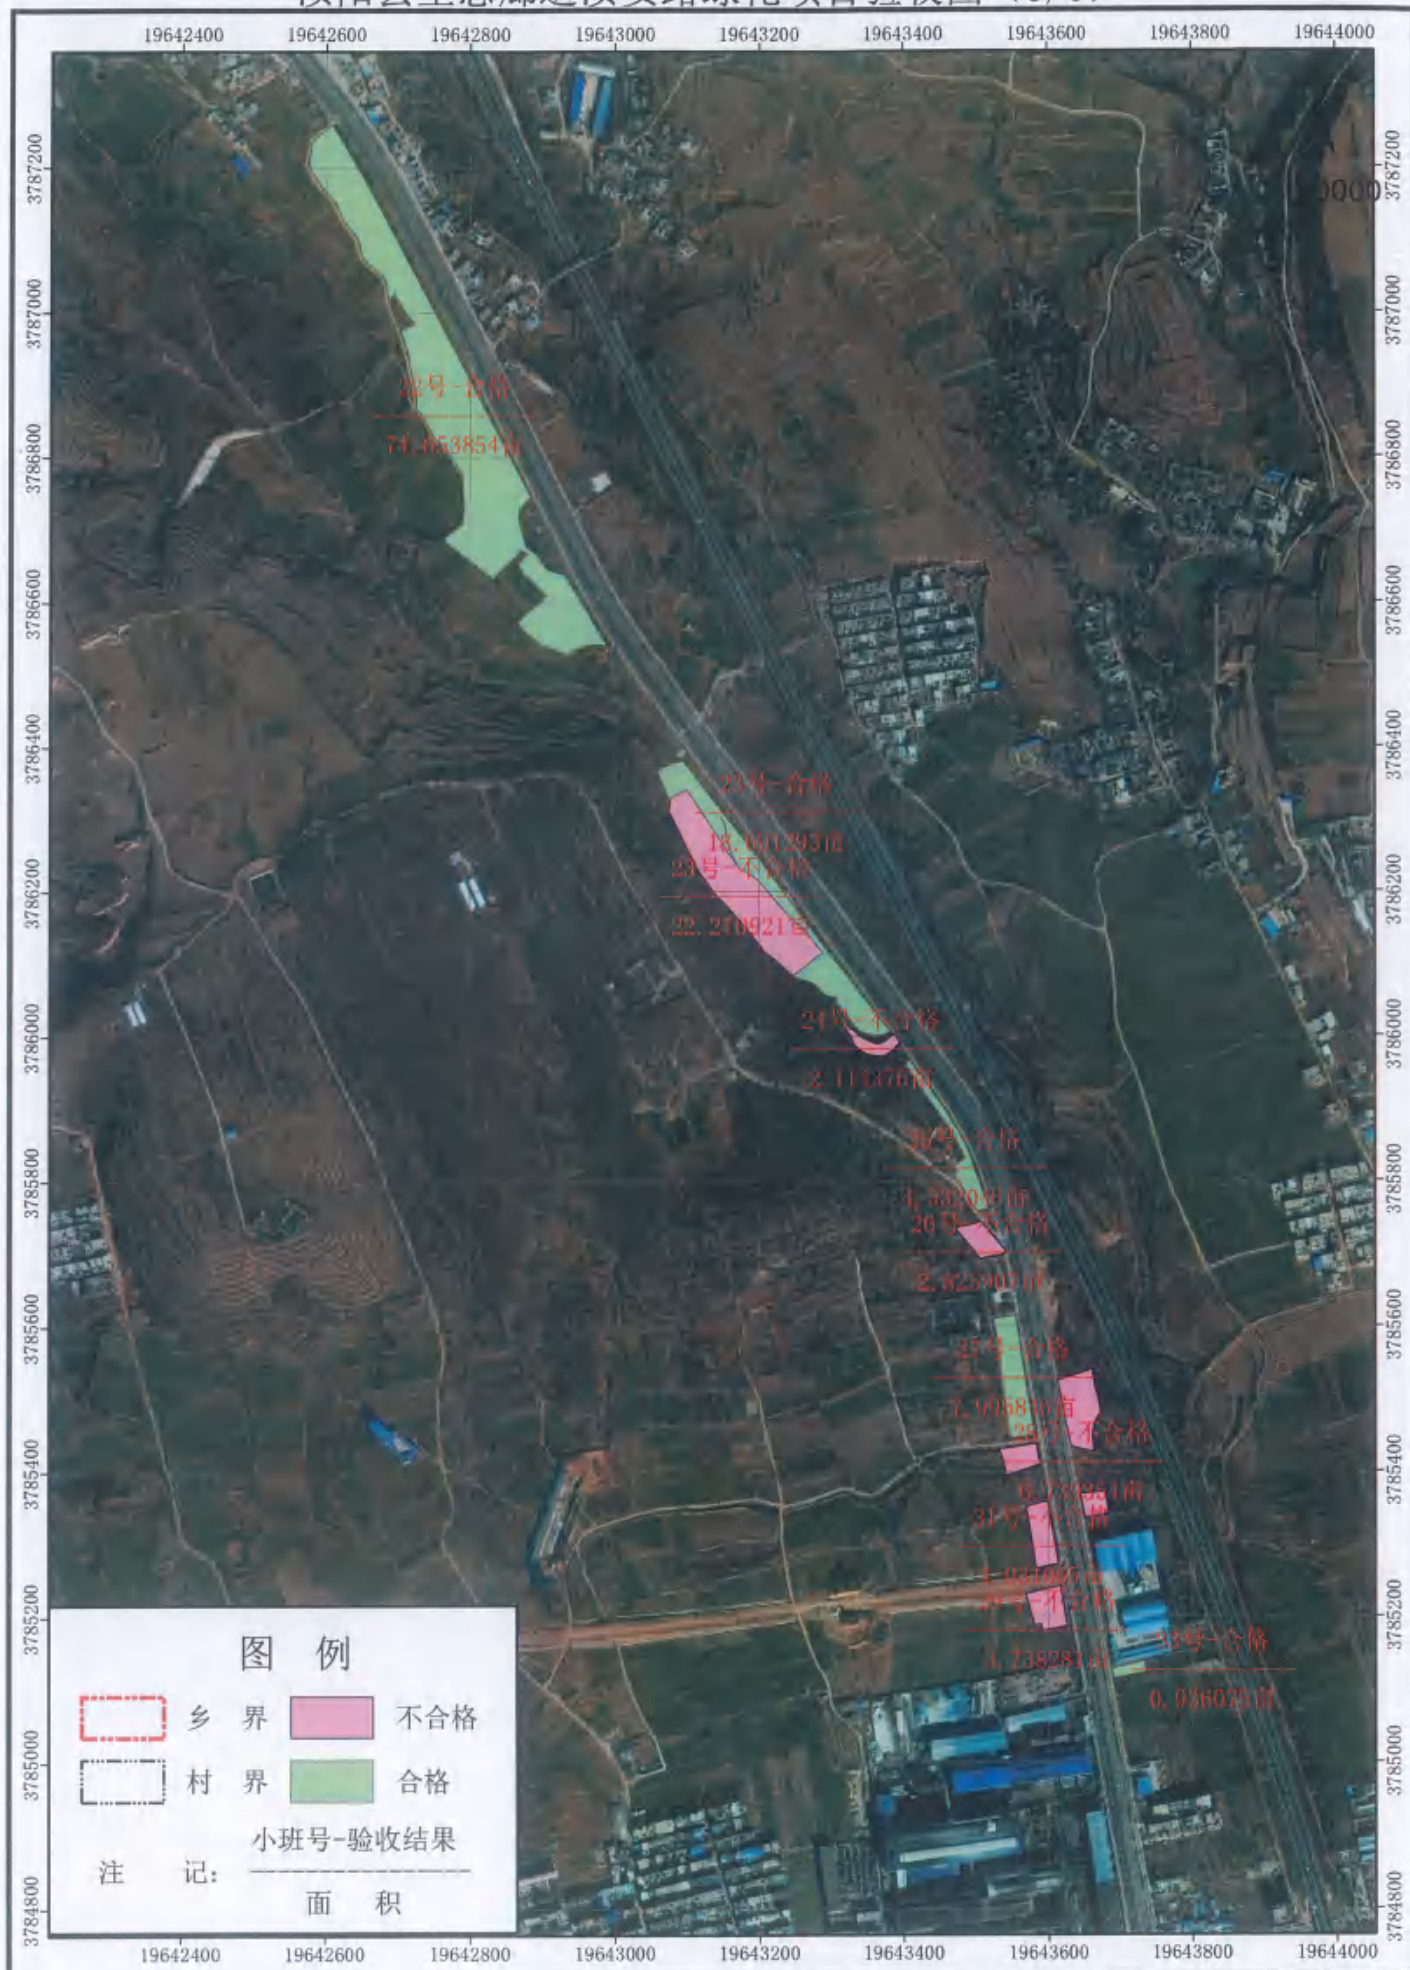

汝阳县生态廊道汝安路绿化项目验收图 (6/6)



汝阳县生态廊道汝安路绿化项目验收现场照片



汝阳县生态廊道汝安路绿化项目验收现场照片



汝阳县生态廊道汝安路绿化项目验收现场照片



汝阳县生态廊道微地形绿化项目验收表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人、%

	乡镇	行政村	工程名称	小班号	规划面积	树种配置	苗木规格	苗木数量	验收意见		验收结果	
									成活率	意见	合格	不合格
	合计				54.92						54.92	
设计	柏树乡	布岭村	北环路	1	4.98							
验收	柏树乡	布岭村	北环路	1	4.98	√	√	√			4.98	
设计	城关镇	张河村	北环路	2	4.82							
验收	城关镇	张河村	北环路	2	4.82	√	√	√			4.82	
设计	城关镇	杨庄村	北环路	3	2.52							
验收	城关镇	杨庄村	北环路	3	2.52	√	√	√			2.52	
设计	城关镇	洛峪村	北环路	4	5.78							
验收	城关镇	洛峪村	北环路	4	5.78	√	√	√			5.78	
设计	城关镇	洛峪村	北环路	5	3.02							
验收	城关镇	洛峪村	北环路	5	3.02	√	√	√			3.02	
设计	小店镇	龙泉村	汝安路	6	16.25							
验收	小店镇	龙泉村	汝安路	6	16.25	√	√	√			16.25	
设计	小店镇	龙泉村	汝安路	7	2.23							
验收	小店镇	龙泉村	汝安路	7	2.23	√	√	√			2.23	
设计	小店镇	龙泉村	汝安路	8	2.77							

汝阳县生态廊道微地形绿化项目验收表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人、%

	乡镇	行政村	工程名称	小班号	规划面积	树种配置	苗木规格	苗木数量	验收意见		验收结果	
									成活率	意见	合格	不合格
	合计				54.92						54.92	
验收	小店镇	龙泉村	汝安路	8	2.77	√	√	√			2.77	
设计	小店镇	小店村	汝安路	9	8.53							
验收	小店镇	小店村	汝安路	9	8.53	√	√	√			8.53	
设计	小店镇	小店村	汝安路	10	4.02							
验收	小店镇	小店村	汝安路	10	4.02	√	√	√			4.02	

微地形绿化项目造林验收样地调查表

小店镇 龙泉

村

8

号小班

调查时间:

2023年

9月

18日

设计类型		设计数量/面积 (株、m²)	验收结果			验收意见	综合评价
			植物成活				
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	成活率、覆盖度 (%)		
乔灌 树种	白皮松1	112	111	2	99.9	合格	
	黄金槐	36	36	1	100		
	美人梅	72	73	0	100		
色块							
草皮							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

邵亚西

微地形绿化项目造林验收样地调查表

小店镇乡 龙泉

村

6

号小班

调查时间:

2023

年

9

月

18

日

设计类型		设计数量/面积 (株、m²)	验收结果			验收意见	综合评价
			植物成活				
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	成活率、覆盖度 (%)		
乔灌 树种	白皮松1	578	569	13	98.4	合格	
	雪松	120	117	4	97.5		
	红叶石楠球	19	19	1	100		
	黄金槐	392	387	21	98.7		
	金叶榆球	17	17	0	100		
	美人梅	162	162	0	100		
	海棠	64	64	0	100		
	红玉兰	32	32	1	100		
	黄玉兰	88	88	2	100		
	樱花	64	64	1	100		
	木槿	88	87	3	98.8		
	红叶碧桃	34	34	0	100		
	红枫	4	4	1	100		
	小叶女贞造型	6	6	2	100		
	造型油松1	2	2	0	100		

邵玉玉

微地形绿化项目造林验收样地调查表

柏树乡东岭村

1

号小班

调查时间:

2023年

9月23日

设计类型		设计数量/面积 (株、m²)	验收结果			验收意见	综合评价
			植物成活				
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	成活率、覆盖度 (%)		
乔灌 树种	白皮松2	13	13		100	合格	
	红叶石楠球	108	108		100		
	造型油松	3	3		100		
	桂花	12	12		100		
	红叶李	10	10		100		
	百日红	20	20		100		
	紫荆	24	24		100		
	银杏	7	7		100		
色块	红叶石楠苗	24100			合格		
草皮		3333			合格		

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨建邦 李亚亚

微地形绿化项目造林验收样地调查表

城关镇乡 张河村村

2号

小班

调查时间:

2023年

9

月

23

日

设计类型		设计数量/面积 (株、m²)	验收结果			验收意见	综合评价
			植物成活				
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	成活率、覆盖度 (%)		
乔灌 树种	红叶石楠球	27	27	1	100	合格.	
	造型油松	6	6	0	100		
	桂花	6	6	0	100		
	大叶女贞	167	166	3	99.4		
	红叶李	11	11	1	100		
	百日红	121	120	3	99		
	银杏	26	26	4	100		
色块							
草皮		2827				合格	

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员: 杨奥昂 郭亚强

微地形绿化项目造林验收样地调查表

城关镇乡 杨庄村

3 号小班

调查时间: 2023 年 9 月 23 日

设计类型		设计数量/面积 (株、m²)	验收结果			验收意见	综合评价
			植物成活				
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	成活率、覆盖率 (%)		
乔灌 树种	白皮松1	114	112	3	98	合格.	
	白皮松2	20	20	1	100.		
	红叶石楠球	42	42	2	100		
	美人梅	12	12	1	100		
	海棠	10	10	0	100		
	造型油松	3	3	0	100		
	五叶地锦	300	287	13	95.6		
	常春藤	1000	987	13	98.7		
	银杏	7	7	0	100		
色 块	金森女贞	24100			合格		
	南天竹	24100			合格		
草皮		685			合格		

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨奥市

邵亚西

微地形绿化项目造林验收样地调查表

城关镇乡 洛峪村

4 号小班

调查时间:

2023年

9 月

18 日

设计类型		设计数量/面积 (株、m²)	验收结果			验收意见	综合评价
			植物成活				
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	成活率、覆盖度 (%)		
乔灌 树种	白皮松1	43	41	4	95	合格	
	白皮松2	66	65	3	98.4		
	红叶石楠球	44	44	1	100		
	美人梅	39	39	0	100		
	造型油松	3	3	0	100		
	紫荆	40	40	2	100		
	五叶地锦	300	294	21	98		
	银杏	7	7	1	100		
色 块	红叶石楠苗	14800			合格		
	金森女贞	14800			合格		
草皮		2480					

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨奥昂

刘亚五

微地形绿化项目造林验收样地调查表

城美乡洛峪村

5 号小班

调查时间:

2021年 9 月 18 日

设计类型		设计数量/面积 (株、m²)	验收结果			验收意见	综合评价
			植物成活				
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	成活率、覆盖度 (%)		
乔灌 树种	白皮松1	30	31	1	100	合格	
	白皮松2	44	43	3	99		
	红叶石楠球	29	29	1	100		
	美人梅	26	26	0	100		
	造型油松	3	3	0	100		
	紫荆	26	27	2	100		
	银杏	15	14	3	93.3		
色 块	红叶石楠苗	10000			合格		
	金森女贞	10000			合格		
草皮		2480			合格		

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨奥希

祁亚西

微地形绿化项目造林验收样地调查表

小店镇乡 龙泉村 村

6 号小班

调查时间: 2021年 9 月 18 日

设计类型		设计数量/面积 (株、m²)	验收结果			验收意见	综合评价
			植物成活				
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	成活率、覆盖度 (%)		
	造型油松2	4	4	0	100	合格	
	桂花	5	5	0	100		
	红叶李	160	158	12	98.7		
	紫荆	88	87	6	98.8		
	树桩月季	20	23	1	100		
	楸树	128	121	12	94.5		
	白蜡	65	65		100		
	银杏	93	92	1	99.4		
	五角枫	142	138	6	97.1		
色块	红叶石楠苗	14300			合格		
	小叶女贞苗	14300			合格		
	金森女贞	14300			合格		
草皮		8300			合格		

杨惠 邵亚

微地形绿化项目造林验收样地调查表

小店镇乡 九泉

村

7

号小班

调查时间:

2023 年

9 月

18 日

设计类型		设计数量/面积 (株、m²)	验收结果			验收意见	综合评价
			植物成活				
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	成活率、覆盖度 (%)		
乔灌 树种	白皮松1	220	217	3	98.6	合格	
	黄金槐	122	120	4	98.3		
	美人梅	96	97	1	100		
色块							
草皮							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨坤 邵业书

微地形绿化项目造林验收样地调查表

小屋镇乡 九泉

村

8

号小班

调查时间:

2023

年

9

月

18

日

设计类型		设计数量/面积 (株、m²)	验收结果			验收意见	综合评价
			植物成活				
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	成活率、覆盖度 (%)		
乔灌 树种	白皮松1	112	113	1	100	合格	
	黄金槐	36	36	0	100		
	美人梅	72	71	3	98.6		
色块							
草皮							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

郭玉玉

微地形绿化项目造林验收样地调查表

小陆镇乡

小店

村

9

号小班

调查时间:

2023年

9月

18日

设计类型		设计数量/面积 (株、m²)	验收结果			验收意见	综合评价
			植物成活				
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	成活率、覆盖度 (%)		
乔灌 树种	白皮松1	300	297	4	99	全挂	
	白皮松2	100	97	5	97		
	红叶石楠球	60	57	6	95		
	造型油松2	9	9	0	100		
	红叶李	250	247	7	98.8		
	百日红	150	143	8	95.3		
	紫荆	35	32	4	91.4		
	白蜡	50	47	5	94		
色 块	红叶石楠苗	83000				全挂	
	金森女贞	83000				全挂	
草皮		4000				全挂	

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

郭玉玉

微地形绿化项目造林验收样地调查表

小店镇乡 小店

村

10

号小班

调查时间:

2023年 9 月 18 日

设计类型		设计数量/面积 (株、m²)	验收结果			验收意见	综合评价
			植物成活				
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格苗木)	成活率、覆盖度 (%)		
乔灌 树种	白皮松2	111	112	1	100.	合格	
	红叶石楠球	33	31	4	93.9.		
	百日红	17	16	3	94.		
	百日红	150	147	6	98.		
	紫荆	20	20	1	100		
	白蜡	35	34	3	97.4		
	银杏	250	242	11	96.8.		
色 块	金森女贞	51200			合格		
	连翘	51200			合格		
草皮		4000			合格.		

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员: 杨奥昂

邓亚五

汝阳县生态廊道微地形绿化项目验收图 (1/6)



汝阳县生态廊道微地形绿化项目验收图 (2/6)



汝阳县生态廊道微地形绿化项目验收图 (3/6)




汝阳县生态廊道微地形绿化项目验收图（4/6）




汝阳县生态廊道微地形绿化项目验收图 (5/6)



汝阳县生态廊道微地形绿化项目验收图（6/6）

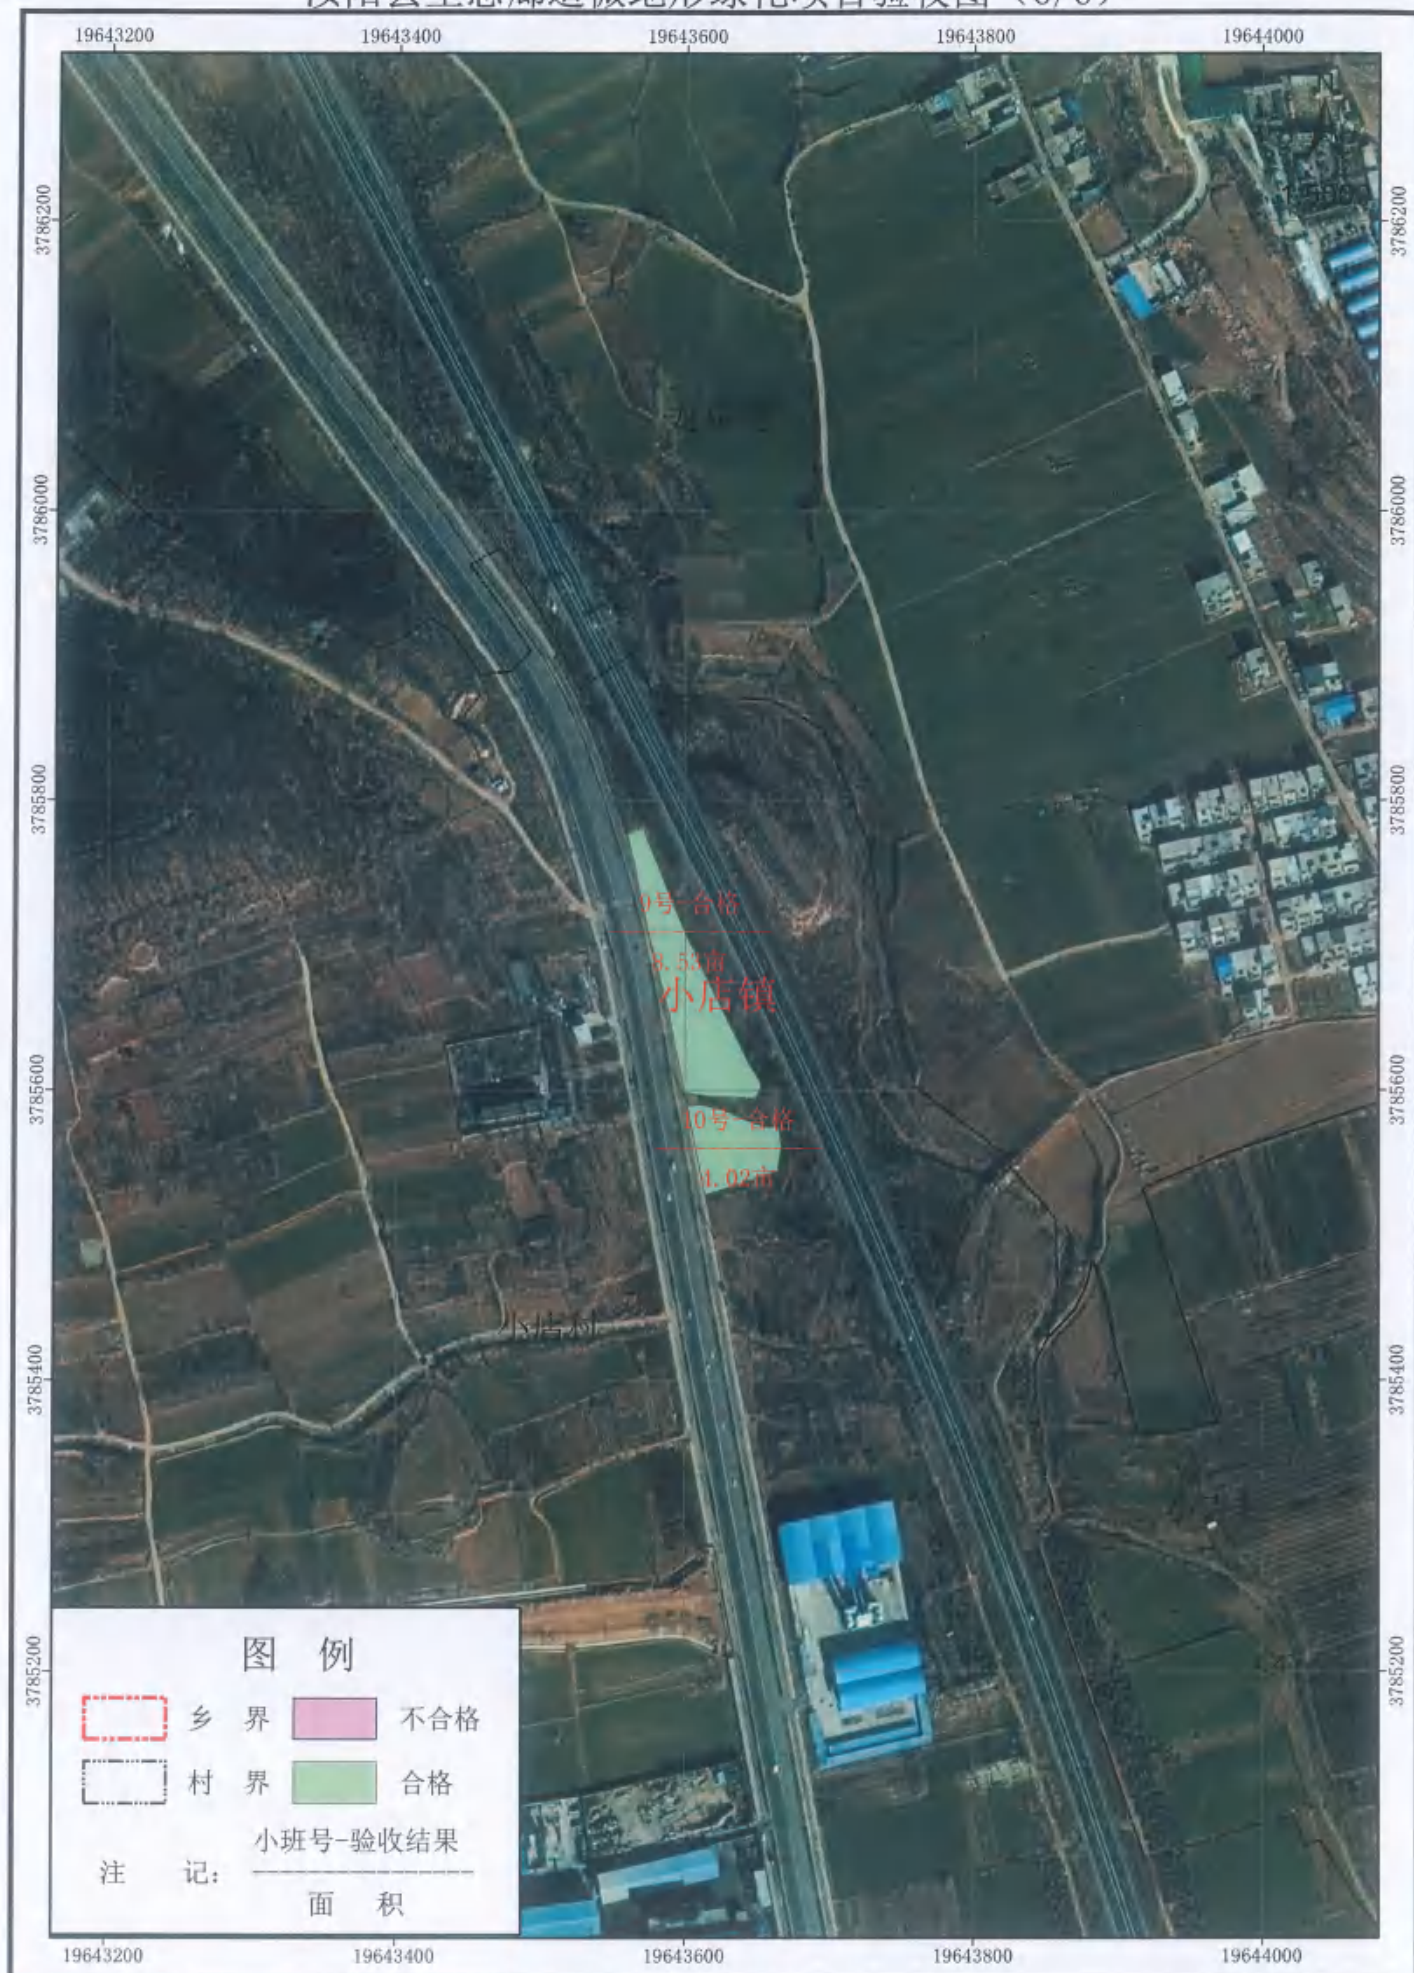


汝阳县生态廊道微地形绿化项目验收现场照片

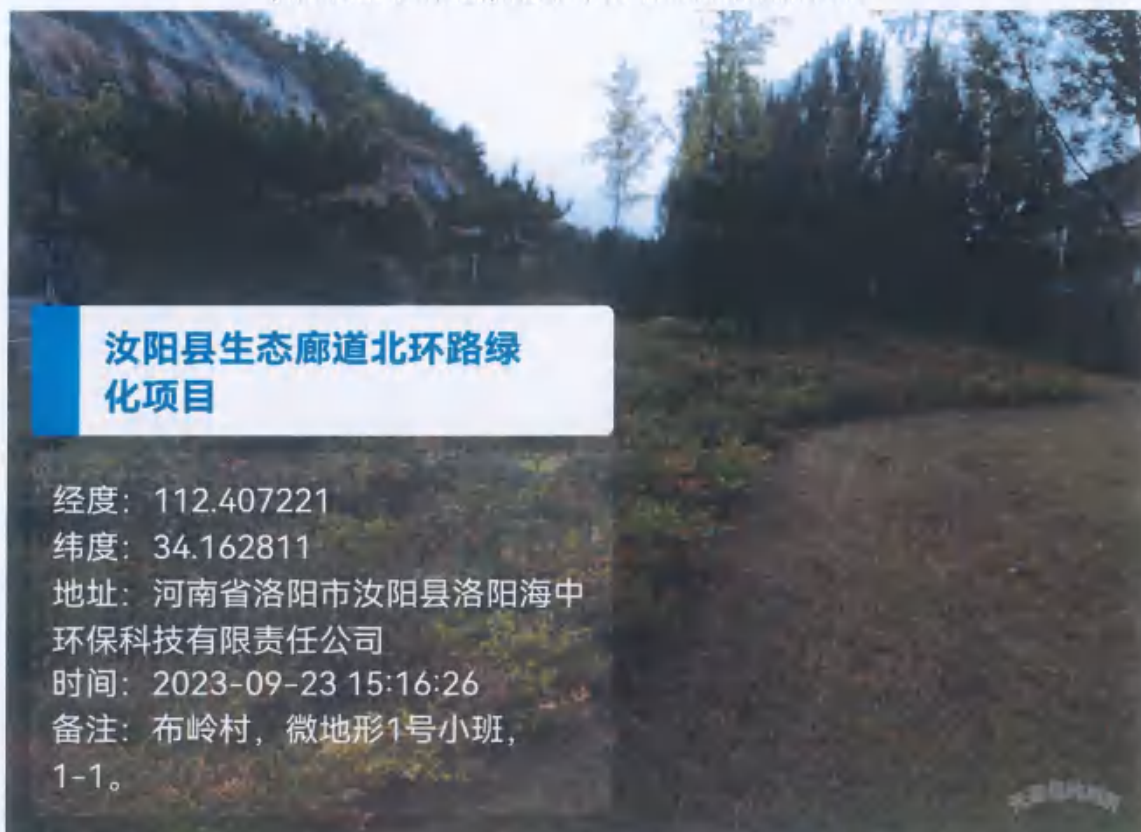

汝阳县生态廊道微地形绿化项目验收现场照片



汝阳县生态廊道微地形绿化项目验收现场照片

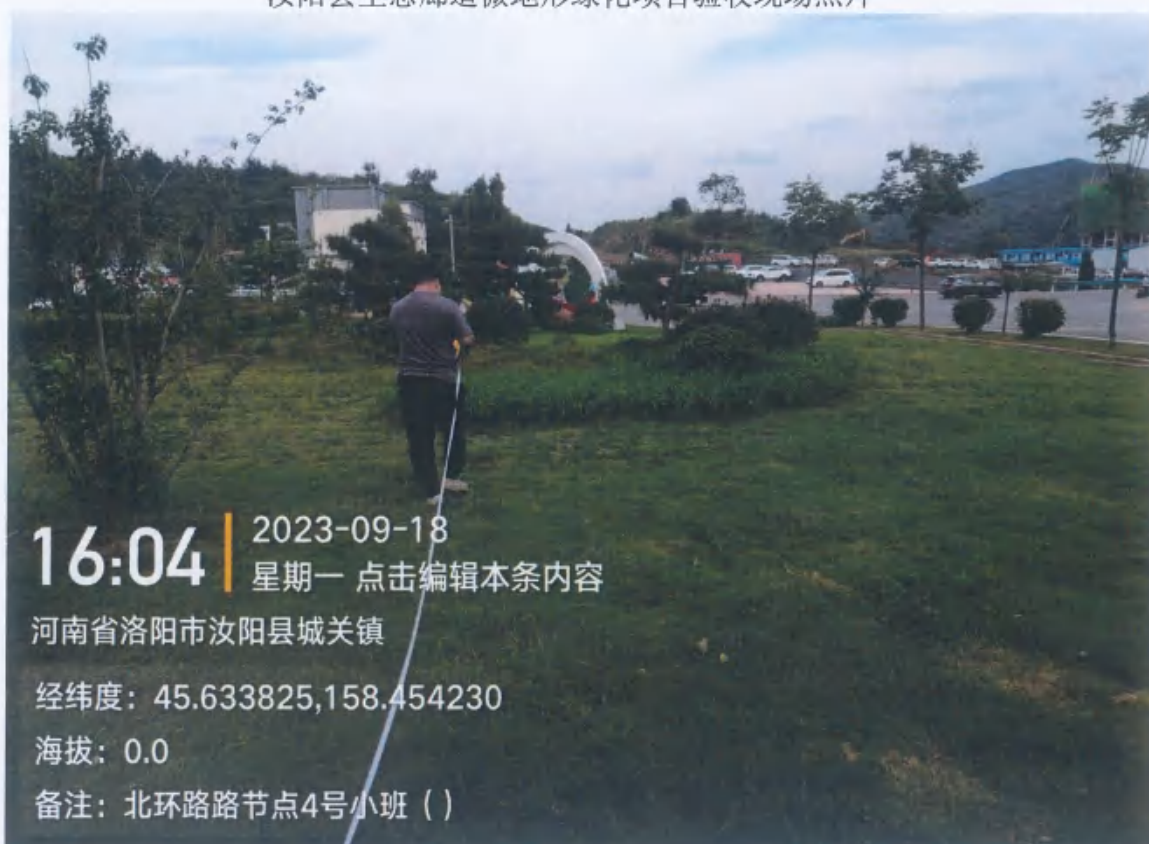

16:04 | 2023-09-18
星期一 点击编辑本条内容

河南省洛阳市汝阳县城关镇

经纬度: 45.633825,158.454230

海拔: 0.0

备注: 北环路路节点4号小班 ()



12:42 | 2023-09-18
星期一 多云 27°C 南风≤3级

河南省洛阳市汝阳县小店镇

经纬度: 45.633825,158.454230

海拔: 0.0

备注: 微地形6号小班

汝阳县橡子直播验收一览表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人、%

	乡镇	行政村	小班号	面积	造林设计						抚育设计		管护		验收结果			
					树种	造林方法	造林密度(穴/亩)	造林		栽植时间	方式	时间			成活率	合格面积	不合格面积	不合格原因
								年度	施工时间									
合计			20463.89												19553.49	910.4		
设计	三屯镇	花西村	3	235.82	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	三屯镇	花西村	3	235.82	√	√	√	\	\	\	\	\	\	86.9	235.82			
设计	三屯镇	花东村	4	103.70	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	三屯镇	花东村	4	103.70	√	√	√	\	\	\	\	\	\	86	103.70			
设计	柏树乡	布岭村	5	63.42	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	柏树乡	布岭村	5	63.42	√	√	√	\	\	\	\	\	\	88.4	63.42			
设计	三屯镇	花东村	6	126.57	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	三屯镇	花东村	6	126.57	√	√	√	\	\	\	\	\	\	86.5	126.57			
设计	城关镇	罗沟村	8	11.58	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	罗沟村	8	11.58	√	√	√	\	\	\	\	\	\	88.1	11.58			

汝阳县橡子直播验收一览表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人、%

	乡镇	行政村	小班号	面积	造林设计					抚育设计		管护		验收结果				
					树种	造林方法	造林密度(穴/亩)	造林		栽植时间	方式			时间	成活率	合格面积	不合格面积	不合格原因
								年度	施工时间									
合计			20463.89												19553.49	910.4		
设计	柏树乡	孔龙村	12	51.70	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	柏树乡	孔龙村	12	51.70	√	√	√	\\	\\	\\	\\	\\	\\	86.8	51.70			
设计	柏树乡	布岭村	13	592.79	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	柏树乡	布岭村	13	592.79	√	√	√	\\	\\	\\	\\	\\	\\	87.9	587.58	5.21	光伏电站	
设计	柏树乡	五龙村	17	196.18	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	柏树乡	五龙村	17	196.18	√	√	√	\\	\\	\\	\\	\\	\\	88.2	196.18			
设计	柏树乡	孔龙村	23	504.44	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	柏树乡	孔龙村	23	504.44	√	√	√	\\	\\	\\	\\	\\	\\	90.6	263.08	241.36	有林地	
设计	柏树乡	布岭村	25	11.44	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	柏树乡	布岭村	25	11.44	√	√	√	\\	\\	\\	\\	\\	\\	94	11.44			

汝阳县橡子直播验收一览表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人、%

	乡镇	行政村	小班号	面积	造林设计					抚育设计		管护		验收结果				
					树种	造林方法	造林密度(穴/亩)	造林		栽植时间	方式			时间	成活率	合格面积	不合格面积	不合格原因
								年度	施工时间									
合计			20463.89											19553.49	910.4			
设计	城关镇	罗沟村	30	17.06	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	罗沟村	30	17.06	√	√	√	\\	\\	\\	\\	\\	\\	90	17.06			
设计	柏树乡	秦停村	44	23.28	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	柏树乡	秦停村	44	23.28	√	√	√	\\	\\	\\	\\	\\	\\	88.8	23.28			
设计	城关镇	罗沟村	45	10.75	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	罗沟村	45	10.75	√	√	√	\\	\\	\\	\\	\\	\\	86.7	10.75			
设计	柏树乡	孔龙村	47	25.43	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	柏树乡	孔龙村	47	25.43	√	√	√	\\	\\	\\	\\	\\	\\	92.2	25.43			
设计	城关镇	张河村	52	129.74	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	张河村	52	129.74	√	√	√	\\	\\	\\	\\	\\	\\	91.5	129.74			

汝阳县橡子直播验收一览表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人、%

	乡镇	行政村	小班号	面积	造林设计					抚育设计		管护		验收结果				
					树种	造林方法	造林密度(穴/亩)	造林		栽植时间	方式			时间	成活率	合格面积	不合格面积	不合格原因
								年度	施工时间									
合计			20463.89											19553.49	910.4			
设计	陶营镇	大虎岭林场三区	55	707.52	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	陶营镇	大虎岭林场三区	55	707.52	√	√	√	\	\	\	\	\	\	88	707.52			
设计	小店镇	双丰村	60	938.00	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	小店镇	双丰村	60	938.00	√	√	√	\	\	\	\	\	\	89.7	784.33	153.67	有林地	
设计	陶营镇	大虎岭林场三区	90	566.52	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	陶营镇	大虎岭林场三区	90	566.52	√	√	√	\	\	\	\	\	\	88.4	566.52			
设计	城关镇	三角堂村	106	599.51	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	三角堂村	106	599.51	√	√	√	\	\	\	\	\	\	90.9	599.51			

汝阳县橡子直播验收一览表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人、%

	乡镇	行政村	小班号	面积	造林设计					抚育设计		管护		验收结果				
					树种	造林方法	造林密度(穴/亩)	造林		栽植时间	方式			时间	成活率	合格面积	不合格面积	不合格原因
								年度	施工时间									
合计			20463.89											19553.49	910.4			
设计	刘店镇	洪岭村	134	464.90	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	刘店镇	洪岭村	134	464.90	√	√	√	\	\	\	\	\	\	86.5	464.90			
设计	柏树乡	黄路村	159	5.98	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	柏树乡	黄路村	159	5.98	√	√	√	\	\	\	\	\	\	92	5.98			
设计	城关镇	杨庄村	197	126.80	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	杨庄村	197	126.80	√	√	√	\	\	\	\	\	\	92.5	124.97	1.83	简易房	
设计	小店镇	双丰村	199	583.92	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	小店镇	双丰村	199	583.92	√	√	√	\	\	\	\	\	\	88.9	583.92			
设计	城关镇	洪涧村	237	324.77	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	洪涧村	237	324.77	√	√	√	\	\	\	\	\	\	88.5	324.77			

汝阳县橡子直播验收一览表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人、%

	乡镇	行政村	小班号	面积	造林设计					抚育设计		管护		验收结果				
					树种	造林方法	造林密度(穴/亩)	造林		栽植时间	方式			时间	成活率	合格面积	不合格面积	不合格原因
								年度	施工时间									
合计			20463.89												19553.49	910.4		
设计	柏树乡	黄路村	254	35.90	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	柏树乡	黄路村	254	35.90	√	√	√	\\	\\	\\	\\	\\	\\	88.8	35.90			
设计	城关镇	张河村	272	5.23	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	张河村	272	5.23	√	√	√	\\	\\	\\	\\	\\	\\	89.6	5.23			
设计	柏树乡	康扒村	275	70.43	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	柏树乡	康扒村	275	70.43	√	√	√	\\	\\	\\	\\	\\	\\	89.7	70.43			
设计	十八盘乡	石门村	278	1637.12	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	十八盘乡	石门村	278	1637.12	√	√	√	\\	\\	\\	\\	\\	\\	89.5	1412.91	224.21	陡坡、水域	
设计	三屯镇	东局村	281	366.00	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						

汝阳县橡子直播验收一览表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人、%

	乡镇	行政村	小班号	面积	造林设计						抚育设计		管护		验收结果			
					树种	造林方法	造林密度(穴/亩)	造林		栽植时间	方式	时间			成活率	合格面积	不合格面积	不合格原因
								年度	施工时间									
合计			20463.89												19553.49	910.4		
验收	三屯镇	东局村	281	366.00	√	√	√	\	\	\	\	\	\	87.9	366.00			
设计	城关镇	郜园村	289	194.33	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	郜园村	289	194.33	√	√	√	\	\	\	\	\	\	90	194.33			
设计	三屯镇	东局村	301	128.85	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	三屯镇	东局村	301	128.85	√	√	√	\	\	\	\	\	\	89.3	128.85			
设计	城关镇	张河村	306	6.82	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	张河村	306	6.82	√	√	√	\	\	\	\	\	\	88.6	6.82			
设计	柏树乡	黄路村	314	77.47	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	柏树乡	黄路村	314	77.47	√	√	√	\	\	\	\	\	\	88.6	77.47			
设计	柏树乡	杨沟村	315	908.51	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						

汝阳县橡子直播验收一览表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人、%

	乡镇	行政村	小班号	面积	造林设计					抚育设计		管护		验收结果				
					树种	造林方法	造林密度(穴/亩)	造林		栽植时间	方式			时间	成活率	合格面积	不合格面积	不合格原因
								年度	施工时间									
合计			20463.89												19553.49	910.4		
验收	柏树乡	杨沟村	315	908.51	√	√	√	\	\	\	\	\	\	88.8	866.06	42.45	陡坡、水域	
设计	城关镇	罗沟村	318	45.19	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	罗沟村	318	45.19	√	√	√	\	\	\	\	\	\	91.5	42.78	2.41	厂房	
设计	城关镇	张河村	322	39.38	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	张河村	322	39.38	√	√	√	\	\	\	\	\	\	88.8	39.38			
设计	城关镇	云梦村	333	459.73	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	云梦村	333	459.73	√	√	√	\	\	\	\	\	\	89.4	459.73			
设计	小店镇	双丰村	346	155.41	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	小店镇	双丰村	346	155.41	√	√	√	\	\	\	\	\	\	90.5	155.41			

汝阳县橡子直播验收一览表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人、%

	乡镇	行政村	小班号	面积	造林设计					抚育设计		管护		成活率	验收结果			
					树种	造林方法	造林密度(穴/亩)	造林		栽植时间	方式				时间	合格面积	不合格面积	不合格原因
								年度	施工时间									
合计			20463.89												19553.49	910.4		
设计	城关镇	罗沟村	366	24.90	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	罗沟村	366	24.90	√	√	×	√	√	√	√	√	√	86.2	24.90			
设计	城关镇	罗沟村	368	15.16	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	罗沟村	368	15.16	√	√	√	√	√	√	√	√	√	88.1	15.16			
设计	城关镇	罗沟村	370	26.36	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	罗沟村	370	26.36	√	√	√	√	√	√	√	√	√	88.6	26.36			
设计	城关镇	罗沟村	371	18.99	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	罗沟村	371	18.99	√	√	√	√	√	√	√	√	√	87	18.99			
设计	城关镇	罗沟村	372	5.30	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						

汝阳县橡子直播验收一览表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人、%

	乡镇	行政村	小班号	面积	造林设计						抚育设计		管护	成活率	验收结果		
					树种	造林方法	造林密度(穴/亩)	造林		栽植时间	方式	时间			合格面积	不合格面积	不合格原因
								年度	施工时间								
合计			20463.89												19553.49	910.4	
验收	城关镇	罗沟村	372	5.30	√	√	√	\	\	\	\	\	\	88.4	5.30		
设计	柏树乡	黄路村	379	36.05	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份					
验收	柏树乡	黄路村	379	36.05	√	√	√	\	\	\	\	\	\	89.4	36.05		
设计	城关镇	洪涧村	387	335.21	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份					
验收	城关镇	洪涧村	387	335.21	√	√	√	\	\	\	\	\	\	88.5	335.21		
设计	十八盘乡	木庄村	407	387.46	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份					
验收	十八盘乡	木庄村	407	387.46	√	√	√	\	\	\	\	\	\	89.6	387.46		
设计	城关镇	罗沟村	409	92.29	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份					
验收	城关镇	罗沟村	409	92.29	√	√	√	\	\	\	\	\	\	87.3	92.29		

汝阳县橡子直播验收一览表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人、%

	乡镇	行政村	小班号	面积	造林设计						抚育设计		管护		验收结果			
					树种	造林方法	造林密度(穴/亩)	造林		栽植时间	方式	时间			成活率	合格面积	不合格面积	不合格原因
								年度	施工时间									
合计			20463.89												19553.49	910.4		
设计	城关镇	罗沟村	424	106.79	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	罗沟村	424	106.79	√	√	×	\	\	\	\	\	\	0	0.00	106.79	陡坡	
设计	小店镇	紫罗村	425	861.45	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	小店镇	紫罗村	425	861.45	√	√	√	\	\	\	\	\	\	87.9	861.45			
设计	城关镇	罗沟村	426	452.76	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	罗沟村	426	452.76	√	√	√	\	\	\	\	\	\	88.8	435.37	17.39	光伏板	
设计	城关镇	洪涧村	430	13.14	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	洪涧村	430	13.14	√	√	√	\	\	\	\	\	\	87.4	13.14			
设计	城关镇	洪涧村	431	74.28	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						

汝阳县橡子直播验收一览表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人、%

	乡镇	行政村	小班号	面积	造林设计						抚育设计		管护		验收结果			
					树种	造林方法	造林密度(穴/亩)	造林		栽植时间	方式	时间			成活率	合格面积	不合格面积	不合格原因
								年度	施工时间									
合计			20463.89												19553.49	910.4		
验收	城关镇	洪涧村	431	74.28	√	√	×	\	\	\	\	\	\	86.7	74.28			
设计	城关镇	洪涧村	432	230.67	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	洪涧村	432	230.67	√	√	×	\	\	\	\	\	\	87.1	230.67			
设计	城关镇	洪涧村	434	394.26	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	洪涧村	434	394.26	√	√	√	\	\	\	\	\	\	88.4	394.26			
设计	十八盘乡	木庄村	453	125.76	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	十八盘乡	木庄村	453	125.76	√	√	√	\	\	\	\	\	\	88.7	125.76			
设计	小店镇	双丰村	454	134.10	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	小店镇	双丰村	454	134.10	√	√	√	\	\	\	\	\	\	87.5	134.10			

汝阳县橡子直播验收一览表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人、%

	乡镇	行政村	小班号	面积	造林设计						抚育设计		管护	成活率	验收结果		
					树种	造林方法	造林密度(穴/亩)	造林		栽植时间	方式	时间			合格面积	不合格面积	不合格原因
								年度	施工时间								
合计			20463.89												19553.49	910.4	
设计	城关镇	云梦村	457	933.83	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份					
验收	城关镇	云梦村	457	933.83	√	√	√	\\	\\	\\	\\	\\	\\	87.4	933.83		
设计	柏树乡	黄路村	463	62.74	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份					
验收	柏树乡	黄路村	463	62.74	√	√	√	\\	\\	\\	\\	\\	\\	89.1	62.74		
设计	柏树乡	黄路村	464	204.66	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份					
验收	柏树乡	黄路村	464	204.66	√	√	√	\\	\\	\\	\\	\\	\\	86.9	204.66		
设计	城关镇	云梦村	476	334.86	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份					
验收	城关镇	云梦村	476	334.86	√	√	√	\\	\\	\\	\\	\\	\\	86.8	334.86		

汝阳县橡子直播验收一览表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人、%

	乡镇	行政村	小班号	面积	造林设计					抚育设计		管护		验收结果			
					树种	造林方法	造林密度(穴/亩)	造林		栽植时间	方式		时间	成活率	合格面积	不合格面积	不合格原因
								年度	施工时间								
合计			20463.89											19553.49	910.4		
设计	城关镇	洪涧村	486	31.31	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份					
验收	城关镇	洪涧村	486	31.31	√	√	√	\	\	\	\	\	\	88.6	31.31		
设计	柏树乡	黄路村	490	36.27	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份					
验收	柏树乡	黄路村	490	36.27	√	√	√	\	\	\	\	\	\	87.1	36.27		
设计	柏树乡	黄路村	498	39.42	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份					
验收	柏树乡	黄路村	498	39.42	√	√	√	\	\	\	\	\	\	87.4	39.42		
设计	柏树乡	黄路村	499	218.47	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份					
验收	柏树乡	黄路村	499	218.47	√	√	√	\	\	\	\	\	\	88.2	218.47		
设计	城关镇	井沟村	502	137.25	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份					

汝阳县橡子直播验收一览表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人、%

	乡镇	行政村	小班号	面积	造林设计						抚育设计		管护	成活率	验收结果		
					树种	造林方法	造林密度(穴/亩)	造林		栽植时间	方式	时间			合格面积	不合格面积	不合格原因
								年度	施工时间								
合计			20463.89												19553.49	910.4	
验收	城关镇	井沟村	502	137.25	√	√	√	\	\	\	\	\	\	88.5	137.25		
设计	柏树乡	康扒村	513	101.86	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份					
验收	柏树乡	康扒村	513	101.86	√	√	√	\	\	\	\	\	\	90.2	101.86		
设计	柏树乡	康扒村	514	85.60	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份					
验收	柏树乡	康扒村	514	85.60	√	√	√	\	\	\	\	\	\	91.4	85.60		
设计	柏树乡	布岭村	520	28.78	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份					
验收	柏树乡	布岭村	520	28.78	√	√	√	\	\	\	\	\	\	91.3	14.01	14.77	采矿区
设计	柏树乡	秦停村	538	63.93	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份					
验收	柏树乡	秦停村	538	63.93	√	√	√	\	\	\	\	\	\	92.8	63.93		

汝阳县橡子直播验收一览表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人、%

	乡镇	行政村	小班号	面积	造林设计						抚育设计		管护		验收结果			
					树种	造林方法	造林密度(穴/亩)	造林		栽植时间	方式	时间			成活率	合格面积	不合格面积	不合格原因
								年度	施工时间									
合计			20463.89												19553.49	910.4		
设计	陶营镇	柿园村	552	563.06	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	陶营镇	柿园村	552	563.06	√	√	√	\	\	\	\	\	\	90.9	563.06			
设计	柏树乡	黄路村	556	14.10	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	柏树乡	黄路村	556	14.10	√	√	√	\	\	\	\	\	\	90.2	14.10			
设计	柏树乡	黄路村	564	71.60	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	柏树乡	黄路村	564	71.60	√	√	√	\	\	\	\	\	\	92.1	71.60			
设计	城关镇	井沟村	573	163.74	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	井沟村	573	163.74	√	√	√	\	\	\	\	\	\	89.7	163.74			

汝阳县橡子直播验收一览表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人、%

	乡镇	行政村	小班号	面积	造林设计					抚育设计		管护		成活率	验收结果			
					树种	造林方法	造林密度(穴/亩)	造林		栽植时间	方式				时间	合格面积	不合格面积	不合格原因
								年度	施工时间									
合计			20463.89												19553.49	910.4		
设计	城关镇	杨庄村	588	37.26	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	杨庄村	588	37.26	√	√	√	\	\	\	\	\	\	92.6	37.26			
设计	城关镇	杨庄村	590	259.13	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	杨庄村	590	259.13	√	√	√	\	\	\	\	\	\	87.6	255.15	3.98	道路	
设计	城关镇	河西村	623	140.66	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	河西村	623	140.66	√	√	√	\	\	\	\	\	\	90.5	140.66			
设计	城关镇	张河村	628	521.10	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	张河村	628	521.10	√	√	√	\	\	\	\	\	\	90	521.10			
设计	三屯镇	西局村	677	28.07	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						

汝阳县橡子直播验收一览表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人、%

	乡镇	行政村	小班号	面积	造林设计					抚育设计		管护		验收结果				
					树种	造林方法	造林密度(穴/亩)	造林		栽植时间	方式			时间	成活率	合格面积	不合格面积	不合格原因
								年度	施工时间									
合计			20463.89											19553.49	910.4			
验收	三屯镇	西局村	677	28.07	√	√	√	\\	\\	\\	\\	\\	\\	89.9	28.07			
设计	城关镇	张河村	700	24.91	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	张河村	700	24.91	√	√	√	\\	\\	\\	\\	\\	\\	90	24.91			
设计	城关镇	河西村	714	255.16	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	河西村	714	255.16	√	√	√	\\	\\	\\	\\	\\	\\	89.6	255.16			
设计	城关镇	张河村	740	145.53	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	张河村	740	145.53	√	√	√	\\	\\	\\	\\	\\	\\	86.9	86.59	58.94	有林地	
设计	城关镇	张河村	765	320.23	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份						
验收	城关镇	张河村	765	320.23	√	√	√	\\	\\	\\	\\	\\	\\	91	320.23			

汝阳县橡子直播验收一览表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人、%

	乡镇	行政村	小班号	面积	造林设计					抚育设计		管护		验收结果			
					树种	造林方法	造林密度(穴/亩)	造林		栽植时间	方式		时间	成活率	合格面积	不合格面积	不合格原因
								年度	施工时间								
合计			20463.89											19553.49	910.4		
设计	城关镇	张河村	781	138.15	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份					
验收	城关镇	张河村	781	138.15	√	√	√	\\	\\	\\	\\	\\	\\	90	138.15		
设计	刘店镇	滕岭村	793	166.70	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份					
验收	刘店镇	滕岭村	793	166.70	√	√	√	\\	\\	\\	\\	\\	\\	88.8	166.70		
设计	城关镇	河西村	837	34.67	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份					
验收	城关镇	河西村	837	34.67	√	√	√	\\	\\	\\	\\	\\	\\	89	34.67		
设计	柏树乡	孔龙村	890	115.09	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份					
验收	柏树乡	孔龙村	890	115.09	√	√	√	\\	\\	\\	\\	\\	\\	89.7	115.09		
设计	城关镇	张河村	916	502.00	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份					

汝阳县橡子直播验收一览表

单位：亩、株/亩、株、kg、年、次、人、%

	乡镇	行政村	小班号	面积	造林设计					抚育设计		管护		验收结果			
					树种	造林方法	造林密度(穴/亩)	造林		栽植时间	方式		时间	成活率	合格面积	不合格面积	不合格原因
								年度	施工时间								
合计			20463.89											19553.49	910.4		
验收	城关镇	张河村	916	502.00	√	√	√	\	\	\	\	\	\	90	502.00		
设计	城关镇	张河村	952	233.08	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份					
验收	城关镇	张河村	952	233.08	√	√	√	\	\	\	\	\	\	91	233.08		
设计	城关镇	张河村	959	145.49	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份					
验收	城关镇	张河村	959	145.49	√	√	√	\	\	\	\	\	\	90	108.10	37.39	采矿区
设计	柏树乡	黄路村	2412	46.34	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份					
验收	柏树乡	黄路村	2412	46.34	√	√	√	\	\	\	\	\	\	93	46.34		
设计	柏树乡	黄路村	2424	371.72	橡子	种子造林	333	2021	秋季	秋季	定苗除草	8-9月份					
验收	柏树乡	黄路村	2424	371.72	√	√	√	\	\	\	\	\	\	90.2	371.72		

造林验收样地调查表

三屯乡 花西村 3 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 10 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	286	50						
2	样圆	1	284	49						
3	样圆	1	284	53						
4	样圆	1	287	51						
5	样圆	1	280	47						
6	样圆	1	300	32						
7	样圆	1	295	41						
8	样圆	1	290	52						
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			2316	376					333	86.9
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨典昂

邵亚亚

造林验收样地调查表

三屯乡 花东村 4号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 11 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	285	54						
2	样圆	1	290	47						
3	样圆	1	284	58						
4	样圆	1	287	51						
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			1146	210					333	86
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员： 杨 郭

杨 郭

郭 郭

造林验收样地调查表

栢树乡布岭村 5 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023 年 10 月 16 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	295	44						
2	样圆	1	286	49						
3	样圆	1	297	48						
4	样圆	1	300	52						
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			1178	193					333	88.4
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

栢树乡

邵亚西

造林验收样地调查表

三屯乡 花东村 6 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 22 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	286	54						
2	样圆	1	288	60						
3	样圆	1	295	44						
4	样圆	1	284	58						
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			1153	216					333	86.5
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

张鹏

印亚五

造林验收样地调查表

城关乡 罗沟村 8 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 16 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	297	44						
2	样圆	1	285	56						
3	样圆	1	298	48						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			880	148					333	88.1
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨建昂

邓少飞

造林验收样地调查表

南树乡 孔龙 村 12 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 21 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	285	51						
2	样圆	1	296	47						
3	样圆	1	287	56						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			868	154					333	86.8
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例										

造林验收样地调查表

柏树乡 布岭 村 13 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 4 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	285	52						
2	样圆	1	288	57						
3	样圆	1	296	45						
4	样圆	1	295	44						
5	样圆	1	302	37						
6	样圆	1	300	36						
7	样圆	1	284	52						
8	样圆	1	286	51						
9	样圆	1	298	44						
10	样圆	1	296	60						
11	样圆	1	295	47						
12	样圆	1	288	49						
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			3513	574					333	87.9
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨建伟

郭建强

造林验收样地调查表

柏树乡孔庄村 17 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 17 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	285	55						
2	样圆	1	296	47						
3	样圆	1	305	36						
4	样圆	1	304	38						
5	样圆	1	288	55						
6	样圆	1	286	58						
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			1764	289					333	88.2
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨军

刘亚

造林验收样地调查表

汝阳县 23 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 1 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	311	27						
2	样圆	1	305	42						
3	样圆	1	296	39						
4	样圆	1	312	31						
5	样圆	1	299	44						
6	样圆	1	303	41						
7	样圆	1	301	32						
8	样圆	1	295	28						
9	样圆	1	284	52						
10	样圆	1	297	39						
11	样圆	1	318	41						
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			332	426					333	90.6
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

李德昂

邵亚西

造林验收样地调查表

柏树乡 布岭 村 飞 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 4 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	317	32						
2	样圆	1	315	27						
3	样圆	1	308	41						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			940	107					333	94
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨 昂

郭 亚 东

造林验收样地调查表

城关乡 罗沟村 30 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 10 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	305	36						
2	样圆	1	298	47						
3	样圆	1	297	42						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			900	125					333	90
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨建昂

郭亚强

造林验收样地调查表

柏树乡 秦停村 44号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 21 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	305	36						
2	样圆	1	286	49						
3	样圆	1	297	45						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			888	130					333	88.6
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨建昂

刘正云

造林验收样地调查表

城关乡 罗沟 村 45 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 0 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	285	49						
2	样圆	1	286	53						
3	样圆	1	286	42						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			867	144					333	86.7
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨建邦

郭亚平

造林验收样地调查表

柏树乡 孔村 47 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 21 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	315	36						
2	样圆	1	308	47						
3	样圆	1	288	52						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			922	135					333	92.2
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨

邵亚君

造林验收样地调查表

城关乡 张河村 52号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 15 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	322	18						
2	样圆	1	296	44						
3	样圆	1	288	58						
4	样圆	1	313	20						
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			1219	140					333	91.5
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨兴

郭玉

造林验收样地调查表

陶营乡 康岭林场村 55 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 21 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	285	55						
2	样圆	1	297	43						
3	样圆	1	288	51						
4	样圆	1	286	52						
5	样圆	1	305	36						
6	样圆	1	315	29						
7	样圆	1	322	16						
8	样圆	1	288	52						
9	样圆	1	286	50						
10	样圆	1	284	49						
11	样圆	1	287	53						
12	样圆	1	296	52						
13	样圆	1	292	47						
14	样圆	1	285	51						
15	样圆	1	284	52						
合计			4400	686					333	88.
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨建东

张亚飞

造林验收样地调查表

淮 乡 双 丰 村 60 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 13 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	315	28						
2	样圆	1	298	41						
3	样圆	1	296	39						
4	样圆	1	302	33						
5	样圆	1	286	49						
6	样圆	1	298	52						
7	样圆	1	286	50						
8	样圆	1	288	55						
9	样圆	1	312	27						
10	样圆	1	302	38						
11	样圆	1	305	36						
12	样圆	1	298	44						
13	样圆	1	287	61						
14	样圆	1	285	51						
15	样圆	1	286	49						
合计									333	
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨 辉

刘 亚 强

造林验收样地调查表

1/16 乡 双丰 村 60 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 13 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1/6	样圆	1	312	27						
2/7	样圆	1	322	18						
3/8	样圆	1	304	33						
4/9	样圆	1	299	41						
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			568	772					333	89.7
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨彦昂

邵亚西

造林验收样地调查表

阳县虎岭林场村 90 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 15 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	286	55						
2	样圆	1	298	45						
3	样圆	1	288	51						
4	样圆	1	305	37						
5	样圆	1	296	44						
6	样圆	1	295	46						
7	样圆	1	287	52						
8	样圆	1	293	48						
9	样圆	1	285	51						
10	样圆	1	284	56						
11	样圆	1	305	39						
12	样圆	1	312	40						
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			3534	564					333	88.4
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨建邦

郭亚五

造林验收样地调查表

城关乡 张堂村 106 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 11 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	320	19						
2	样圆	1	308	28						
3	样圆	1	285	44						
4	样圆	1	314	25						
5	样圆	1	299	47						
6	样圆	1	289	52						
7	样圆	1	317	19						
8	样圆	1	295	43						
9	样圆	1	307	28						
10	样圆	1	318	30						
11	样圆	1	289	47						
12	样圆	1	291	41						
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			3633	423					333	90.9
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨建邦

郭亚西

造林验收样地调查表

刘店乡 洪岭村 134 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 10 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	285	55						
2	样圆	1	285	60						
3	样圆	1	287	52						
4	样圆	1	290	44						
5	样圆	1	287	57						
6	样圆	1	288	48						
7	样圆	1	292	44						
8	样圆	1	293	41						
9	样圆	1	287	57						
10	样圆	1	289	55						
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			2883	513					333	86.5
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨寒阳

郭亚西

造林验收样地调查表

柏树乡 黄路 村 159 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 21 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	287	43						
2	样圆	1	302	36						
3	样圆	1	321	21						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			920	100					333	92.0
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨海平

邵亚西

造林验收样地调查表

城关乡 杨庄村 197 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 // 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	296	43						
2	样圆	1	315	36						
3	样圆	1	320	21						
4	样圆	1	302	36						
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			1233	136					333	92.5
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨建东

郭亚西

造林验收样地调查表

小店乡双丰村 199 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 12 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	287	52						
2	样圆	1	302	36						
3	样圆	1	317	27						
4	样圆	1	295	44						
5	样圆	1	289	51						
6	样圆	1	302	38						
7	样圆	1	291	41						
8	样圆	1	302	38						
9	样圆	1	295	42						
10	样圆	1	287	53						
11	样圆	1	291	48						
12	样圆	1	297	44						
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			3555	514					333	88.9
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨瑞

郭亚强

造林验收样地调查表

城关乡 洪洞村 237 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 17 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	285	52						
2	样圆	1	294	44						
3	样圆	1	293	47						
4	样圆	1	301	38						
5	样圆	1	296	44						
6	样圆	1	284	51						
7	样圆	1	286	57						
8	样圆	1	295	44						
9	样圆	1	312	32						
10	样圆	1	303	41						
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			2949	450					333	88.5
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

李亚东

郭亚西

造林验收样地调查表

柏树乡 董路村 254 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 21 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	302	36						
2	样圆	1	297	42						
3	样圆	1	288	51						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			888	129					333	88.8
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

柏典卿

邵亚西

造林验收样地调查表

城关乡张河村 22 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 16 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	285	53						
2	样圆	1	299	44						
3	样圆	1	312	28						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			896	125					333	89.6
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨寒阳 郭亚西

造林验收样地调查表

柏树乡 康村 275 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 21 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	285	44						
2	样圆	1	287	52						
3	样圆	1	302	31						
4	样圆	1	311	28						
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			1185	155					333	89.7
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

郭亚西

郭亚西

造林验收样地调查表

十11盘乡 石17 村 278 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 10 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	288	51						
2	样圆	1	288	52						
3	样圆	1	288	44						
4	样圆	1	286	53						
5	样圆	1	315	22						
6	样圆	1	306	37						
7	样圆	1	307	36						
8	样圆	1	288	48						
9	样圆	1	288	43						
10	样圆	1	286	51						
11	样圆	1	288	56						
12	样圆	1	312	22						
13	样圆	1	307	36						
14	样圆	1	304	41						
15	样圆	1	288	53						
合计									333	
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨建邦

王亚飞

造林验收样地调查表

十八里乡 孙村 278 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023 年 10 月 9 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
16	样圆	1	285	44						
17	样圆	1	286	52						
18	样圆	1	288	41						
19	样圆	1	289	40						
20	样圆	1	322	22						
21	样圆	1	287	51						
22	样圆	1	285	43						
23	样圆	1	286	49						
24	样圆	1	285	45						
25	样圆	1	288	52						
26	样圆	1	288	55						
27	样圆	1	289	43						
28	样圆	1	312	26						
29	样圆	1	305	33						
30	样圆	1	315	27						
合计									333	
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨勇

邵亚兵

造林验收样地调查表

十11乡 3017 村 278 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
31	样圆	1	325	24						
32	样圆	1	289	57						
33	样圆	1	291	44						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			9837	1436					333	89.5
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨洪昂

邵业兵

造林验收样地调查表

三屯乡 东杨村 281 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 28 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	300	41						
2	样圆	1	289	52						
3	样圆	1	286	55						
4	样圆	1	295	47						
5	样圆	1	302	36						
6	样圆	1	285	54						
7	样圆	1	297	44						
8	样圆	1	288	57						
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			2342	386					333	87.9
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨德军

郭志远

造林验收样地调查表

城关乡 柳园村 28P 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023 年 10 月 11 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	299	41						
2	样圆	1	287	56						
3	样圆	1	298	46						
4	样圆	1	300	37						
5	样圆	1	312	34						
6	样圆	1	303	42						
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			1799	258					333	90
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨典昂

郭亚西

造林验收样地调查表

城关乡 张河村 306 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023年 10 月 16 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	287	49						
2	样圆	1	311	28						
3	样圆	1	285	43						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			283	120					333	89.3
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨惠平

郭亚西

造林验收样地调查表

柏树乡黄楼村 314 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023年 10 月 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	296	42						
2	样圆	2	285	51						
3	样圆	1	301	36						
4	样圆	1	299	42						
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			1181	171					333	88.6
苗木规格			全株							
整地规格			全株							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨寒阳

郭亚男

造林验收样地调查表

柏树乡 柏树村 315 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023年 10 月 9 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	288	51						
2	样圆	∴	295	41						
3	样圆	∴	301	35						
4	样圆	∴	315	27						
5	样圆	∴	288	46						
6	样圆	∴	285	50						
7	样圆	1	295	39						
8	样圆	∴	288	50						
9	样圆	∴	286	49						
10	样圆	∴	300	36						
11	样圆	∴	315	27						
12	样圆	1	312	22						
13	样圆	∴	305	29						
14	样圆	∴	285	52						
15	样圆	∴	284	51						
合计									333	
苗木规格										
整地规格										
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨典昂

解亚万

造林验收样地调查表

柏树乡柏沟村 315 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023 年 10 月 9 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
16	样圆	1	291	43						
17	样圆	1	285	51						
18	样圆	1	286	48						
19	样圆	1	315	22						
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆		5619	769						
合计									333	88.8
苗木规格			全控							
整地规格			全控							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

李亚东

李亚东

造林验收样地调查表

城关乡 罗沟村 38号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023年 10月10日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	303	35						
2	样圆	2	321	22						
3	样圆	1	291	47						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			915	104					333	91.5
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨建昂

郭亚西

造林验收样地调查表

城关乡 张河村 322号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023年 10月16日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	310	27						
2	样圆	2	212	44						
3	样圆	1	286	51						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			888	92					333	88.8
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨国

王五

造林验收样地调查表

城关乡 24村 333 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023年 10月14日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	288	47						
2	样圆	1	302	34						
3	样圆	1	314	29						
4	样圆	1	291	44						
5	样圆	1	286	51						
6	样圆	1	310	28						
7	样圆	1	289	49						
8	样圆	1	296	41						
9	样圆	1	302	36						
10	样圆	1	300	35						
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			2978	394					333	89.4
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨典昂

郭正西

造林验收样地调查表

汝. 乡 双丰村 346 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间: 2023年 10 月 3 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	296	37						
2	样圆	1	311	25						
3	样圆	1	302	32						
4	样圆	1	297	41						
5	样圆	1	302	36						
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			1508	171					333	90.5
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

李德昂

邵玉强

造林验收样地调查表

城关乡 梁沟村 366 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间: 2023 年 6 月 6 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	285	53						
2	样圆	1	287	52						
3	样圆	1	289	47						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			861	152					333	862
苗木规格			12cm							
整地规格			12cm							
混交比例			1							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨建昂

郭亚五

造林验收样地调查表

城关乡 罗沟村 368 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023 年 10 月 10 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	292	41						
2	样圆	2	301	35						
3	样圆	1	268	51						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			881	127					333	88.1
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨惠昂

刘亚五

造林验收样地调查表

城关乡 梁沟村 370 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023年 10 月 10 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	284	51						
2	样圆	1	295	42						
3	样圆	1	307	31						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			886	124					333	88.6
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨寒

李亚西

造林验收样地调查表

城美乡 罗沟村 371 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023 年 10 月 6 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	288	50						
2	样圆	1	285	51						
3	样圆	1	295	42						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			868	143					333	87
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨寒昂

郭玉玉

造林验收样地调查表

城关乡 罗沟村 372号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间: 2023 年 10 月 10 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	384	51						
2	样圆	2	307	31						
3	样圆	1	293	44						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			884	126					333	88.4
苗木规格			12株							
整地规格			全垦							
混交比例			1							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨寒昂

郭亚五

造林验收样地调查表

柏树乡 魏村 379号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023年 10月21日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	301	34						
2	样圆	1	306	32						
3	样圆	1	287	50						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			894	116					333	89.4
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨建伟

张亚西

造林验收样地调查表

城关镇 洪洞村 387号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间: 2023年 10月 17日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	297	40						
2	样圆	1	302	33						
3	样圆	1	288	47						
4	样圆	1	287	48						
5	样圆	1	293	42						
6	样圆	1	299	36						
7	样圆	1	301	36						
8	样圆	1	300	41						
9	样圆	1	288	50						
10	样圆	1	295	42						
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			2950	417					333	88.5
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例										

1

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨建昂

刘亚亚

造林验收样地调查表

十八里乡 十庄村 207 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023 年 10 月 22 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	298	41						
2	样圆	2	299	35						
3	样圆	2	305	29						
4	样圆	2	317	20						
5	样圆	2	319	25						
6	样圆	2	289	46						
7	样圆	1	299	35						
8	样圆	2	309	31						
9	样圆	2	284	49						
10	样圆	2	286	50						
11	样圆	2	288	48						
12	样圆	1	289	51						
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			3582	460					333	89.6
苗木规格			全检							
整地规格			全检							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨寒阳

郭亚五

造林验收样地调查表

城关乡 罗沟村 409号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 0 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	299	41						
2	样圆	1	296	37						
3	样圆	1	285	51						
4	样圆	1	284	49						
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			1164	178					333	87.3
苗木规格			全播							
整地规格			全播							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨景昂

郭亚五

造林验收样地调查表

城关乡 界沟村 424号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 10 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	0	0						
2	样圆	1	0	0						
3	样圆	1	0	0						
4	样圆	1	0	0						
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计									333	0
苗木规格			/							
整地规格			/							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨兴邦

郭玉西

造林验收样地调查表

小店乡 柴罗村 425号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 8 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	286	48						
2	样圆	1	287	49						
3	样圆	1	290	45						
4	样圆	1	288	50						
5	样圆	1	285	52						
6	样圆	1	284	51						
7	样圆	1	301	37						
8	样圆	1	303	35						
9	样圆	1	297	49						
10	样圆	1	287	47						
11	样圆	1	286	48						
12	样圆	1	293	42						
13	样圆	1	291	44						
14	样圆	1	299	37						
15	样圆	1	298	38						
合计									333	
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨兴昂

邵亚强

造林验收样地调查表

小庄乡 朱罗村 425号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023 年 10 月 8 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1/6	样圆	1	297	36						
2/7	样圆	1	299	38						
3/8	样圆	1	301	34						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			5272	780					333	87.9
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨寒阳

郭玉五

造林验收样地调查表

土产美乡罗沟. 村 426 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间: 2023 年 10 月 16 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	295	41						
2	样圆	1	301	36						
3	样圆	1	307	34						
4	样圆	1	283	54						
5	样圆	1	291	47						
6	样圆	1	296	50						
7	样圆	1	293	36						
8	样圆	1	310	32						
9	样圆	1	289	51						
10	样圆	1	285	57						
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			2960	436					333	88.8
苗木规格			1.5m							
整地规格			条播							
混交比例			1							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨建东

邵亚西

造林验收样地调查表

城关乡黄泥洞村 430 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 17 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	302	33						
2	样圆	1	285	51						
3	样圆	1	287	52						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			874	136					333	87.4
苗木规格			1/8							
整地规格			1/8							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨寒昂

邵亚西

造林验收样地调查表

城关乡洪洞村 431 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 17 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	286	47						
2	样圆	2	288	52						
3	样圆	2	291	46						
4	样圆	1	290	49						
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			1155	194					333	86.7
苗木规格			全检							
整地规格			全检							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨典昂

邵亚书

造林验收样地调查表

城关乡洪河村 432 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 17 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	287	51						
2	样圆	1	288	47						
3	样圆	1	291	44						
4	样圆	1	289	50						
5	样圆	1	301	32						
6	样圆	1	288	44						
7	样圆	1	287	52						
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			20322031						333	67.1
苗木规格			1/1							
整地规格			1/1							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨建伟

孙亚飞

造林验收样地调查表

城关乡洪涧村 434号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 17 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	289	49						
2	样圆	1	284	52						
3	样圆	1	288	50						
4	样圆	1	293	45						
5	样圆	1	297	44						
6	样圆	1	299	38						
7	样圆	1	296	42						
8	样圆	1	297	41						
9	样圆	1	301	36						
10	样圆	1	304	43						
11	样圆	1	299	40						
12	样圆	1	288	51						
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			3526	355	521				333	88.4
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨德昂

邵亚飞

造林验收样地调查表

十八里乡 木庄村 453 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023 年 10 月 9 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	296	41						
2	样圆	1	302	36						
3	样圆	1	289	54						
4	样圆	1	295	47						
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			1182	178					333	88.7
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨建东

郭亚男

造林验收样地调查表

小店乡双丰村 454号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023年10月13日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查(株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	301	42						
2	样圆	1	288	56						
3	样圆	1	286	50						
4	样圆	1	295	44						
5	样圆	1	287	49						
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			1457	241					333	87.5
苗木规格			全检							
整地规格			全检							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨建昂

郭亚马

造林验收样地调查表

城关乡云梦村 457号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 13 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	289	46						
2	样圆	2	288	47						
3	样圆	2	287	50						
4	样圆	2	296	44						
5	样圆	2	295	47						
6	样圆	1	302	41						
7	样圆	2	301	39						
8	样圆	2	312	48						
9	样圆	2	288	55						
10	样圆	2	289	52						
11	样圆	1	284	56						
12	样圆	2	287	46						
13	样圆	2	289	47						
14	样圆	2	296	50						
15	样圆	1	289	51						
合计									333	
苗木规格										
整地规格										
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

造林验收样地调查表

汝阳县 云梦村 457 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023 年 10 月 13 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
16	样圆	1	288	53						
17	样圆	1	286	51						
18	样圆	1	285	49						
19	样圆	1	284	57						
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			5535	929					333	87.4
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨兴昂

郭亚五

造林验收样地调查表

柏树乡 袁庄村 463 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 17 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	306	37						
2	样圆	1	303	30						
3	样圆	1	287	49						
4	样圆	1	291	44						
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			1187	160					333	89.1
苗木规格			全检							
整地规格			全检							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨宝昂

郭玉芳

造林验收样地调查表

柏树乡 黄路村 464号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 21 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	287	50						
2	样圆	1	288	51						
3	样圆	1	297	44						
4	样圆	1	292	41						
5	样圆	1	293	47						
6	样圆	1	285	49						
7	样圆	1	284	52						
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			2026	334					333	86.9
苗木规格			全检							
整地规格			全检							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨兴昂

邓亚亚

造林验收样地调查表

城美乡云山村

49号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023年10月2日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	286	50						
2	样圆	1	284	52						
3	样圆	1	292	44						
4	样圆	1	293	47						
5	样圆	1	285	55						
6	样圆	1	297	42						
7	样圆	1	284	49						
8	样圆	1	285	48						
9	样圆	1	286	50						
10	样圆	1	297	47						
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			2891	484					333	86.8
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

李亚

郭亚

造林验收样地调查表

城关乡溪涧村486号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023年10月17日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查(株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	297	36						
2	样圆	1	302	41						
3	样圆	1	287	52						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			886	131					333	88.6
苗木规格			全检							
整地规格			全检							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

李德昂

郭亚西

造林验收样地调查表

柏树乡袁庄村 490号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 21 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	296	41						
2	样圆	1	289	53						
3	样圆	1	285	55						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			870	149					333	87.1
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨典昂

刘玉磊

造林验收样地调查表

柏树乡黄路村 498号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 21 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	300	36						
2	样圆	2	285	52						
3	样圆	1	289	50						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			874	138					333	874
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨建昂

张亚勇

造林验收样地调查表

柏树乡 黄路村 499号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 21 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	295	41						
2	样圆	1	284	52						
3	样圆	1	297	38						
4	样圆	1	302	35						
5	样圆	1	287	48						
6	样圆	1	294	43						
7	样圆	1	299	42						
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			2058	299					333	88.2
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨典昂

郭亚西

造林验收样地调查表

城关乡 井沟村 502号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 10 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	295	43						
2	样圆	1	289	51						
3	样圆	1	288	53						
4	样圆	1	216	43						
5	样圆	1	305	38						
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			1473	228					333	88.5
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨德昂

郭亚男

造林验收样地调查表

柏树乡康扒村 513号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023年10月21日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查(株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	289	46						
2	样圆	2	296	42						
3	样圆	1	302	38						
4	样圆	1	315	31						
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			1202	157					333	90.2
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

李强

李强

造林验收样地调查表

柏树乡康士人村 514 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023 年 10 月 21 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	303	34						
2	样圆	1	310	28						
3	样圆	1	305	37						
4	样圆	1	300	36						
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			1218	135					333	91.4
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨建昂

郭亚强

造林验收样地调查表

城关镇乡 罗沟村 520号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 14 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查(株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	305	34						
2	样圆	2	312	24						
3	样圆	1	296	39						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			913	97					333	91.3
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨建东

郭亚西

造林验收样地调查表

柏树乡桑村 538 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 21 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	302	34						
2	样圆	2	318	23						
3	样圆	2	315	27						
4	样圆	1	302	31						
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			1237	135					333	92.8
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨建邦

邵亚西

造林验收样地调查表

陶 乡 栎园村 552号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023 年 10 月 15 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	302	34						
2	样圆	2	311	26						
3	样圆	2	302	35						
4	样圆	1	295	41						
5	样圆	2	284	56						
6	样圆	2	296	43						
7	样圆	2	301	37						
8	样圆	1	324	26						
9	样圆	2	315	27						
10	样圆	2	309	31						
11	样圆	2	296	37						
12	样圆	1	299	42						
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			3634	435					333	90.9
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨典

刘亚

造林验收样地调查表

柏树乡 黄路村 556号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023年 10月 21日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	296	43						
2	样圆	1	305	38						
3	样圆	1	301	37						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			2902	118					333	90.2
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨典昂

郭亚西

造林验收样地调查表

柏树乡 黄路村 564号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023年 6 月 7 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	299	38						
2	样圆	1	305	40						
3	样圆	1	309	41						
4	样圆	1	315	28						
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			1228	147					333	92.1
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨德昂

郭亚五

造林验收样地调查表

城关乡 井沟村 573号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023年 10月 11日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	294	42						
2	样圆	1	299	40						
3	样圆	1	298	38						
4	样圆	1	287	46						
5	样圆	1	305	37						
6	样圆	1	311	28						
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			1794	231					333	89.7
苗木规格			全检							
整地规格			全检							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨建昂

郭亚西

造林验收样地调查表

城关乡杨庄村 588号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023年10月2日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	300	37						
2	样圆	1	311	28						
3	样圆	1	315	30						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			926	95					333	92.6
苗木规格			全杆							
整地规格			全杆							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨典昂

郭亚五

造林验收样地调查表

城关乡杨庄村 590号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023年10月11日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查(株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	285	52						
2	样圆	2	286	54						
3	样圆	2	296	37						
4	样圆	2	299	35						
5	样圆	1	285	49						
6	样圆	2	286	51						
7	样圆	2	296	42						
8	样圆	1	299	41						
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			2334	361					333	87.6
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨建昂

郭亚西

造林验收样地调查表

城关乡 河西村 623号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023年 10月11日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查(株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	298	41						
2	样圆	1	295	43						
3	样圆	1	299	40						
4	样圆	1	311	27						
5	样圆	1	305	31						
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			1508	182					333	90.5
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

李典昂

郭王五

造林验收样地调查表

城关乡 张河村 628号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2022年 10 月 16 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	305	31						
2	样圆	1	308	32						
3	样圆	1	307	35						
4	样圆	1	276	37						
5	样圆	1	289	36						
6	样圆	1	295	41						
7	样圆	1	302	36						
8	样圆	1	309	37						
9	样圆	1	294	31						
10	样圆	1	299	43						
11	样圆	1	296	46						
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			3300	405					333	90
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例										

1

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨建勇

郭亚西

造林验收样地调查表

三屯乡西局村 677号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023年 10月9日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	299	38						
2	样圆	2	289	47						
3	样圆	1	311	25						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			699	110					333	89.4
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨德昂

郭亚五

造林验收样地调查表

城美乡 张河村 700 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023 年 10 月 11 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	295	41						
2	样圆	2	299	37						
3	样圆	1	311	24 26						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			905	104					333	90
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨寒昂

郭五五

造林验收样地调查表

城关乡 冯西村 714 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023 年 10 月 11 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	299	38						
2	样圆	1	289	47						
3	样圆	1	305	32						
4	样圆	1	289	46						
5	样圆	1	294	38						
6	样圆	1	299	40						
7	样圆	1	307	32						
8	样圆	1	305	33						
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			2387 2093	306					333	89.6
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨建昂

郭亚勇

造林验收样地调查表

土堤关乡张河村 740 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023 年 10 月 10 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	288	51						
2	样圆	1	288	49						
3	样圆	1	296	40						
4	样圆	1	289	49						
5	样圆	1	285	50						
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			1448	239					333	86.9
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨建昂

郭亚西

造林验收样地调查表

城美乡 张河村 765 号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间: 2023 年 10 月 10 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	304	32						
2	样圆	∶	305	37						
3	样圆	∶	307	29						
4	样圆	∶	295	41						
5	样圆	∶	294	42						
6	样圆	1	299	40						
7	样圆	∶	307	29						
8	样圆	∶	305	29						
9	样圆	∶	312	25						
10	样圆	1	305	30						
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			3033	334					333	91
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨奥昂

祁亚五

造林验收样地调查表

土城关乡 张河村 781号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023年10月16日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查(株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	311	27						
2	样圆	1	315	19						
3	样圆	1	286	50						
4	样圆	1	295	47						
5	样圆	1	299	41						
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			1506	184					333	90
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨兴昂

郭亚西

造林验收样地调查表

刘店乡滕岭村 793号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023年10月12日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查(株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	296	40						
2	样圆	1	294	42						
3	样圆	1	297	41						
4	样圆	1	305	35						
5	样圆	1	286	49						
6	样圆	1	298	40						
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			1776	247					333	88.8
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨兴昂

郭亚西

造林验收样地调查表

汝阳县 汝阳县 汝阳县 837号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023年10月11日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查(株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	295	42						
2	样圆	1	299	41						
3	样圆	1	296	42						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			890	125					333	89
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨惠

郭亚西

造林验收样地调查表

柏树乡孔龙村 890号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间: 2023年10月21日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查(株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	296	41						
2	样圆	2	292	46						
3	样圆	2	305	32						
4	样圆	1	302	36						
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			1195	155					333	89.7
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位: 河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员:

杨典昂

郭亚西

造林验收样地调查表

土坡关乡 张月村 9/6号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023年10月21日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查(株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	311	27						
2	样圆	∴	309	28						
3	样圆	∴	302	30						
4	样圆	∴	315	27						
5	样圆	∴	297	28						
6	样圆	1	299	40						
7	样圆	∴	305	31						
8	样圆	∴	312	26						
9	样圆	∴	292	44						
10	样圆	∴	285	51						
11	样圆	1	294	43						
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			3321	385					333	90
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨建邦

印五五

造林验收样地调查表

城关乡 张河村 952号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间： 2023年 6月6日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	315	27						
2	样圆	1	318	21						
3	样圆	1	294	41						
4	样圆	1	298	40						
5	样圆	1	285	49						
6	样圆	1	311	28						
7	样圆	1	302	36						
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			2123	242					333	91
苗木规格			合格							
整地规格			合格							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨建昂

邵亚五

造林验收样地调查表

城关乡 张村 958号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023年 10月10日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查(株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	302	31						
2	样圆	1	305	31						
3	样圆	1	304	31						
4	样圆	1	305	29						
5	样圆	1	294	45						
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			1510	167					333	90
苗木规格										
整地规格										
混交比例										

1

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨典昂

邵亚石

造林验收样地调查表

柏树乡黄路村 2412号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023年10月16日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查(株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	315	18						
2	样圆	1	303	21						
3	样圆	1	312	22						
4	样圆									
5	样圆									
6	样圆									
7	样圆									
8	样圆									
9	样圆									
10	样圆									
11	样圆									
12	样圆									
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			930	61					333	93
苗木规格			全检							
整地规格			全检							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨建伟

邵亚五

造林验收样地调查表

柏树乡 黄路村 2424号小班

汝阳县橡子直播造林工程

调查时间：2023 年 10 月 21 日

样地号	样地类型	样地面积 (亩)	分树种调查 (株)						综合	
			橡子		橡子		橡子		造林密度 (株/亩)	成活率 (%)
			合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)	合格苗木 成活株数	死亡株数 (含不合格 苗木)		
1	样圆	1	296	41						
2	样圆	∴	311	26						
3	样圆	∴	289	51						
4	样圆	∴	294	40						
5	样圆	∴	308	30						
6	样圆	∴	314	21						
7	样圆	1	294	39						
8	样圆	∴	286	50						
9	样圆	∴	294	42						
10	样圆	∴	289	45						
11	样圆	∴	315	21						
12	样圆	1	317	20						
13	样圆									
14	样圆									
15	样圆									
合计			3607	426					333	90.2
苗木规格			38%							
整地规格			15%							
混交比例			1							

调查单位：河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司

调查人员：

杨建东

邵亚五


汝阳县橡子直播项目验收图 (1/10)



坐标系: CGCS2000_GK_Zone_19

河南省鑫森源林业勘察规划设计有限公司


汝阳县橡子直播项目验收图 (2/10)

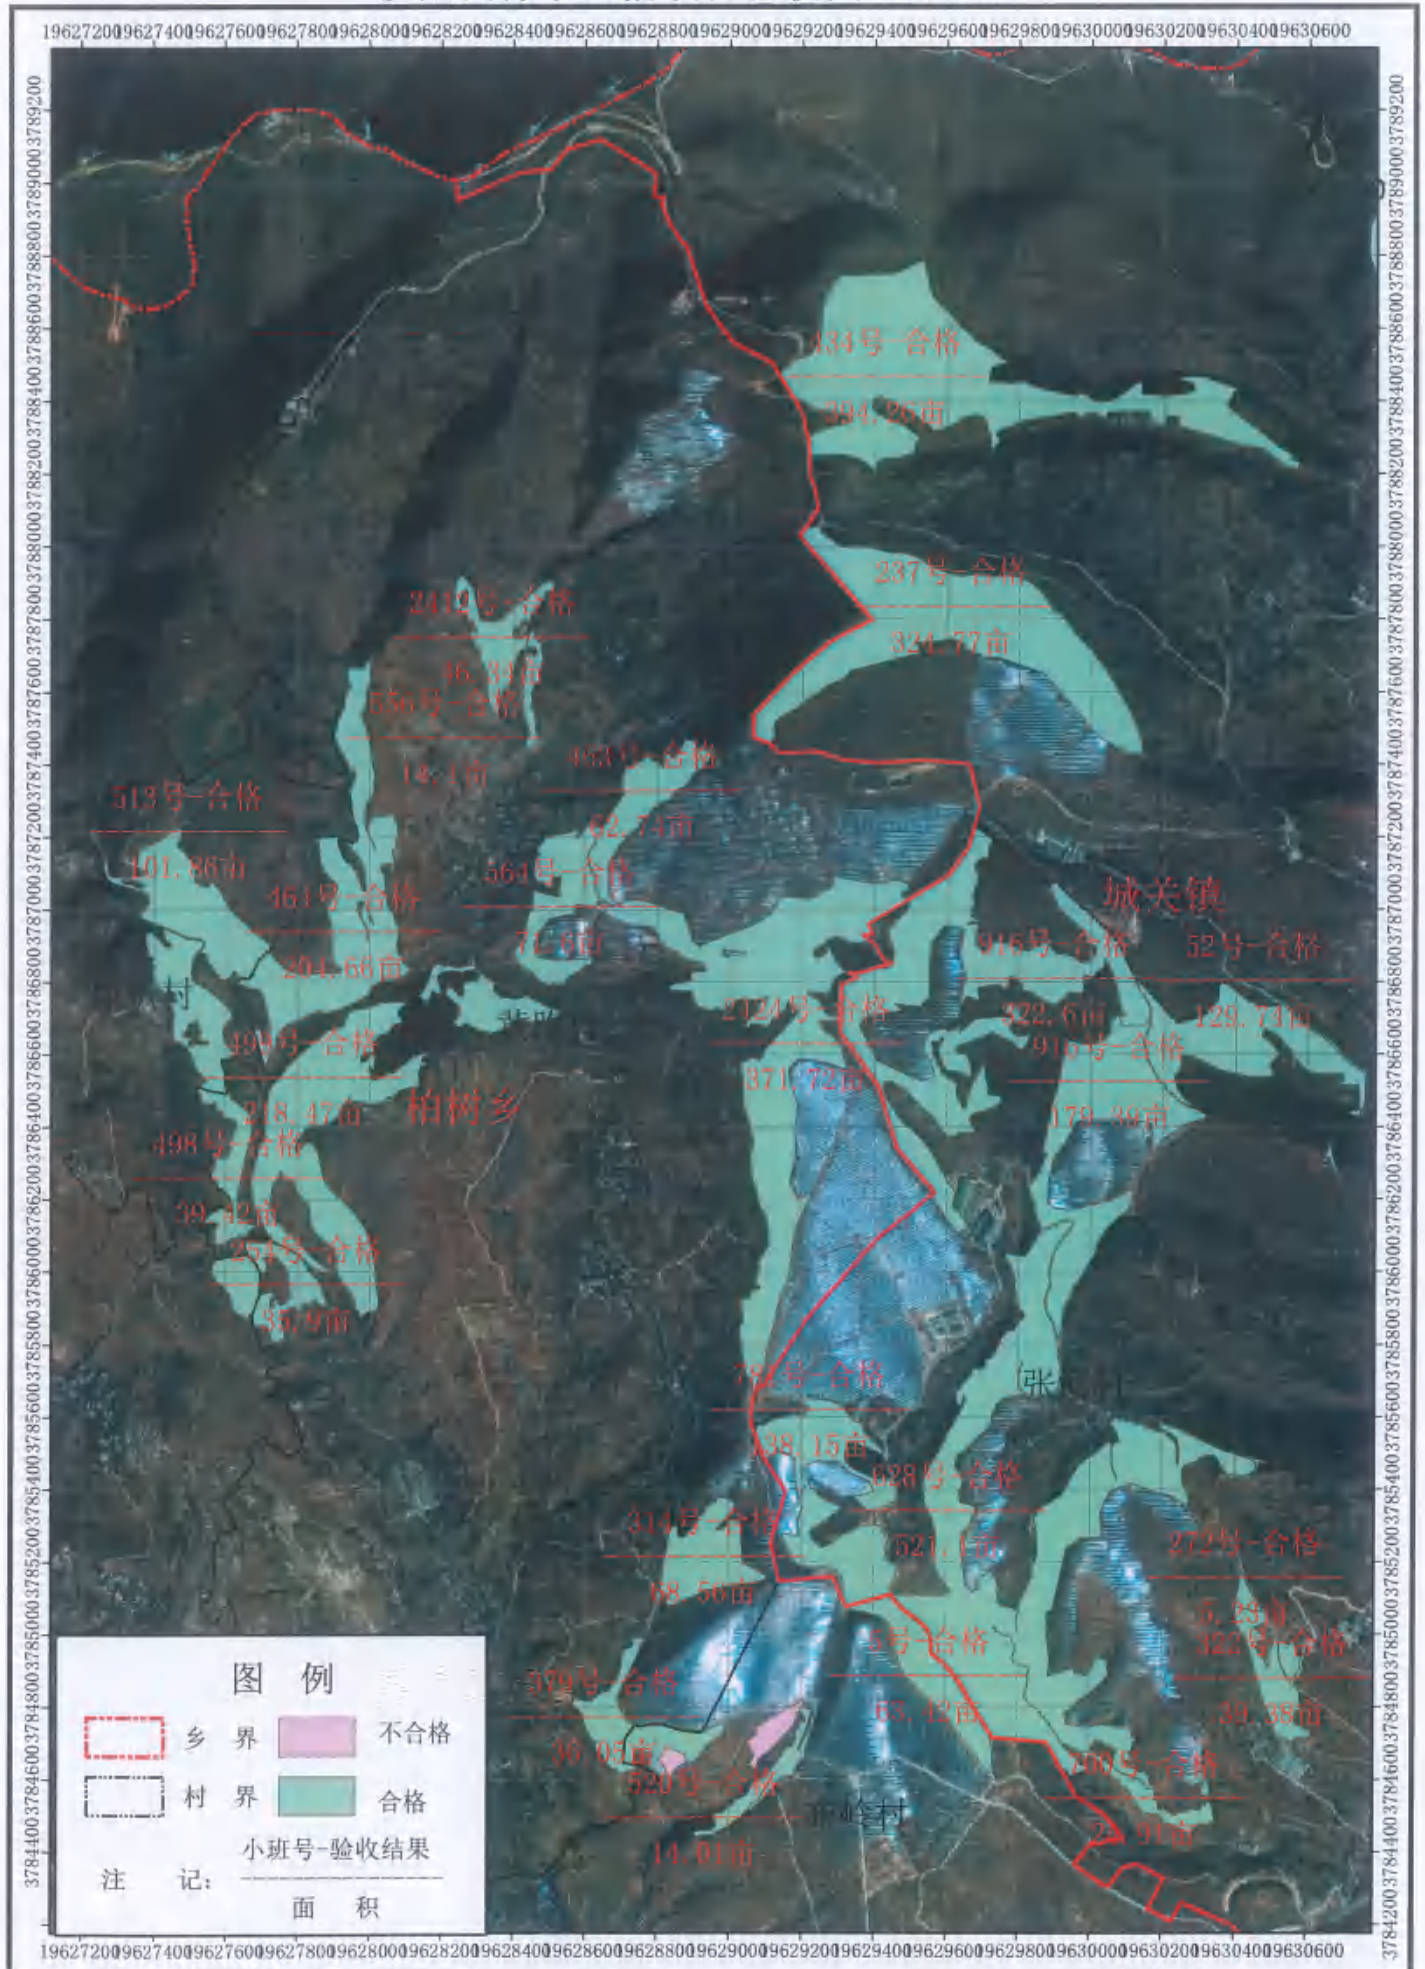


坐标系: CGCS2000_GK_Zone_19

河南省鑫森源林业勘查规划设计有限公司

汝阳县橡子直播项目验收图 (3/10)

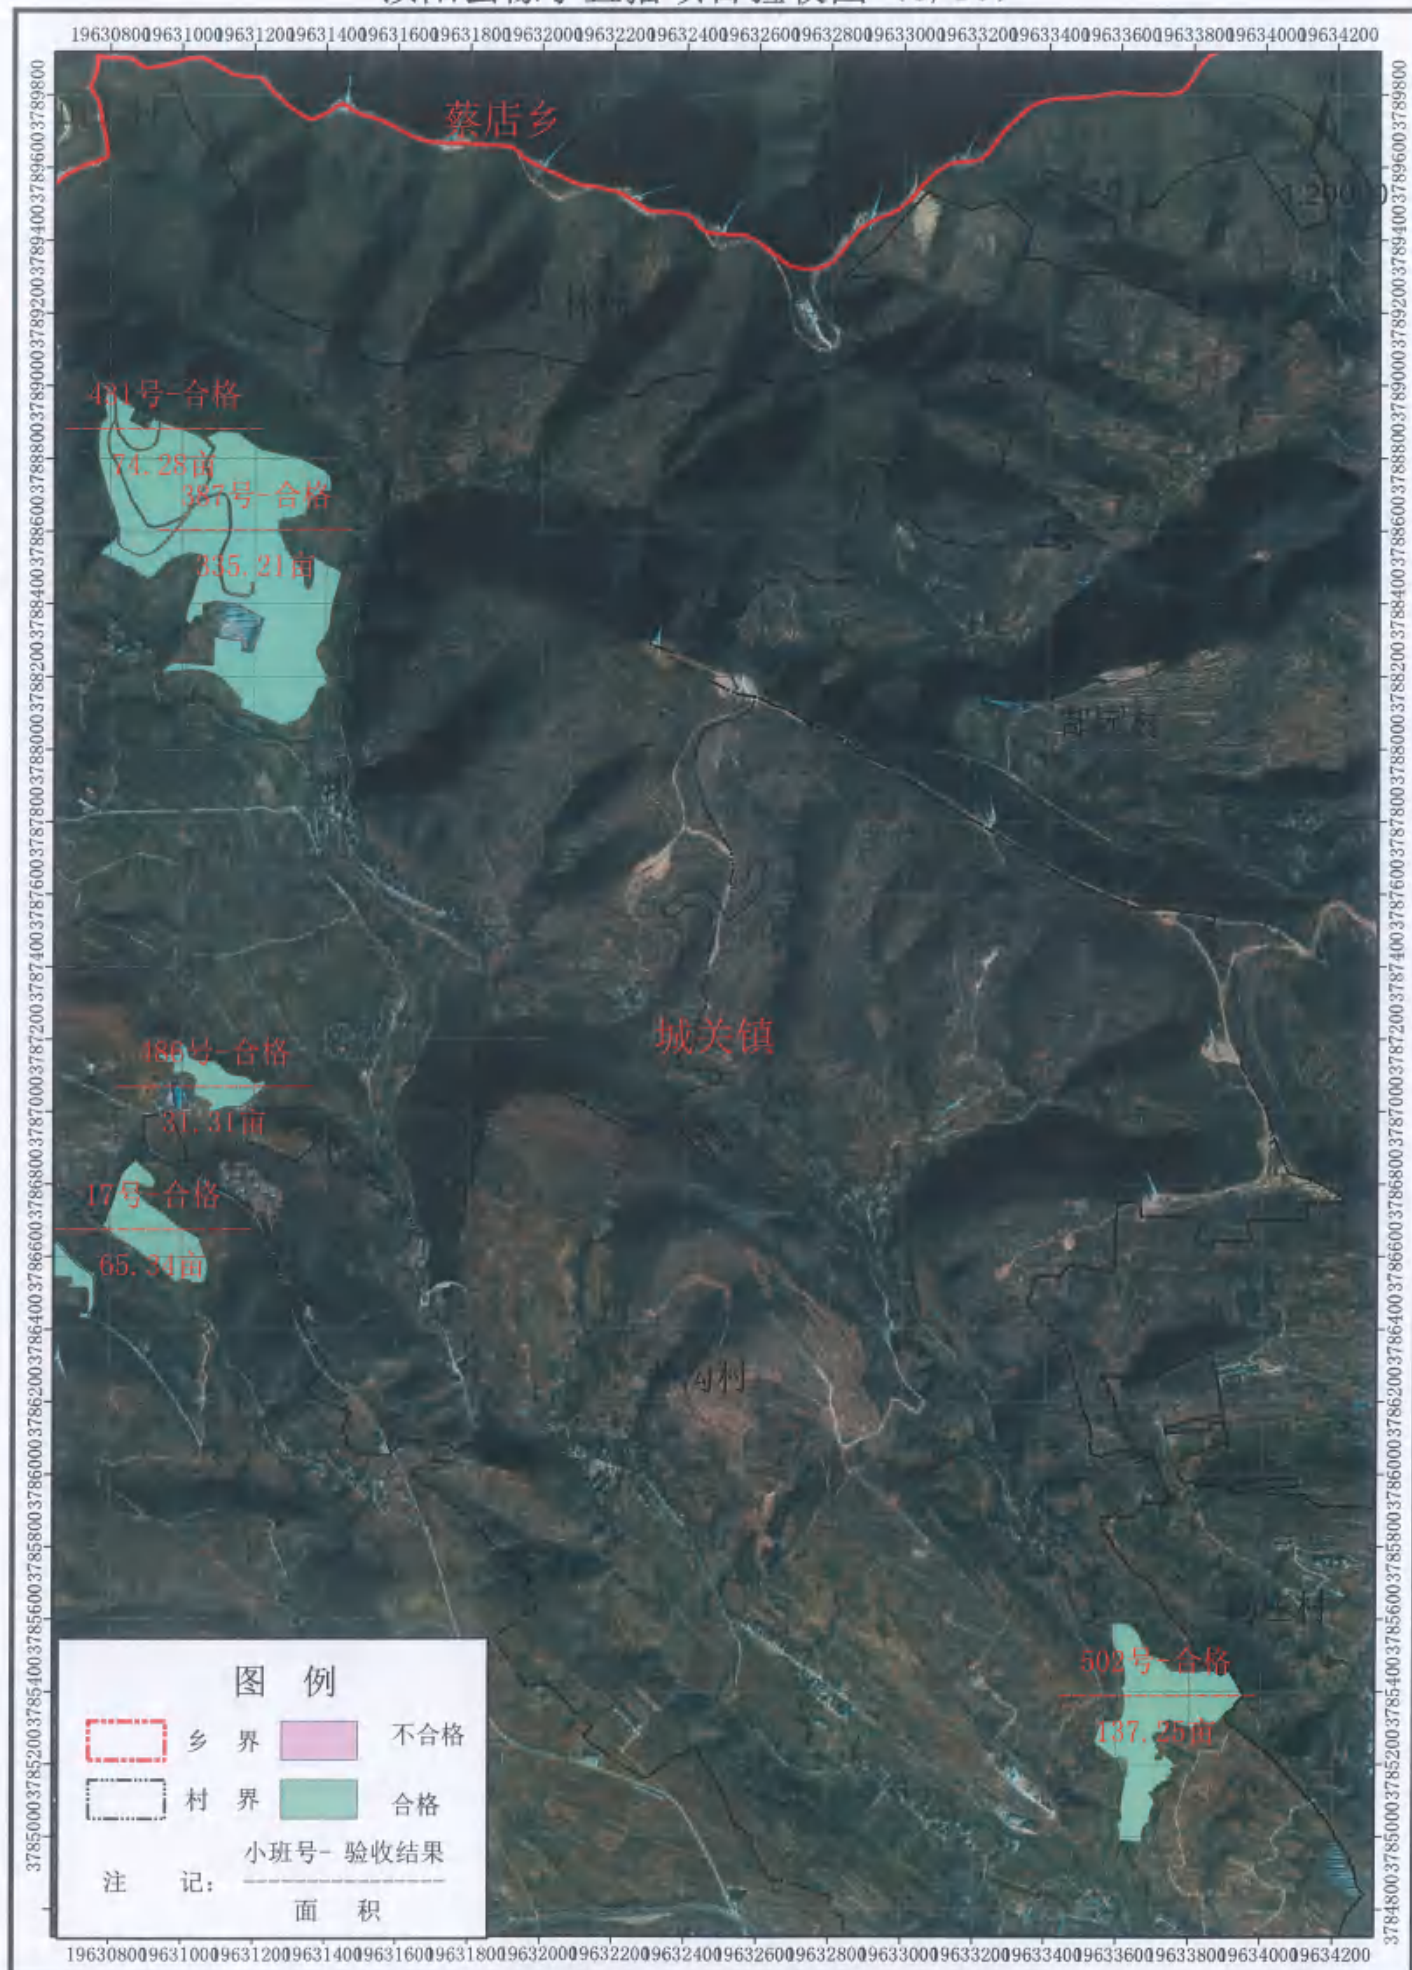


汝阳县橡子直播项目验收图 (4/10)

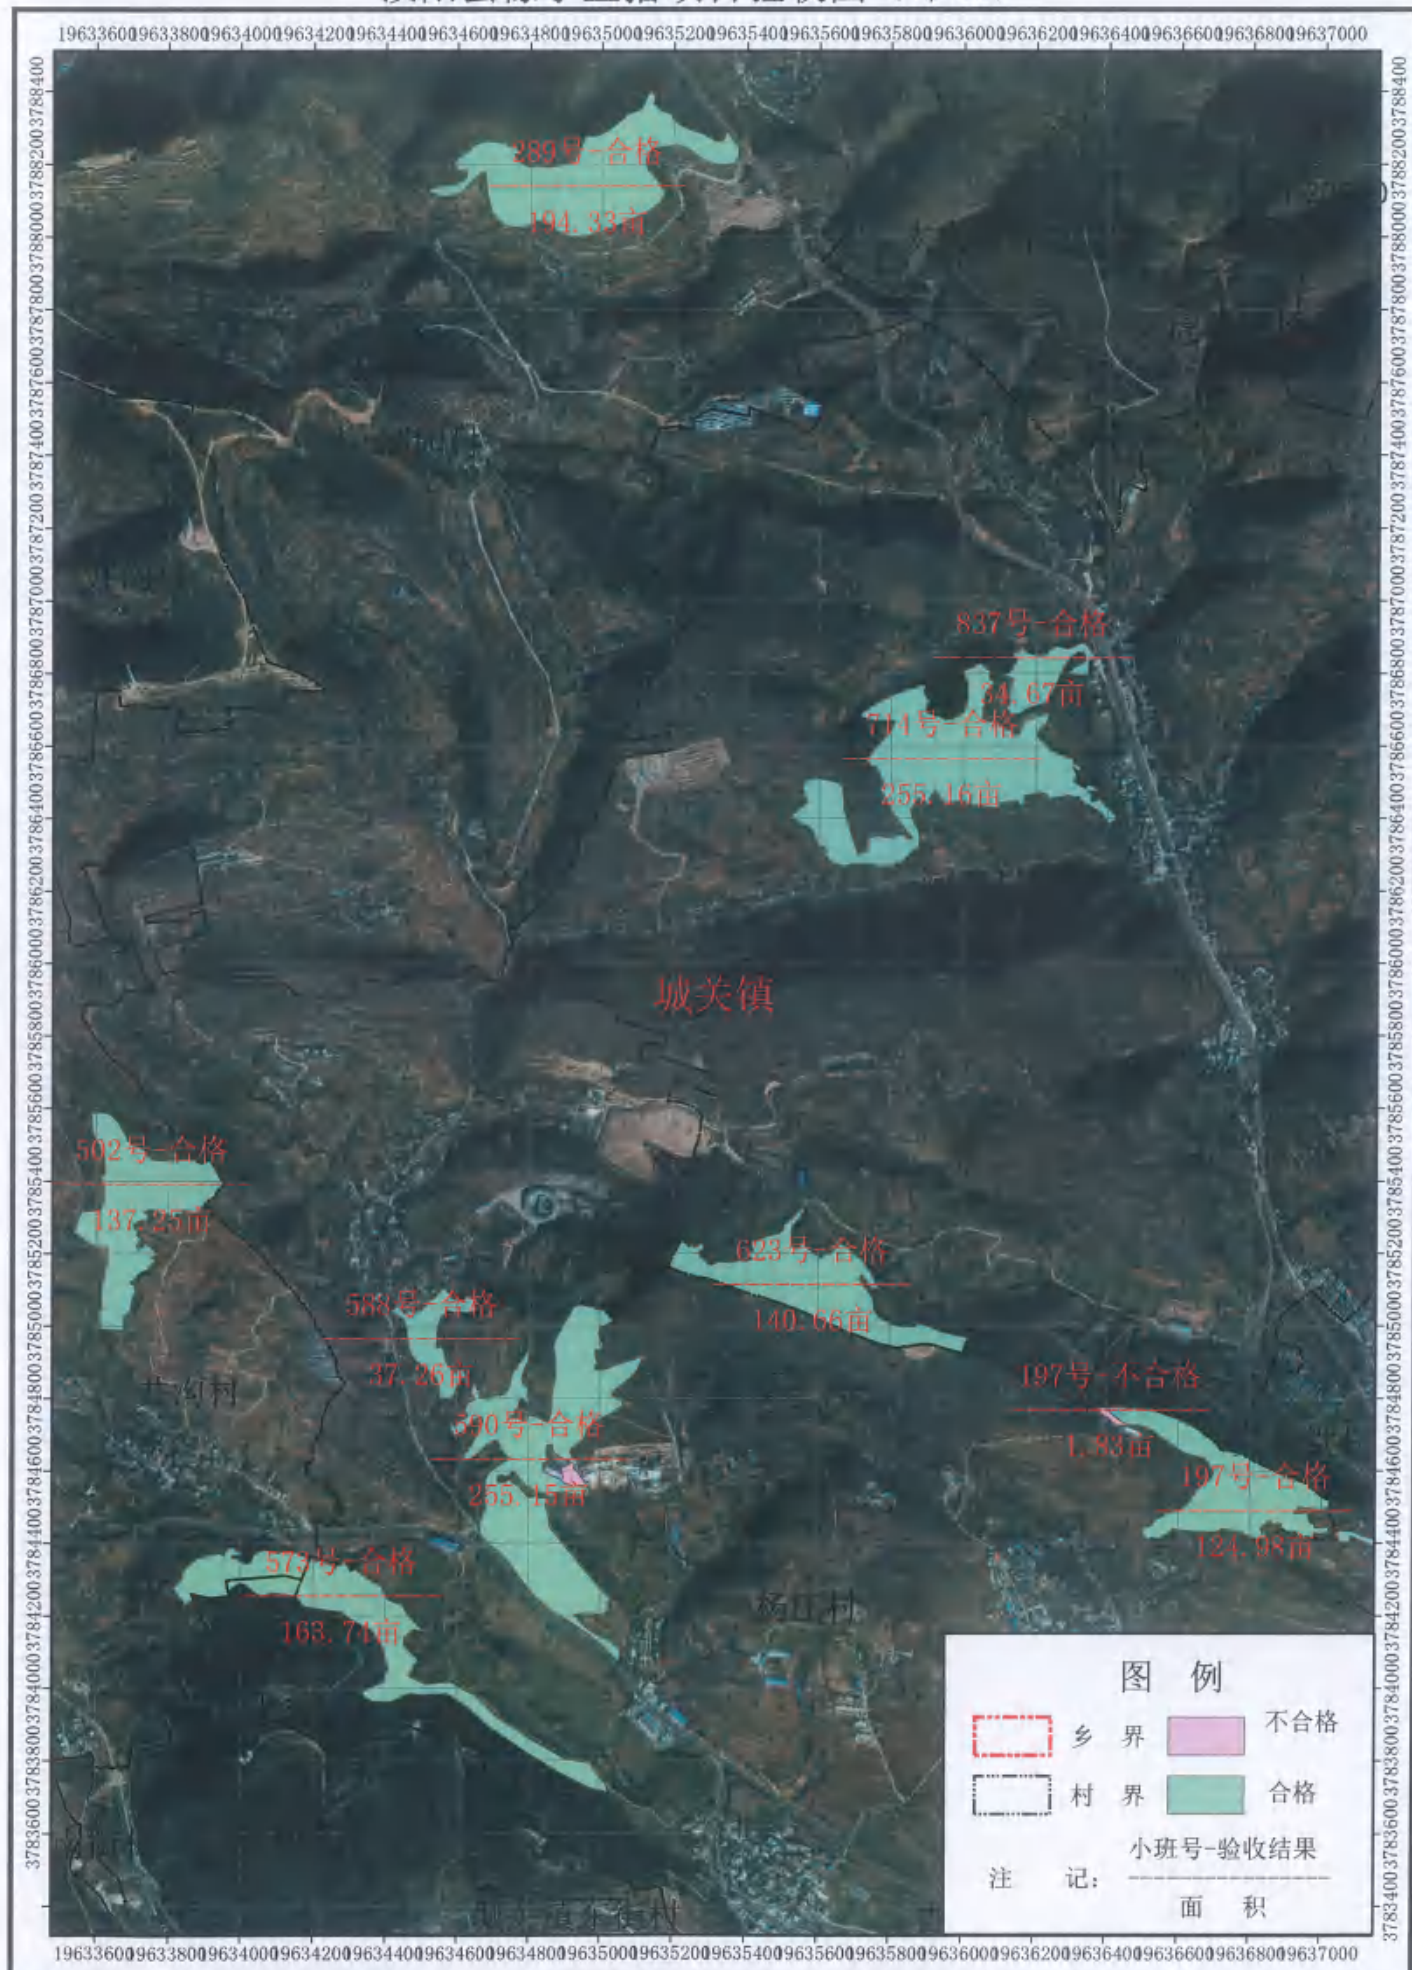


坐标系: CGCS2000_GK_Zone_19

河南省鑫森源林业勘查规划设计有限公司

汝阳县橡子直播项目验收图 (5/10)

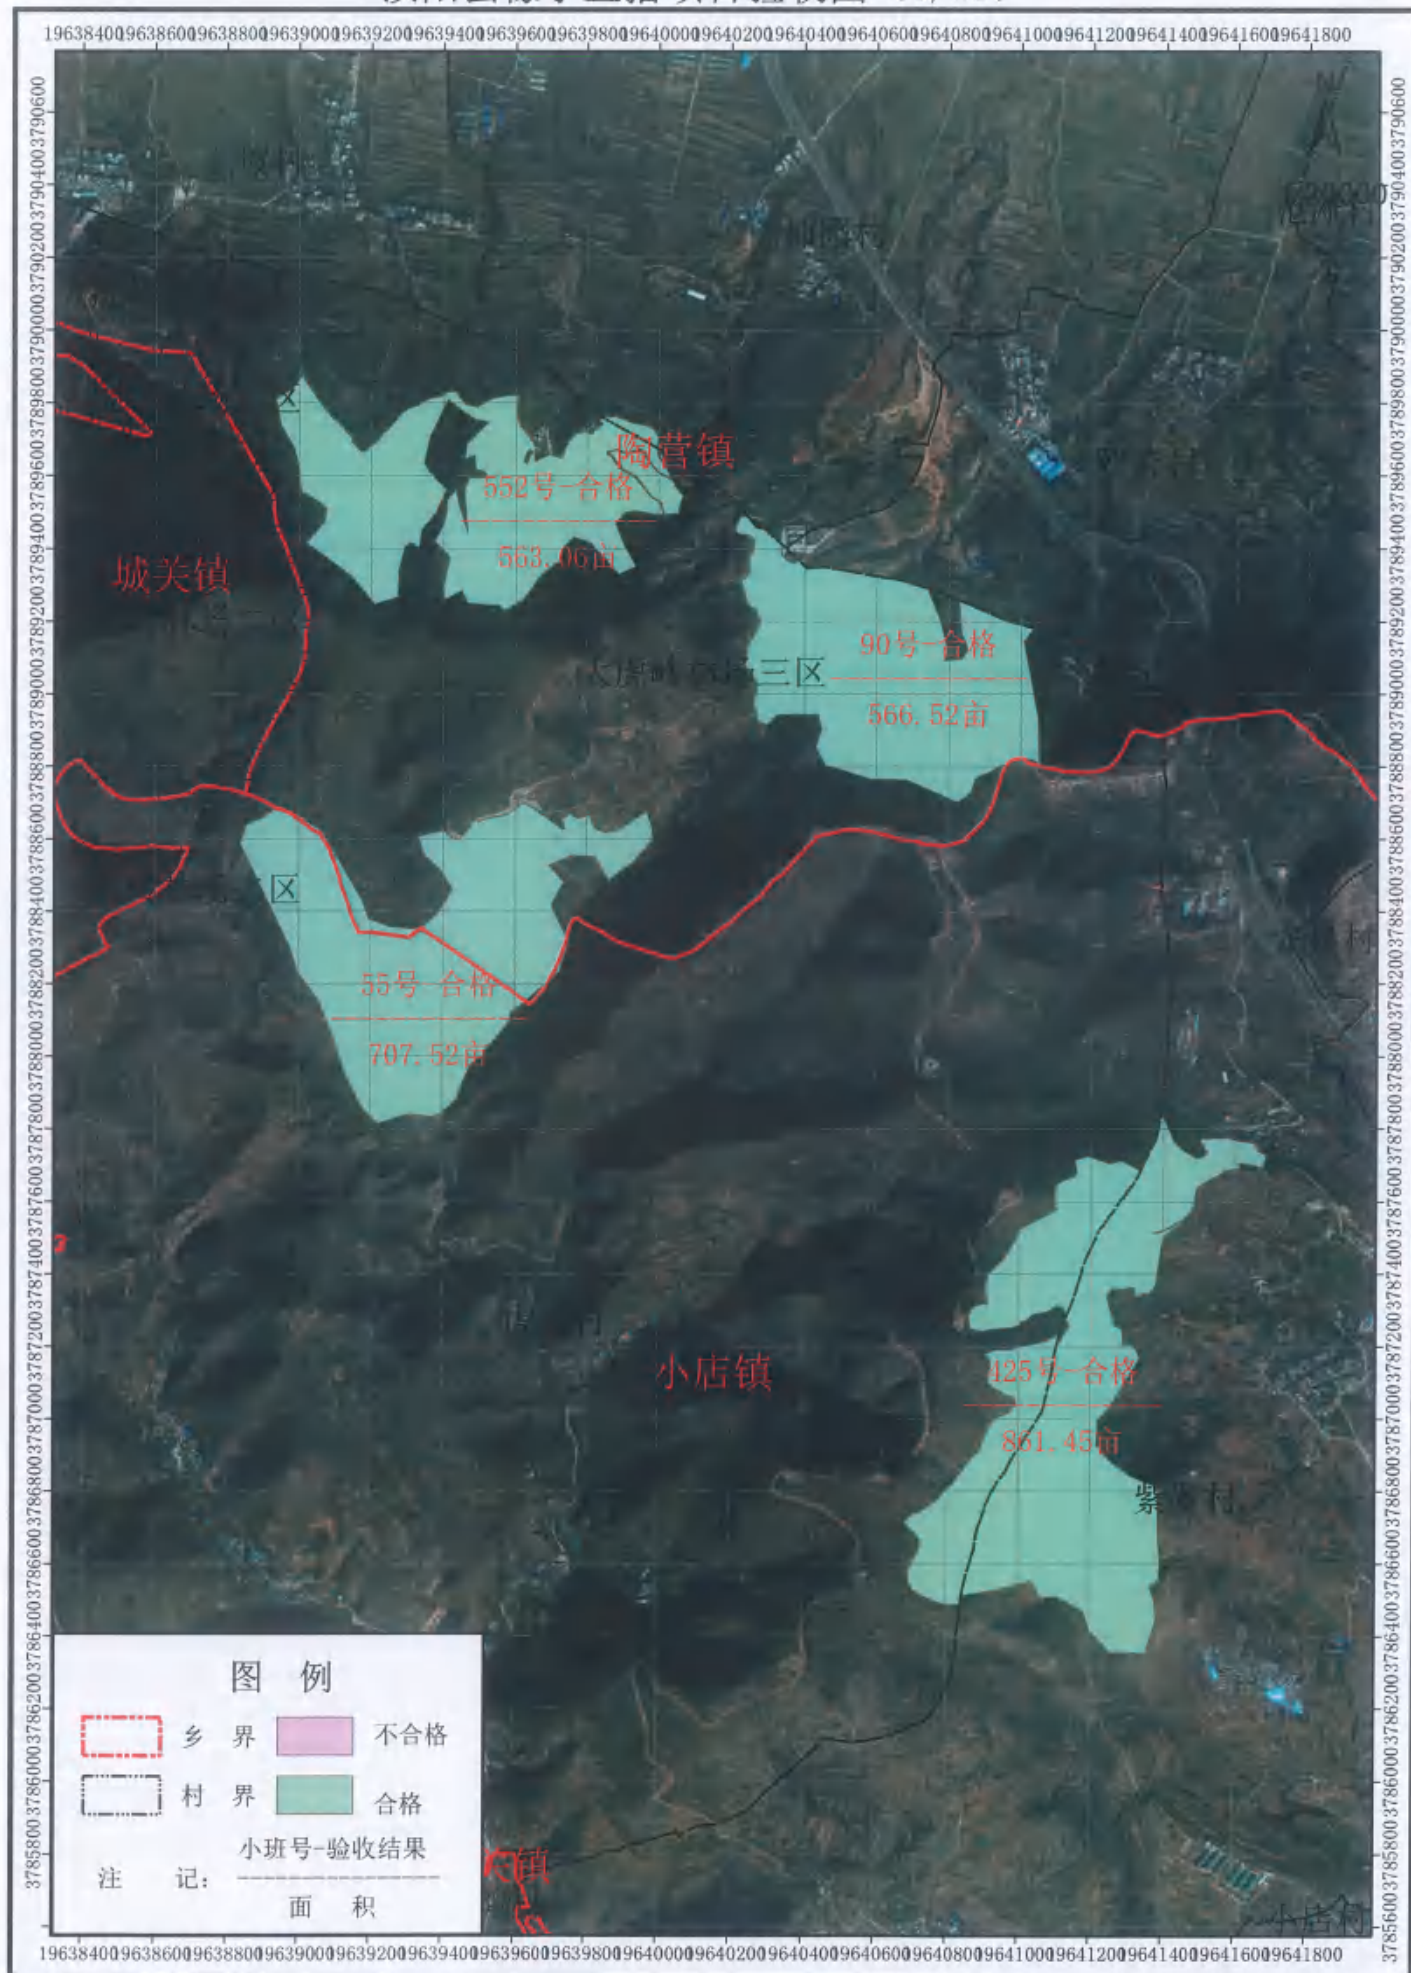

汝阳县橡子直播项目验收图 (6/10)

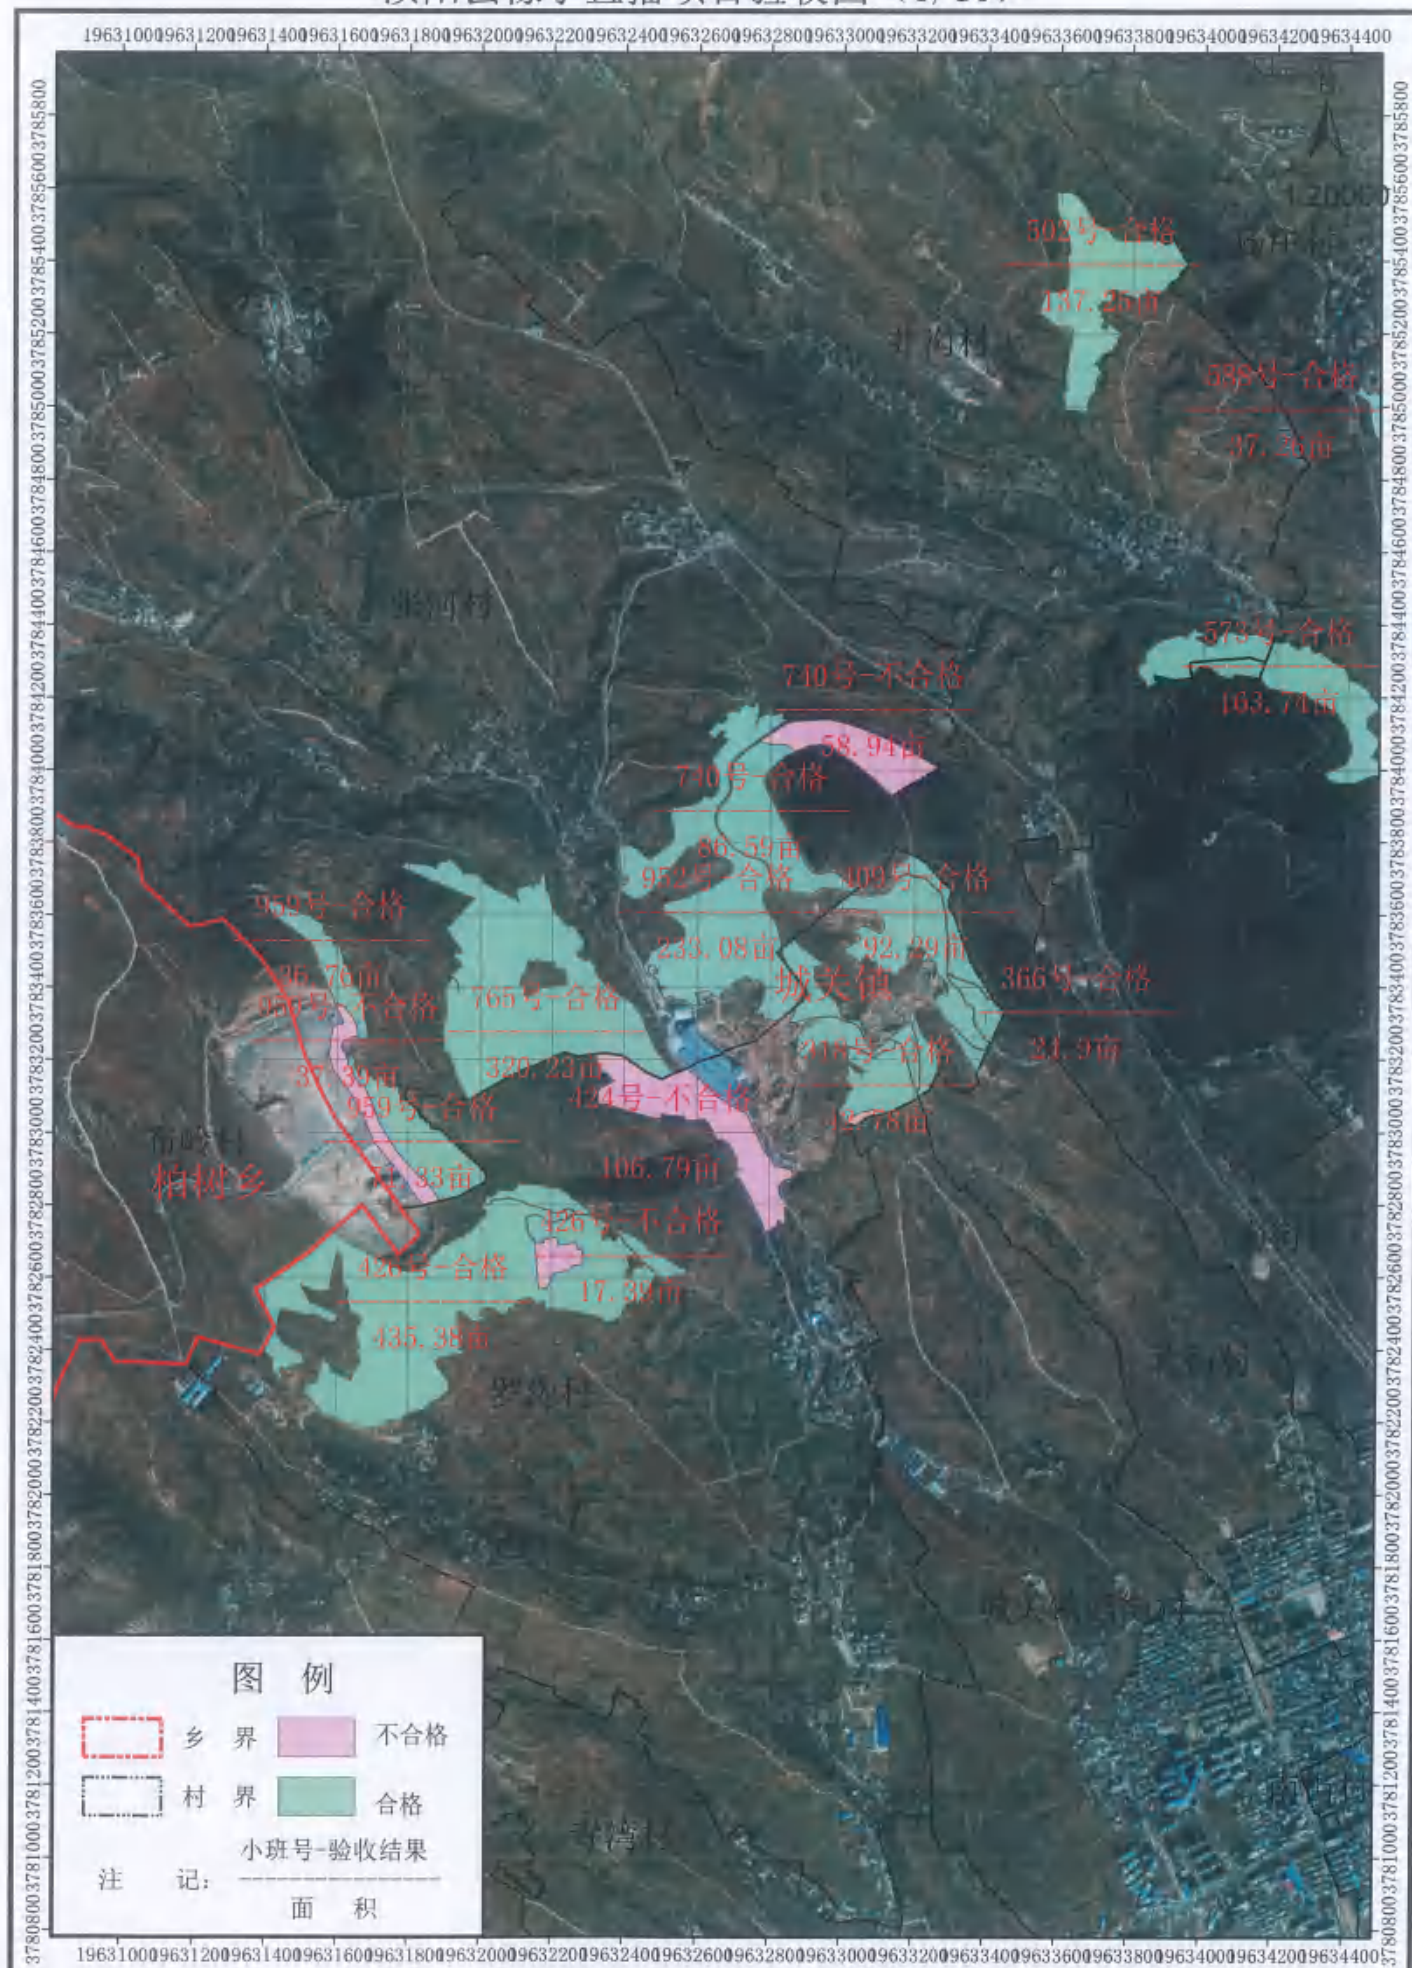


坐标系: CGCS2000 GK Zone 19

河南省鑫森源林业勘查规划设计有限公司

汝阳县橡子直播项目验收图 (7/10)




汝阳县橡子直播项目验收图 (8/10)

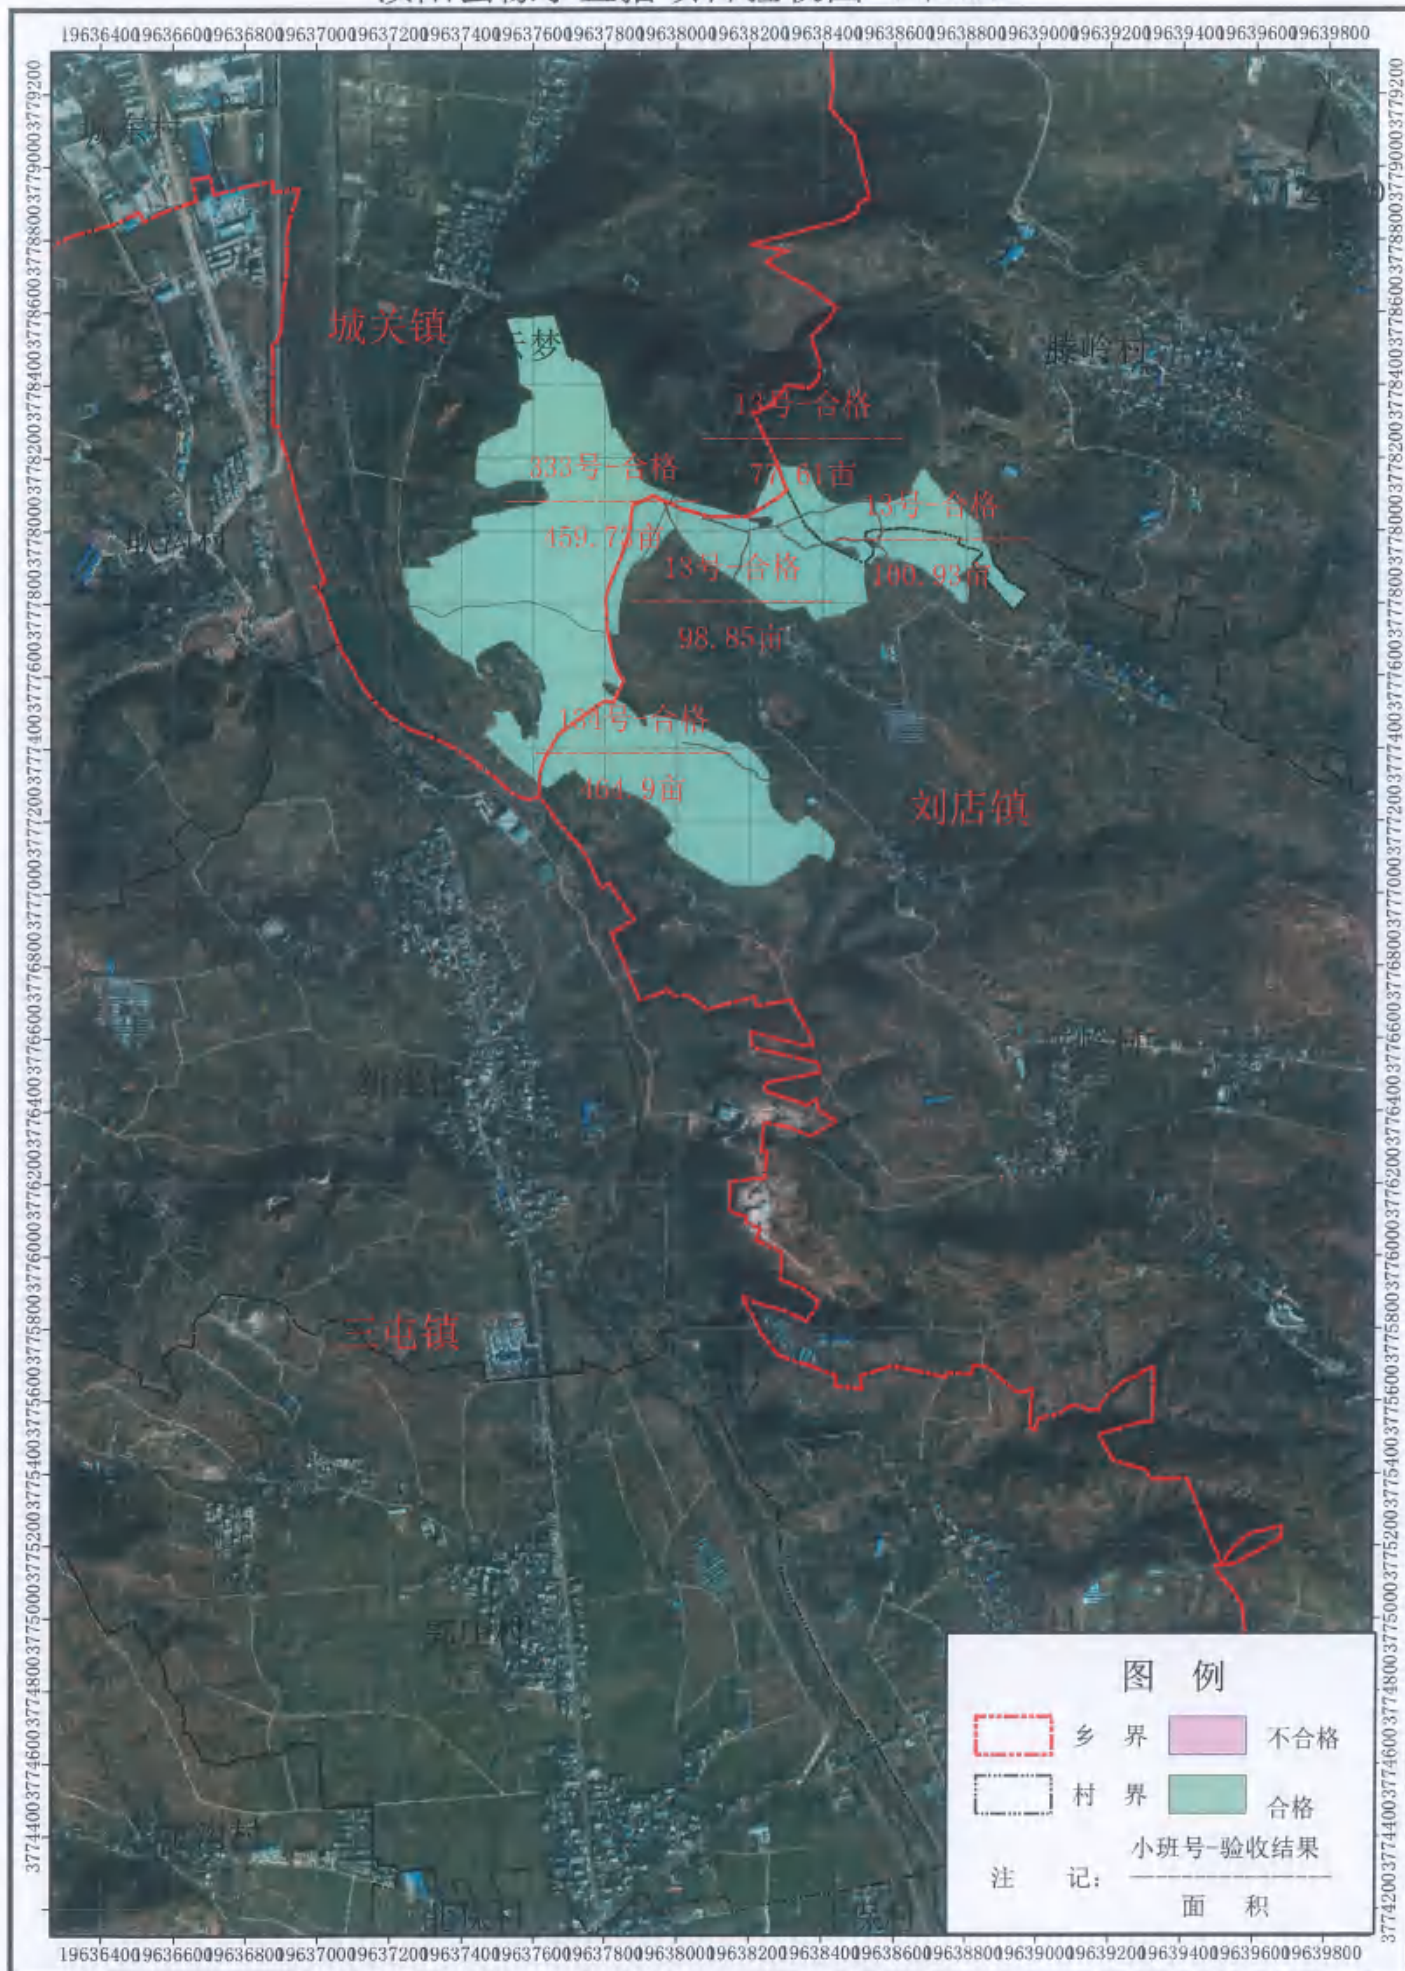


坐标系: CGCS2000 GK Zone 19

河南省鑫森源林业勘查规划设计有限公司


汝阳县橡子直播项目验收图 (9/10)

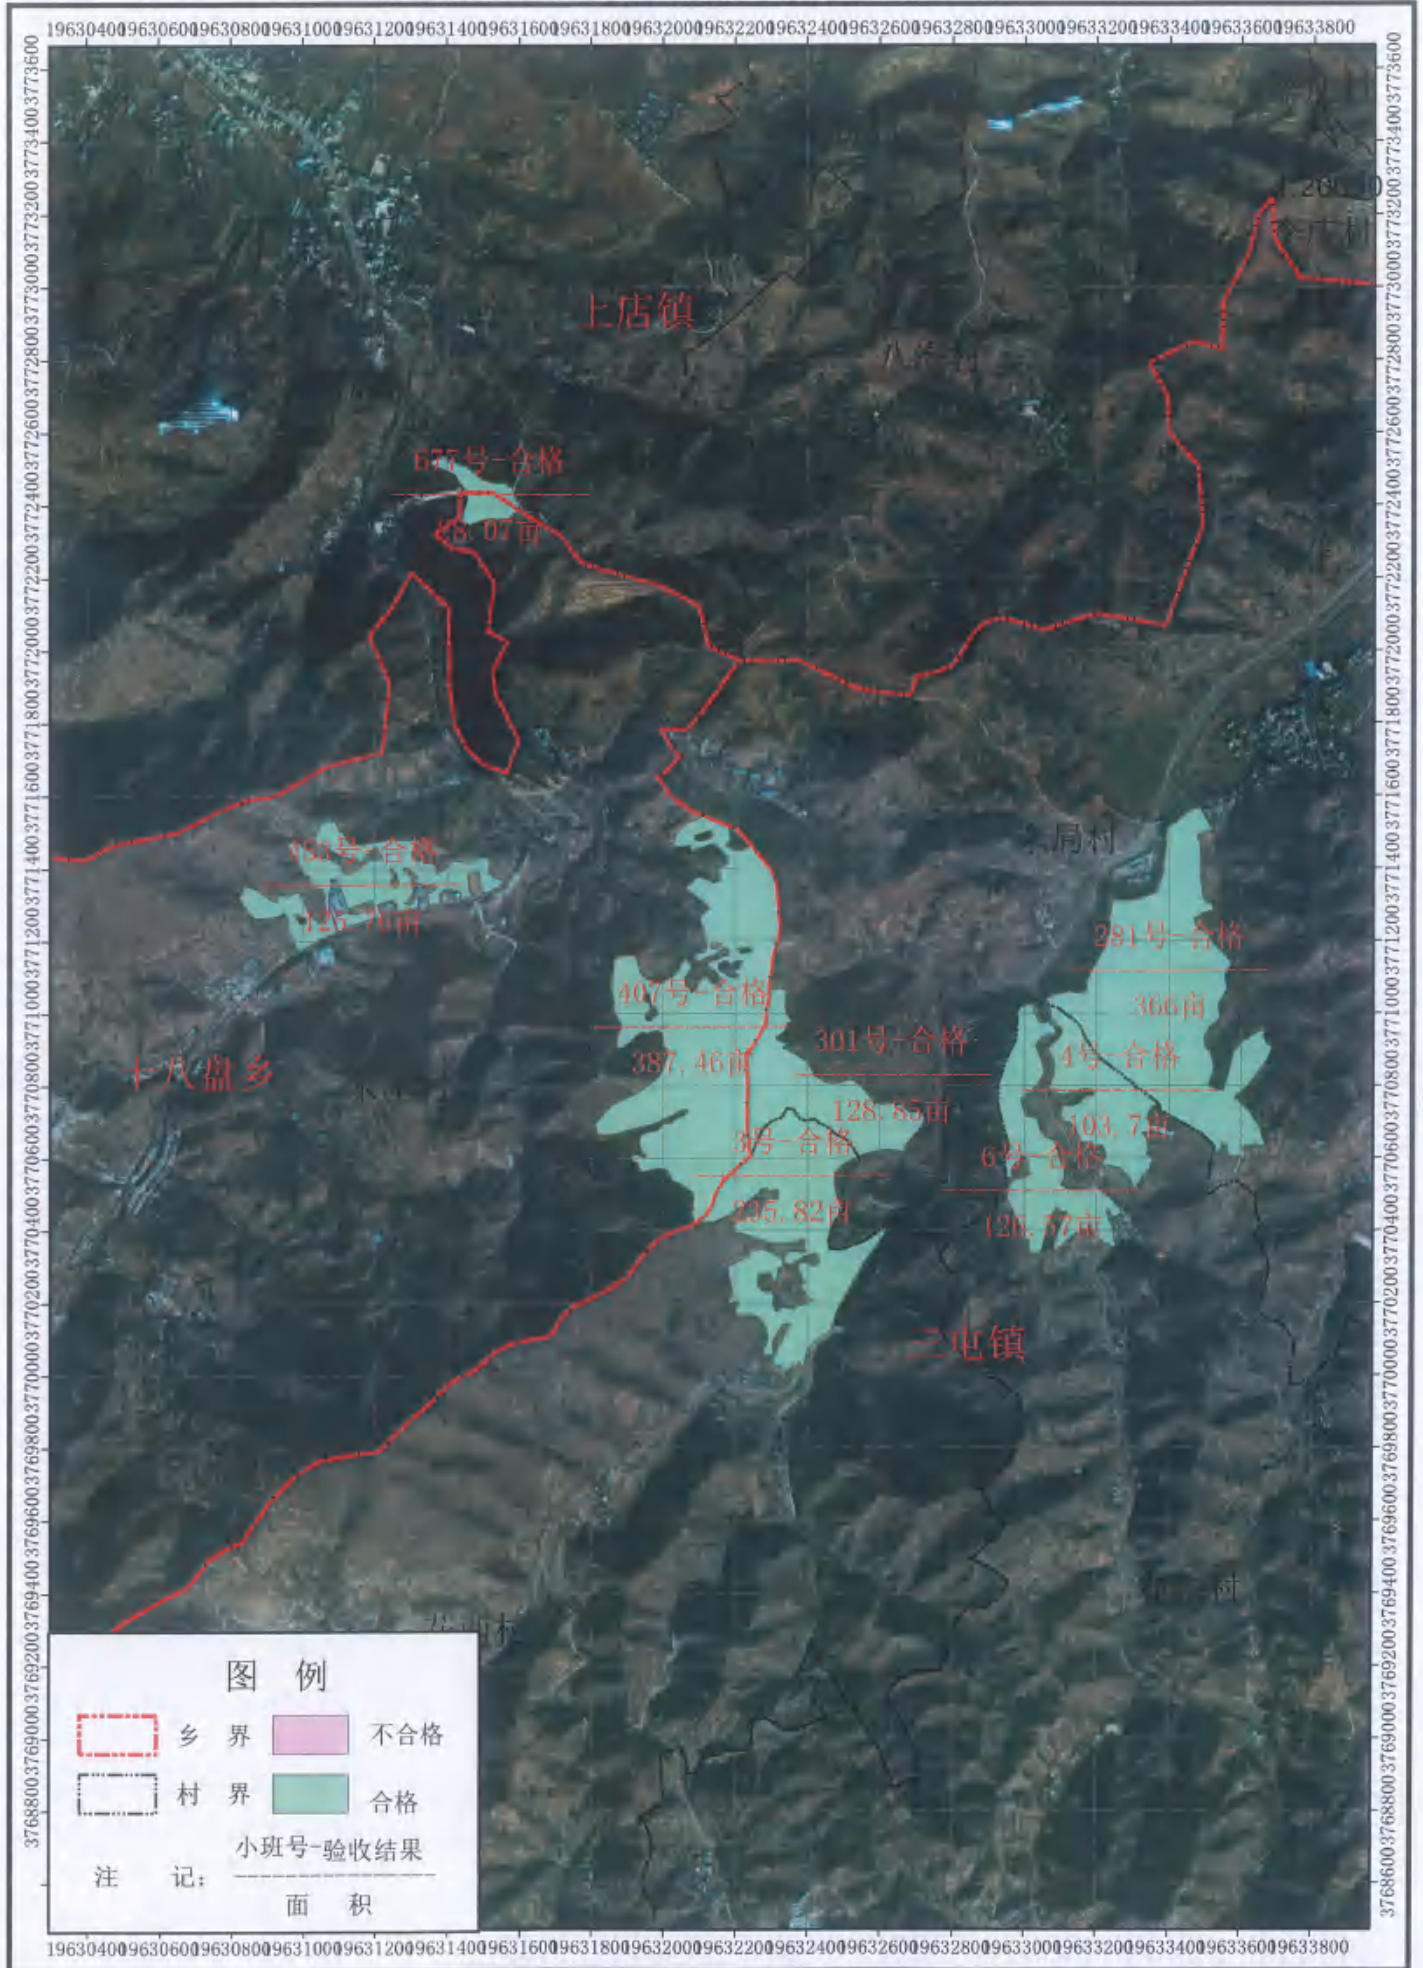

汝阳县橡子直播项目验收图 (10/10)

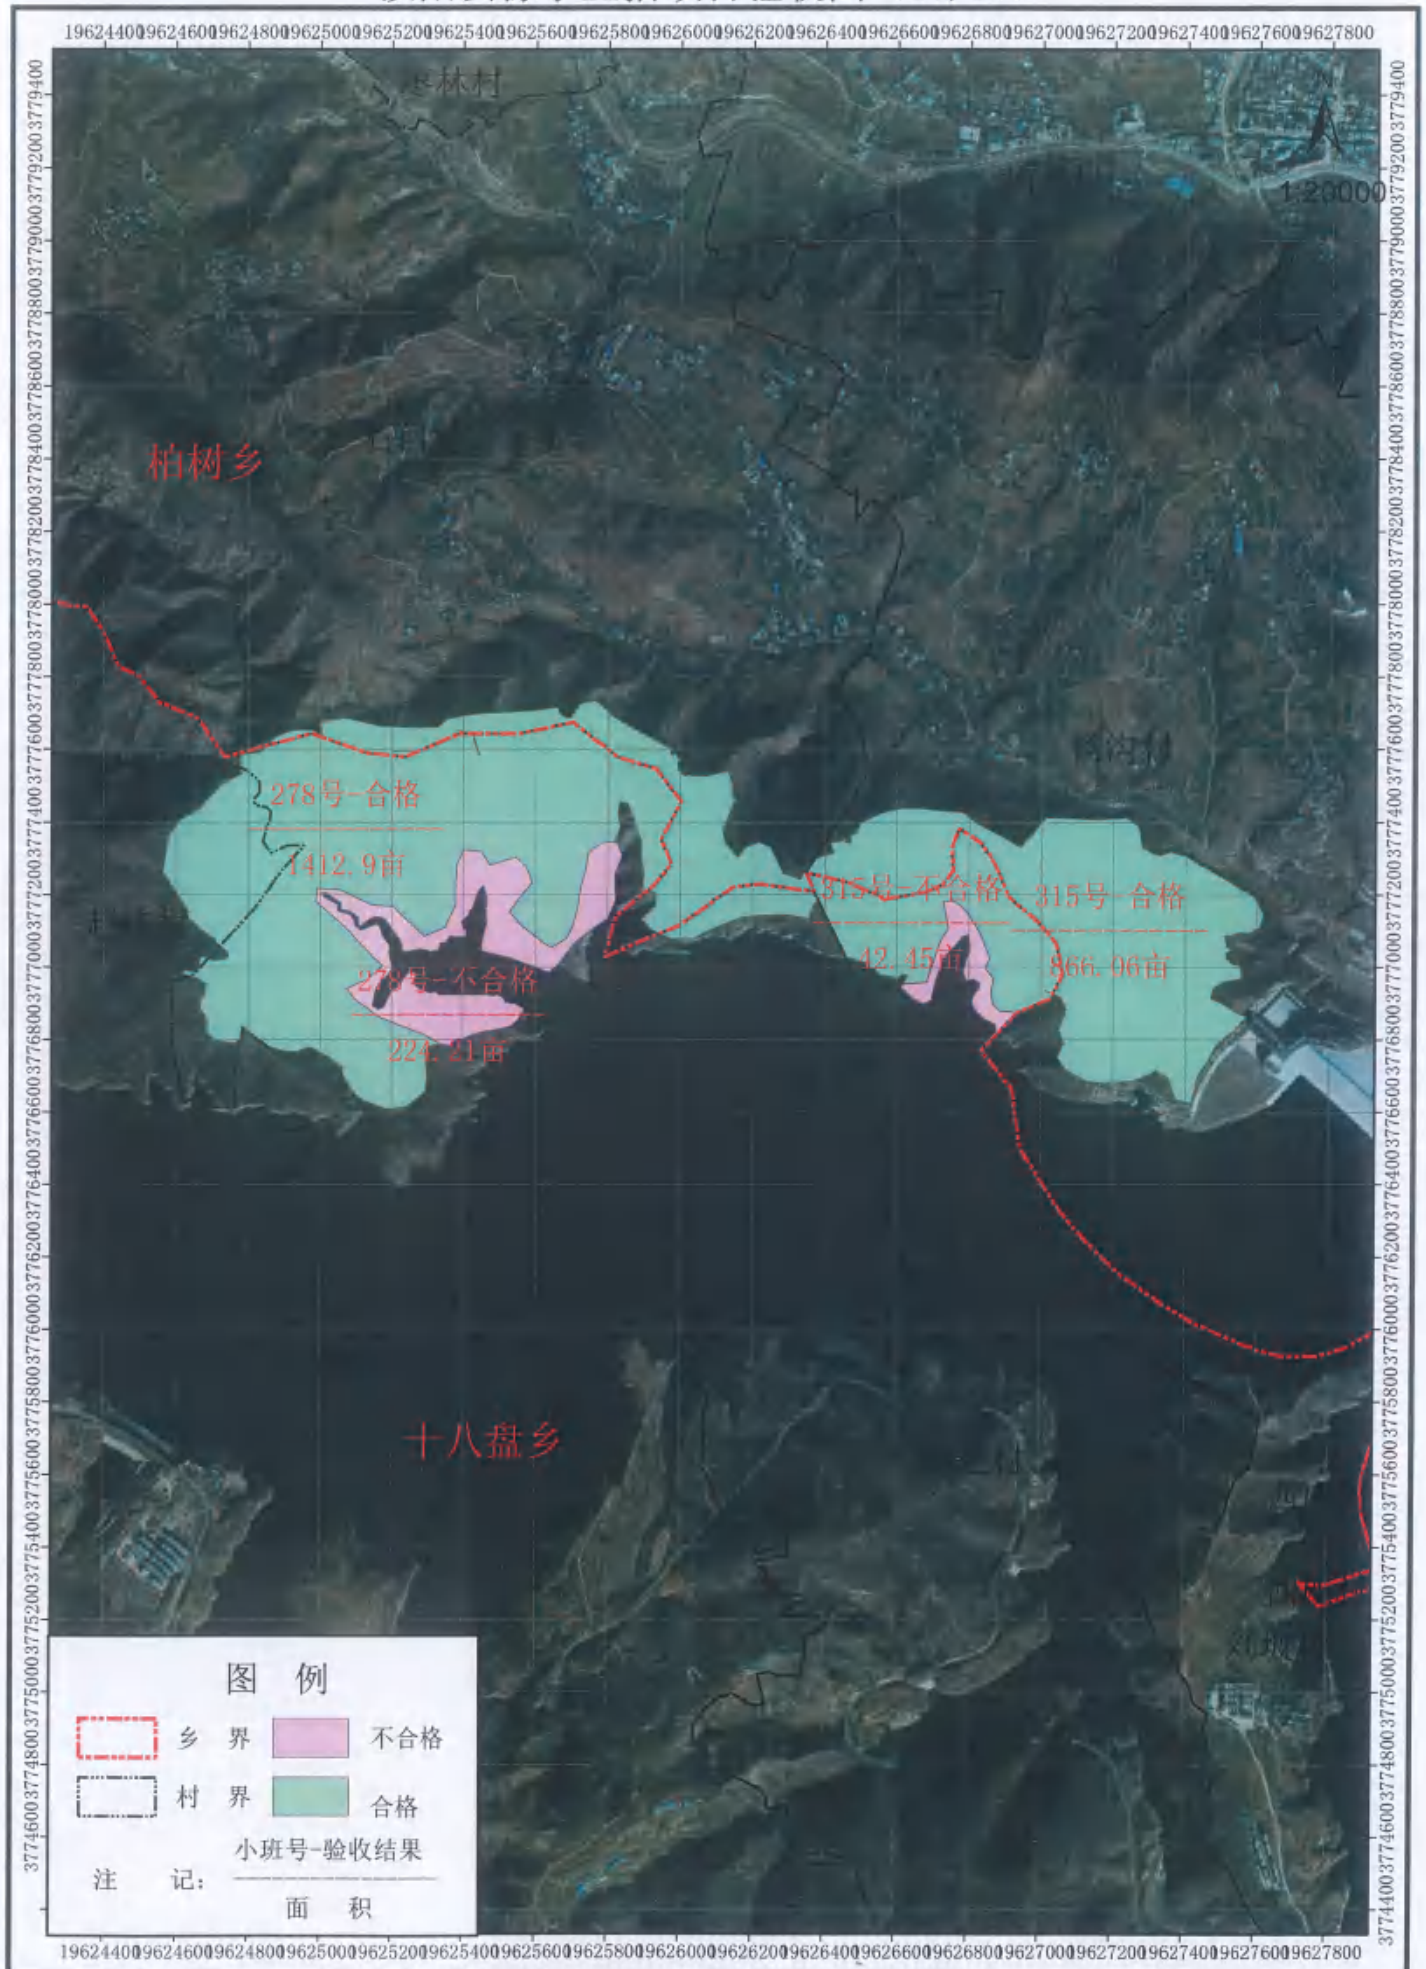



汝阳县橡子直播造林项目验收现场照片

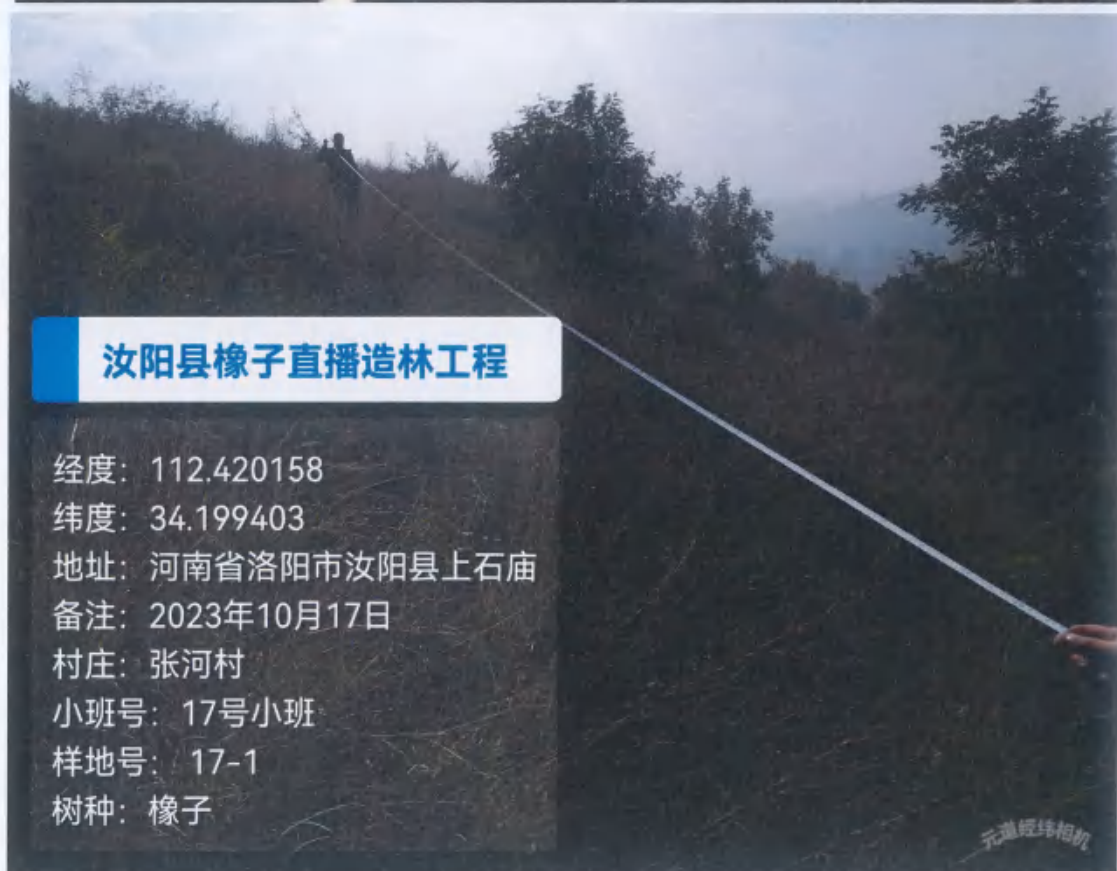

汝阳县橡子直播造林项目验收现场照片





汝阳县橡子直播造林项目验收现场照片

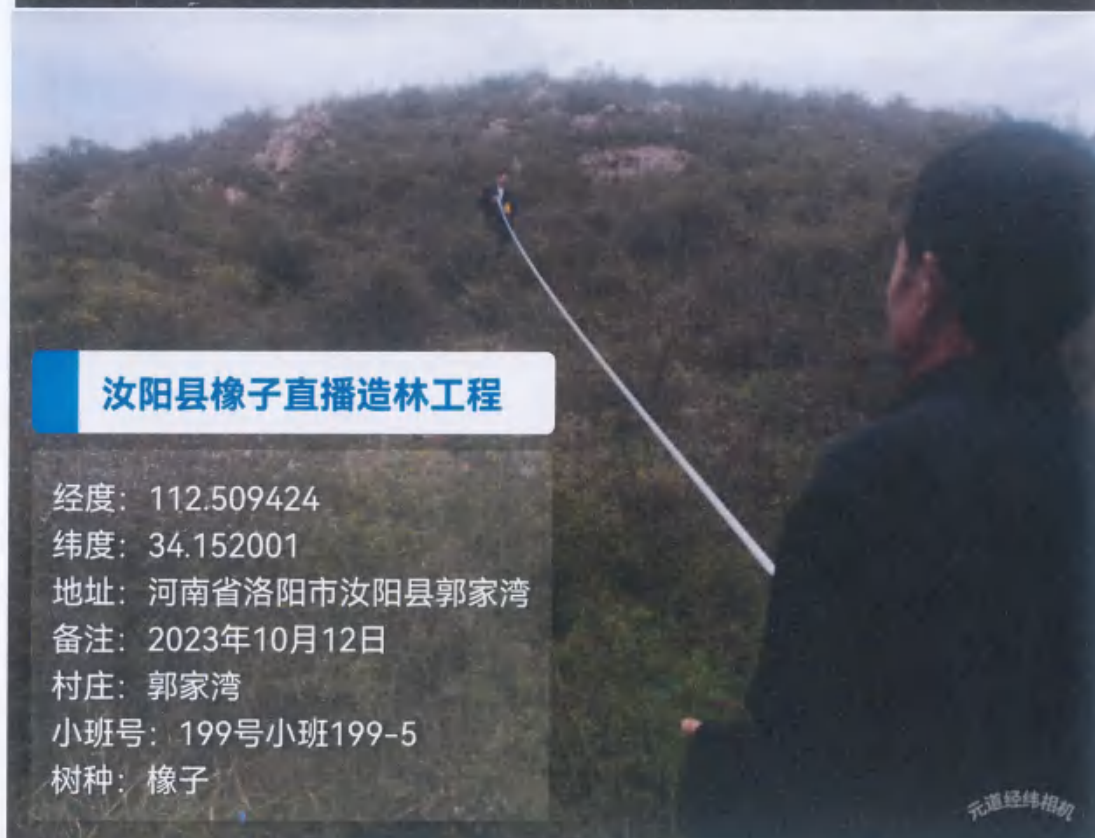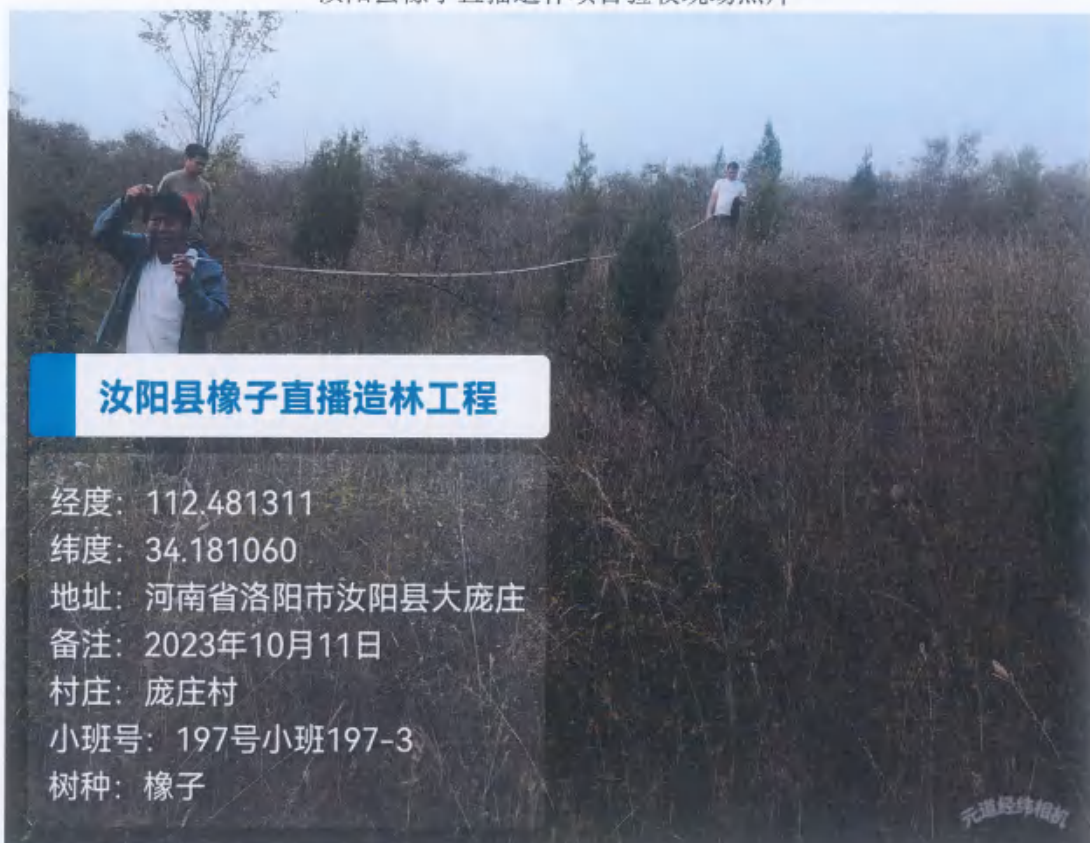

汝阳县橡子直播造林项目验收现场照片



汝阳县橡子直播造林项目验收现场照片

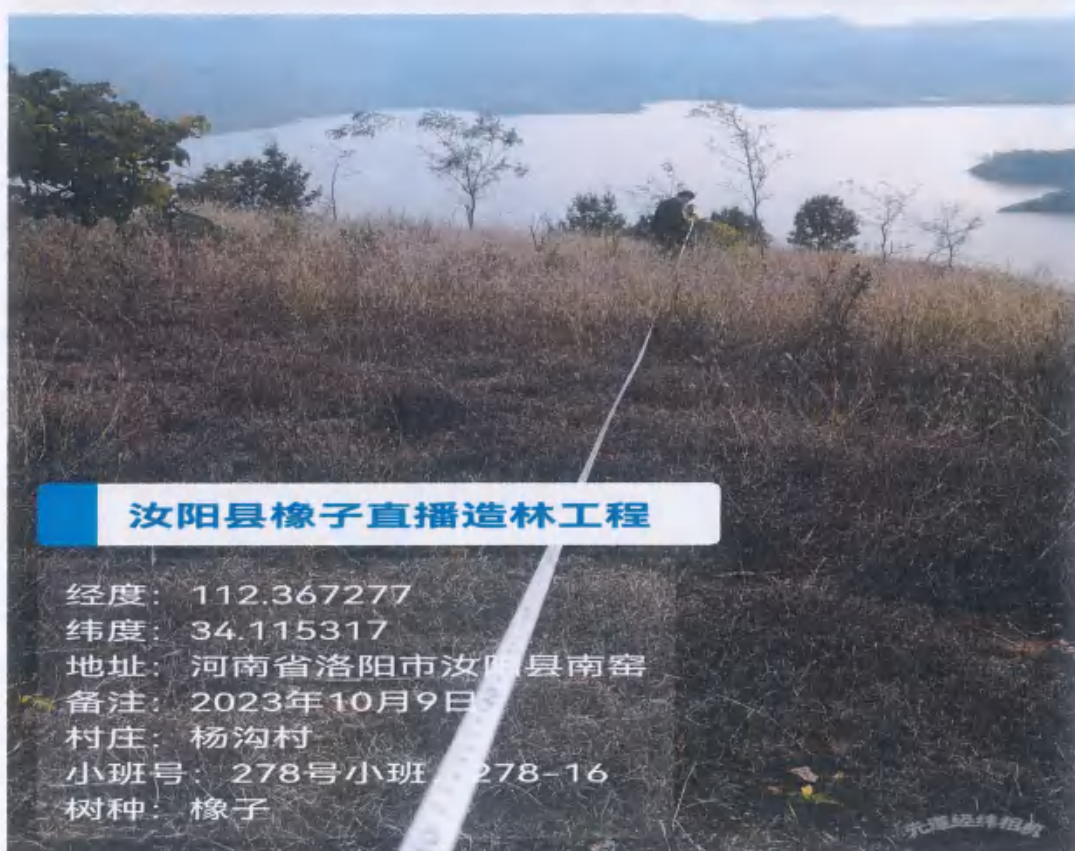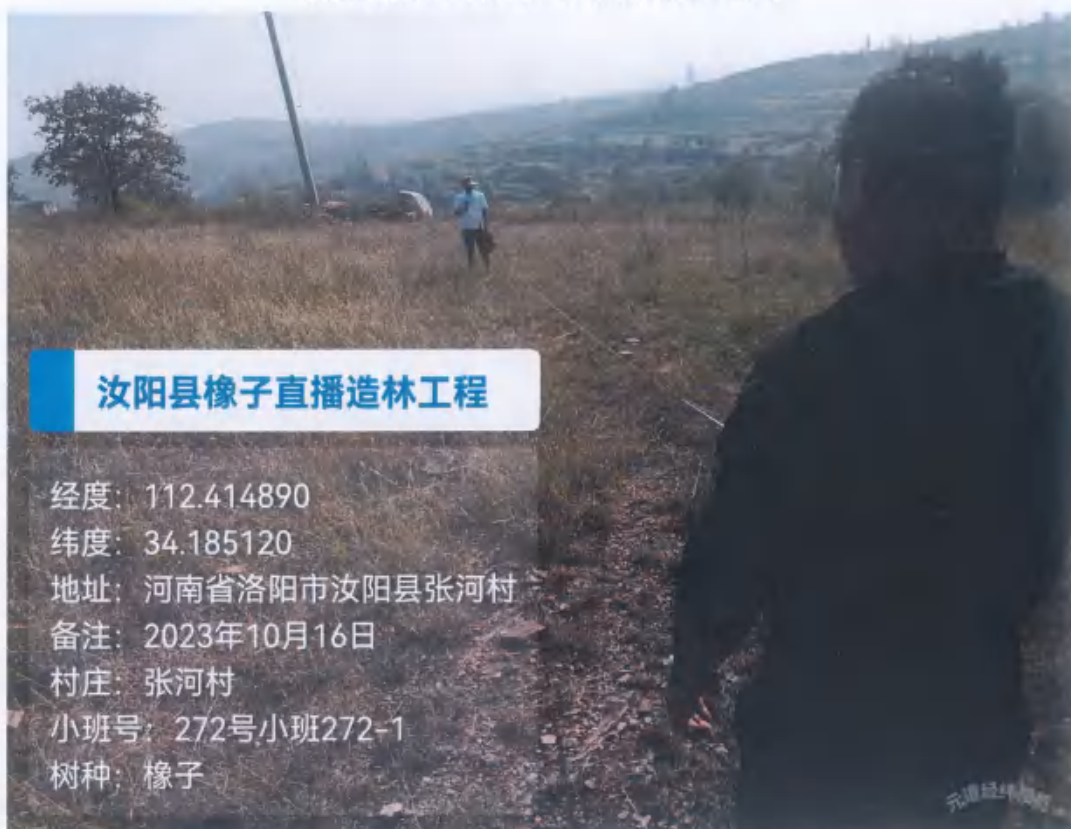


汝阳县橡子直播造林项目验收现场照片




汝阳县橡子直播造林项目验收现场照片




汝阳县橡子直播造林项目验收现场照片

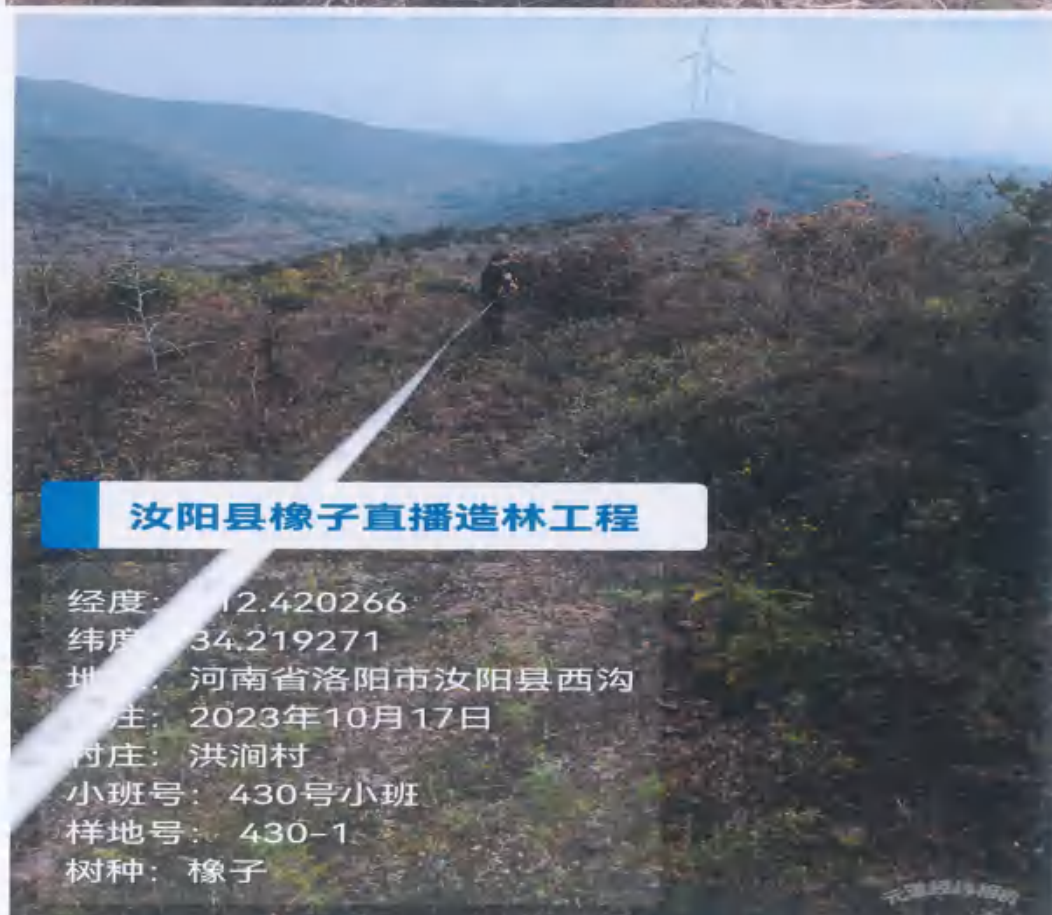

汝阳县橡子直播造林项目验收现场照片

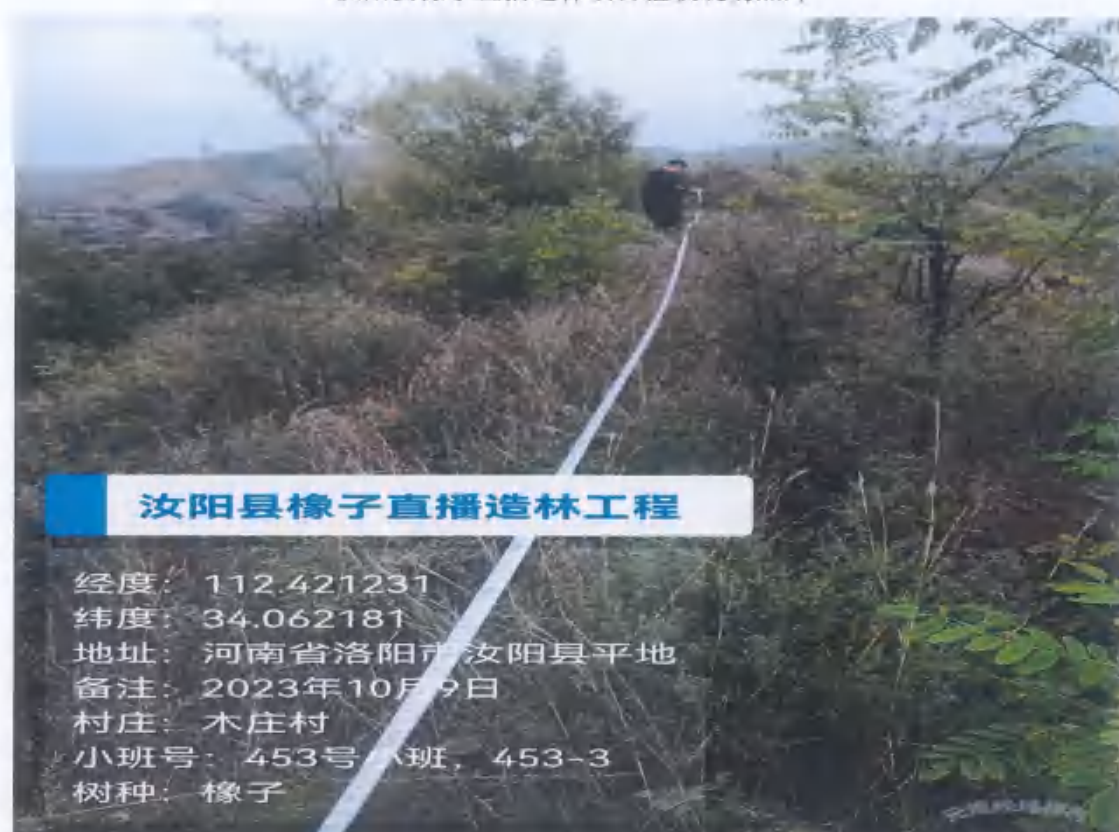

汝阳县橡子直播造林项目验收现场照片

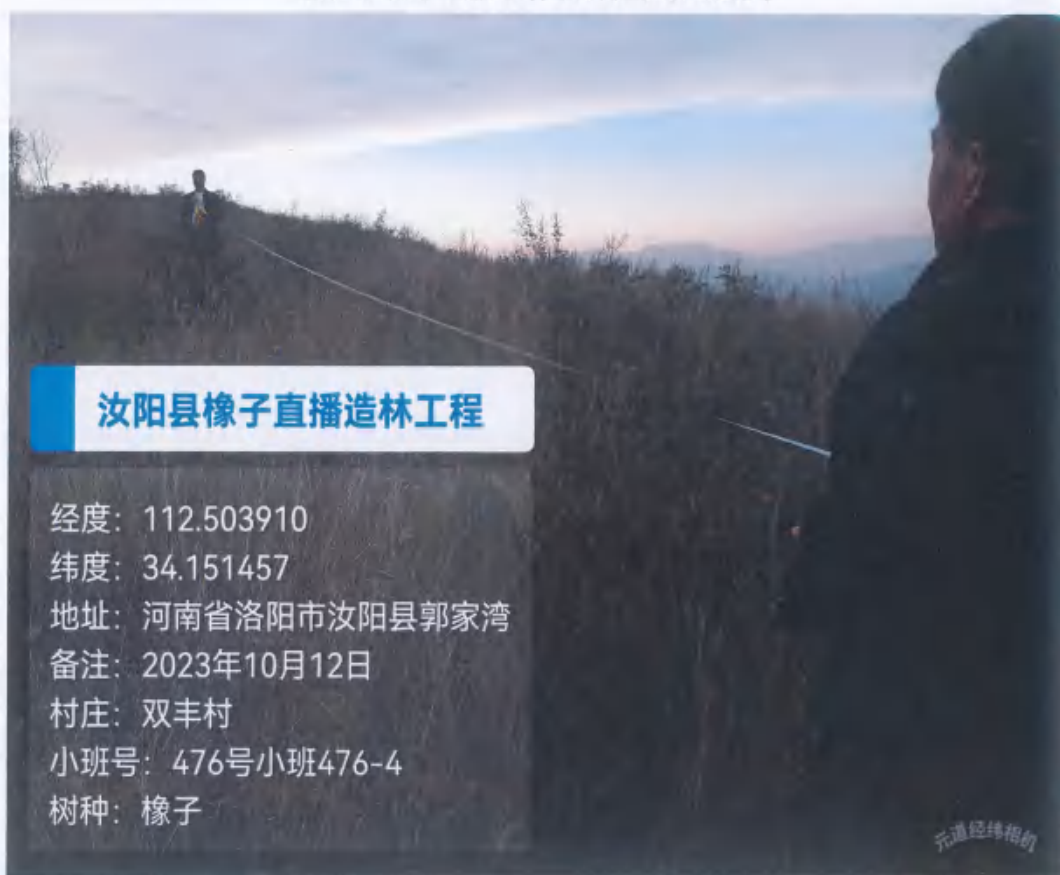

汝阳县橡子直播造林项目验收现场照片



汝阳县橡子直播造林工程

经度: 112.452222

纬度: 34.186944

地址: 河南省洛阳市汝阳县八里窑

备注: 2023年10月10日

村庄: 井沟村

小班号: 502号小班502-4

树种: 橡子



汝阳县橡子直播造林工程

经度: 112.452222

纬度: 34.186944

地址: 河南省洛阳市汝阳县八里窑

备注: 2023年10月10日

村庄: 井沟村

小班号: 502号小班502-4

小班号: 502-4

树种: 橡子



汝阳县橡子直播造林项目验收现场照片




汝阳县橡子直播造林项目验收现场照片




汝阳县橡子直播造林项目验收现场照片

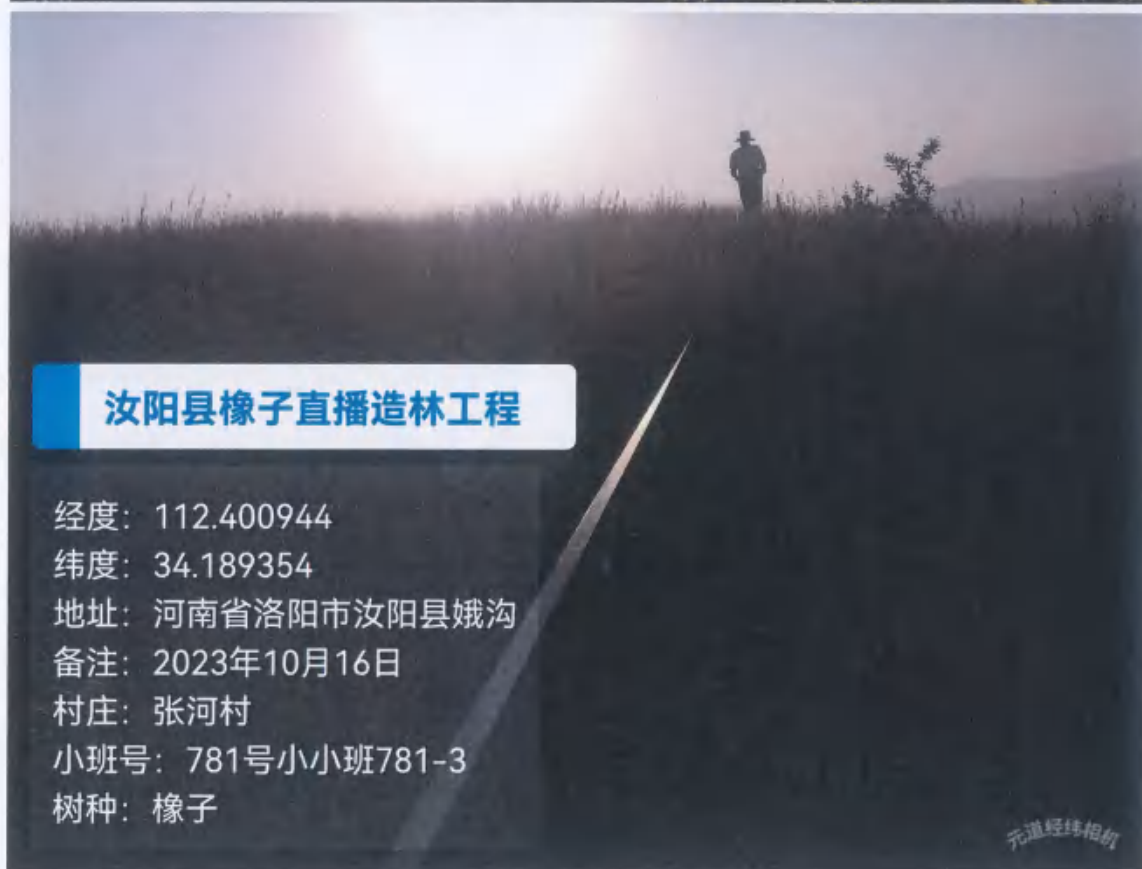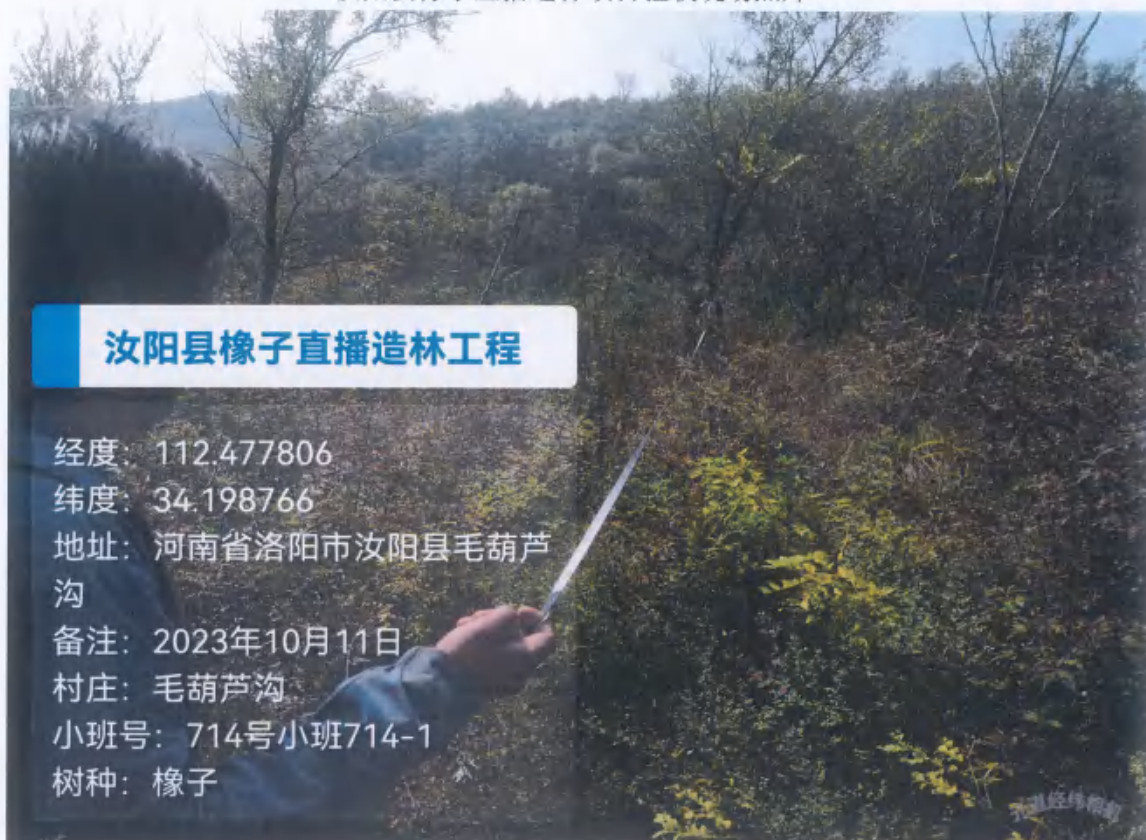

汝阳县橡子直播造林项目验收现场照片

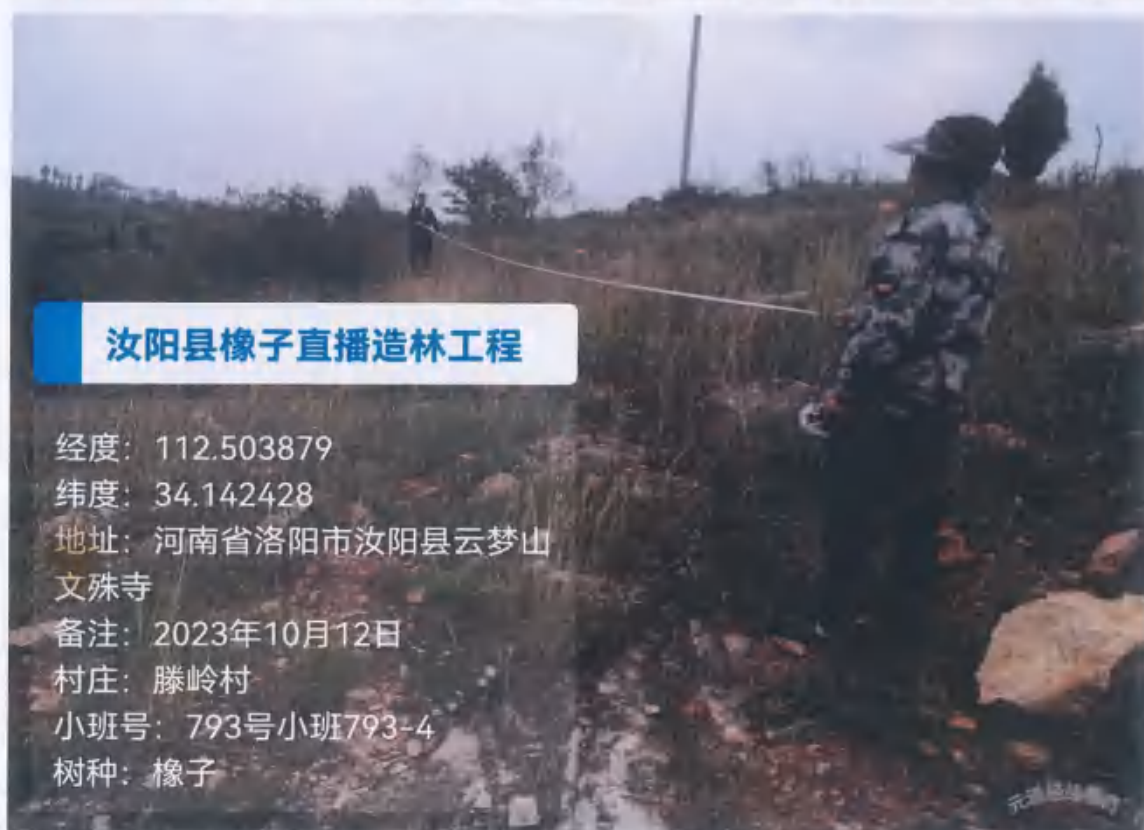

汝阳县橡子直播造林项目验收现场照片

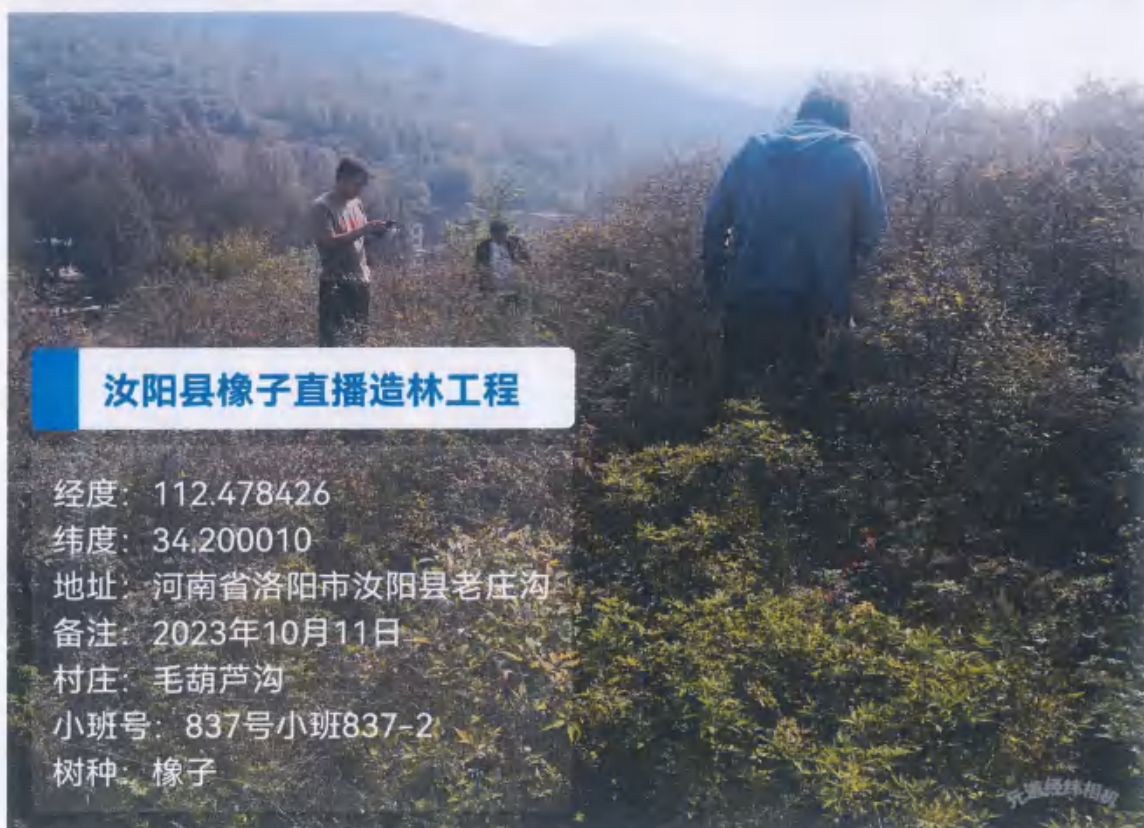

汝阳县橡子直播造林项目验收现场照片

