焦作市马村区2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

第三方验收报告

项目名称：张弓村年产8000吨脱水蔬菜加工生产项目

项目所在地：武王街道办事处张弓村

建设单位：武王街道办事处

施工单位：河南润南园林建设有限公司

监理单位：河南东南建设发展有限公司

河南环昂工程咨询有限公司

2024年8月12日

第三方验收报告

一、项目概况：

1.项目名称：张弓村年产8000吨脱水蔬菜加工生产项目

2.项目地址：马村区武王街道办事处张弓村

3.主要合同约定建设内容：生产车间电气工程、给排水工程、土建工程、消防工程、室外电气工程、室外给排水工程、室外蒸汽管道、泵房电气工程、泵房土建工程、泵房消防工程等。

4.施工合同造价：3222781.32元

二、验收评估依据：

1.本工程有关的施工和监理合同、图纸、工程量清单、补充协议、变更签证等；

2.国家现行有关工程质量方面的验收规范标准和相关技术标准等；

3.监理单位出具的《监理工作报告》。

三、验收内容：

2024年8月9日施工单位报请，经监理单位同意，由武王街道办事处批准后，由第三方验收机构、村委、施工单位、监理单位等相关单位负责人参加，对张弓村年产8000吨脱水蔬菜加工生产项目进行了实地验收和实测实量。

1.首先征询了项目所在村村委干部对工程施工的意见，是否对工程有疑问或者其他情况，在征求无意见后组织进行了验收。

2.现场利用手推式测距轮车滚尺测量了长度。

3.利用钢卷尺测量了外观的几何尺寸。

4.在监理单位的见证下对该项目相关隐蔽工程抽查，达到设计要求。

5.监理单位出具了《张弓村年产8000吨脱水蔬菜加工生产项目》，质量评估结论为合格。

查看施工单位的技术资料和施工验收资料（由监理单位负责认可）等相关工程资料，相关施工技术资料中检验批和试验资料等经监理认可为合格，达到了现行国家验收规范要求。

征求了项目所在村受益村委干部对项目施工质量等方面的情况，各村对项目施工质量总体评价为满意。

四、验收意见：

1.经监理单位确认，项目所在村、项目所在办事处认可，河南润南园林建设有限公司完成了对张弓村年产8000吨脱水蔬菜加工生产项目合同约定工程内容。

2.根据施工单位自检结果和监理单位质量验收评定结论，经参验各方共同商定，对工程总体验收结论为：**符合合同约定规定，观感一般，质量符合合同约定合格标准。**

五、第三方验收结论：

对张弓村年产8000吨脱水蔬菜加工生产项目施工单位完成：生产车间电气工程、给排水工程、土建工程、消防工程、室外电气工程、室外给排水工程、泵房电气工程、泵房土建工程、泵房消防工程等。质量基本达到合同约定要求，**总体评价为：合格。**

六、相关建议：

建议施工单位后期移交做好技术交底和项目受益村要做好后期管理工作。

河南环昂工程咨询有限公司

2024年 8 月 12 日

焦作市马村区2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金实测实量验收表

项目名称	张弓村年产8000吨脱水蔬菜加工生产项目			项目经理	郭辉
建设地点	张弓村			合同金额	3222781.32元
监理单位	河南东南建设发展有限公司			监理人员	
验收日期	2024 年 8 月 12 日			验收方式	现场实测实量
实测实量认定数据	投标清单或合同约定工程项目	计量单位	合同工程量(招标清单工程量)	实测验收工程量	备注
	车间电气工程 SC50	m	7.49	7.49	实际为桥架
	工厂灯1*200W	套	29	30	
	工厂灯1*18W	套	33	28	
	车间土建工程 散水	m2	159.96	152.09	
	坡道	m2	22.4	33.84	
	直径89*3.0	t	2.263	360米	
	空腹柱	t	12.146	176米	22个*8m
	空腹柱	t	1.623	32米	4个*8m
	钢梁	t	18.368	11架	
	XZ180*70*20*2.2	t	1.483	240米	20*6*2个
	XZ180*70*20*2	t	5.669	960米	20*48m
	屋面排水	m	176	176	实际为PVC110
	块料墙面	m2	208.15	166.4	
	车间消防工程 DN100	m	188.92	180	
	DN65	m	72.05	70	
	给排水工程(室外)PE160	m	365.73	211.6	9.6+202
	PE110	m	0	28	
	PE75	m	0	12.7	
	HDPE200	m	54.82	19	实际为HDPE300
	DN150消火栓钢管	m	81.82	79.8	实际为PE160米
验收人员确认栏	单位		人员(签字并盖章)		
	施工单位				
	项目所在村				
	项目所在乡镇				
	监理单位				
	第三方验收单位				

备注：各参建单位对以上实测实量数据若无异议，签字盖章确认。

张方村年产8000吨脱水蔬菜加工生产项目

说明：

1、电气工程

1、SC50桥架代管

2、2T灯 29+1多1个

3、装饰灯 3个 暂无

4、2T灯 1×18m 33个实际28个

5、照明开关 12个 实际 观到2个

6、二联开关 4个 实际 1联

2、给水工程与清单一致

3、土建工程

散水：152.09×1=152.09m²

坡道：1.65×5.1+2×1.65+8.2×3.6+5.3×1.7 =33.84m²

489×3.0 60×5道+30×2 =360m

Φ22钢筋 边根 9.08m长

Φ20钢筋 面根 6.7m 7.74m

Φ20钢筋 边根 6.7m

空腹钢柱 22个×8m=176m 64个×8m=32m

钢架 11架

180×70×20×2.2 20×6m×2个=

180×70×20×2 20×48m=

钢板天沟 119m

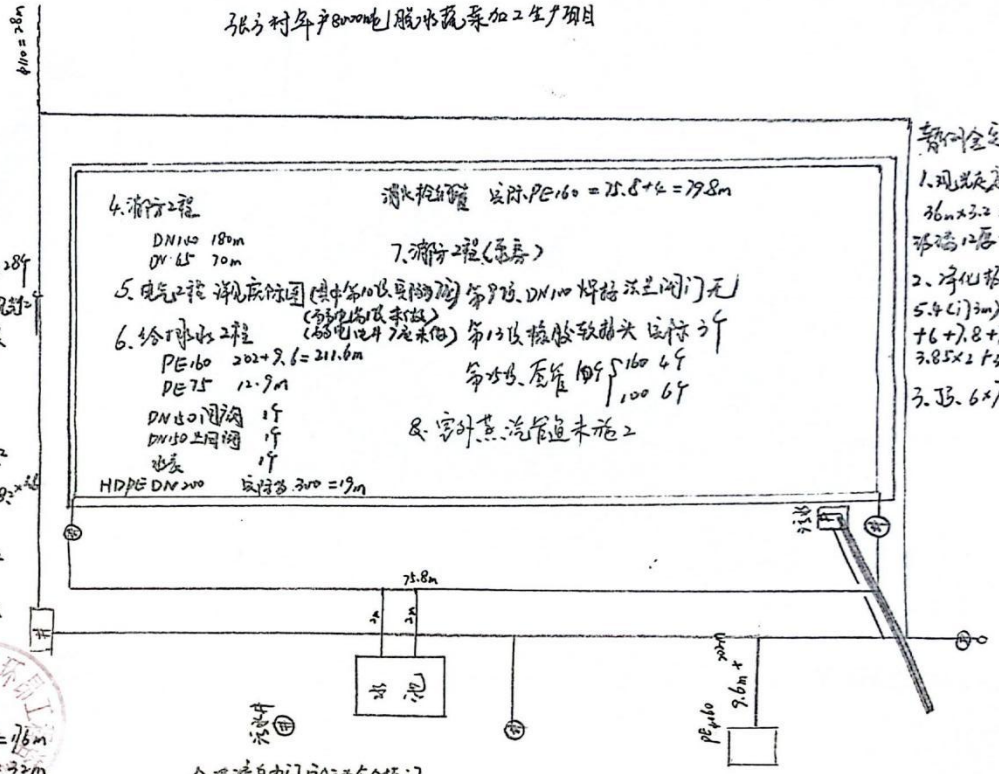

4.消防工程

DN140 180m

DN65 70m

消火栓钢管 实际PE160=75.8+4=79.8m

5.电气工程 详见实际图（其中第10项实际为7项）第9项、DN100焊接法兰阀门无

（弱电电缆未做）

（弱电电井7项未做）

6.给排水工程

PE160 202+9.6=211.6m

PE75 12.9m

DN150阀门 1个

DN150三阀门 1个

水表 1个

HDPE DN200 实际为300=19m

7.消防工程（系统）

第9项、DN100焊接法兰阀门无

第13项 接胶软接头 实际3个

第25项、盾管 10个 160 4个 100 6个

8.室外蒸汽管道未施工

全部端自由门 实际为复合板门

屋面排水管 实际为PVC110

坎呼墙面 [(60+25)×2-4.2×3]×1=166.4m²

暂例金额：

1.观光走廊

36m×3.2×3高钢

沙墙12厚方钢有

2、净化板（含门

5.4(门3m)+24×2

+6+7.8+7.8+6+

3.85×2+3.2

3.顶、6×7.8+36×
