# 一体化泵站合同

# 河北高易建筑工程有限公司

## 一体化预制泵站加工定制合同

合同编号：20240523

定作方：郸城县第三高级中学 （甲方）

签订地点：枣强县

承揽方：河北高易建筑工程有限公司 （乙方）

一、产品名称、规格型号、数量、金额

| 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一体化提升泵站 | Φ2500*4800mm | 台 | 1 | 88200 | 88200 | 详见清单 |
| 金额合计： | | | | 88200 元 | | |
| 金额大写：捌万捌仟贰佰元整 | | | | | | |

二、质量要求及技术标准：按需求制作，附配置表。

三、运输方式及到达站港地点、运费负担 汽运，运费乙方承担（现场设备吊装费用，回填甲方承担）

四、包装标准及费用负担 裸装。（无回收）

五、验收标准和方式，提出异议期限 货到现场 3 日内无异议视为验收合格。

六、价款或酬金的结算时间及方法 合同签订后，甲方向乙方支付（10000 元）预付款，货物运至现场需方付清尾款（78200 元）卸货。

七、交（提）货地点方式：合同签订完成（支付定金后）15 个工作日内发货

八、违约责任 违约方承担。

九、解决合同纠纷的方式 友好协商，如协商不一致，可在异议方当地人民法院提起诉讼。

十、本合同自双方签字盖章，预付款到账生效，至合同履行完毕终止。如有未尽事宜，双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

十一、双方约定的其它条款：复印件，扫描件具有相同的法律效益。

十二、质保：一体化泵站筒体非人为天灾损坏情况下，质保一年，乙方在质保期内提供技术指导。(易损件除外)

十三、乙方负责指导安装调试

十四、本合同含运费，含增值税普通发票，及现场指导安装，调试费用。

| （甲方） | （乙方） |
|---|---|
| 单位名称：（章）郸城县第三高级中学 | 单位名称：（章）河北高易建筑工程有限公司 |
| 单位地址：河南省周口市郸城县文化路西 | 单位地址：河北省衡水市枣强县富强北路 |
| 委托代理人：付晔 | 委托代理人：张万平 |
| 开户银行： | 开户银行：中国民生银行股份有限公司石家庄槐北路支行 |
| 账　　号： | 账　　号：162416463 |
| 电　　话：13839415559 | 电　　话：13373080788 |
| 邮　　编： | 邮　　编：053100 |

# 分 项 说 明

| 序号 | 部位 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泵站筒体 | 一体化泵站壳体（无碱纱线机制缠绕） | Φ2500*4800mm<br>厚度:20mm<br>配 2 个吊耳，6 个地脚 | 加强 GRP | 套 | 1 | 高易环保 |
| 2 | | 固定爬梯 | 配套 | 不锈钢 304 | 套 | 1 | |
| 3 | | 扶手 | 配套 | 不锈钢 304 | 套 | 1 | |
| 4 | | 人孔铝盖+安全格栅 | 配套 | 压花铝板+GRP | 套 | 1 | |
| 5 | | 格栅孔铝盖+安全格栅 | 配套 | 压花铝板+GRP | 套 | 1 | |
| 6 | | 通风管 | DN100 | 不锈钢 304 | 套 | 2 | |
| 7 | | 进水口 | DN500 | GRP | 套 | 1 | |
| 8 | | 出水口 | DN300 | 不锈钢 304 | 套 | 1 | |
| 9 | | 进水口软连接 | DN500 | 橡胶 | 套 | 1 | |
| 10 | | 出水口软连接 | DN300 | 橡胶 | 套 | 1 | |
| 11 | | 服务平台 | GRP 格栅板+304 | GRP+304 | 套 | 1 | |
| 12 | 管道系统 | 出水压力管道系统 | DN200 | 不锈钢 304 | 套 | 2 | |
| 13 | | 止回阀 | DN200 | 球墨铸铁 | 套 | 2 | |
| 14 | | 闸阀 | DN200 | 球墨铸铁 | 套 | 2 | |
| 15 | 格栅系统 | 粉碎格栅 | FST-500 | 碳钢合金刀头 | 套 | 1 | |
| 16 | | 格栅支撑架 | 配套 | 不锈钢 304 | 套 | 1 | |
| 17 | | 格栅导轨 | 长度：格栅安装基面至井盖 | 不锈钢 304 | 套 | 1 | |
| 18 | | 格栅提链 | 配套 | 不锈钢 304 | 套 | 1 | |
| 19 | 控制系统 | 防雨型控制箱 | 软启动、远程控制、PLC、触摸屏、预留远传接口、防护等级 IP55 | 不锈钢 304 柜体 | 套 | 1 | 德力西元器件 |
| 20 | | 投入式静压式液位 | 配套 | 不锈钢 304 | 套 | 1 | |
| 21 | | 电缆式浮球液位 | 配套 | PP 材质 | 套 | 1 | |
| 22 | | 液位计保护管 | DN50 | 不锈钢 304 | 套 | 1 | |
| 23 | 水泵系统 | 潜污泵 | Q=350m³，H=10M，18.5KW | 铸铁 | 套 | 2 | 一用一备 |
| 24 | | 潜污泵耦合底座 | HT200 | 铸铁 | 套 | 2 | |
| 25 | | 水泵提升导轨 | 长度：泵安装基面至检修平台 | 不锈钢 304 | 套 | 2 | |
| 26 | | 水泵提链 | 配套 | 不锈钢 304 | 套 | 2 | |
| 27 | | 附件 | 内部配套螺丝 | | 套 | 1 | |

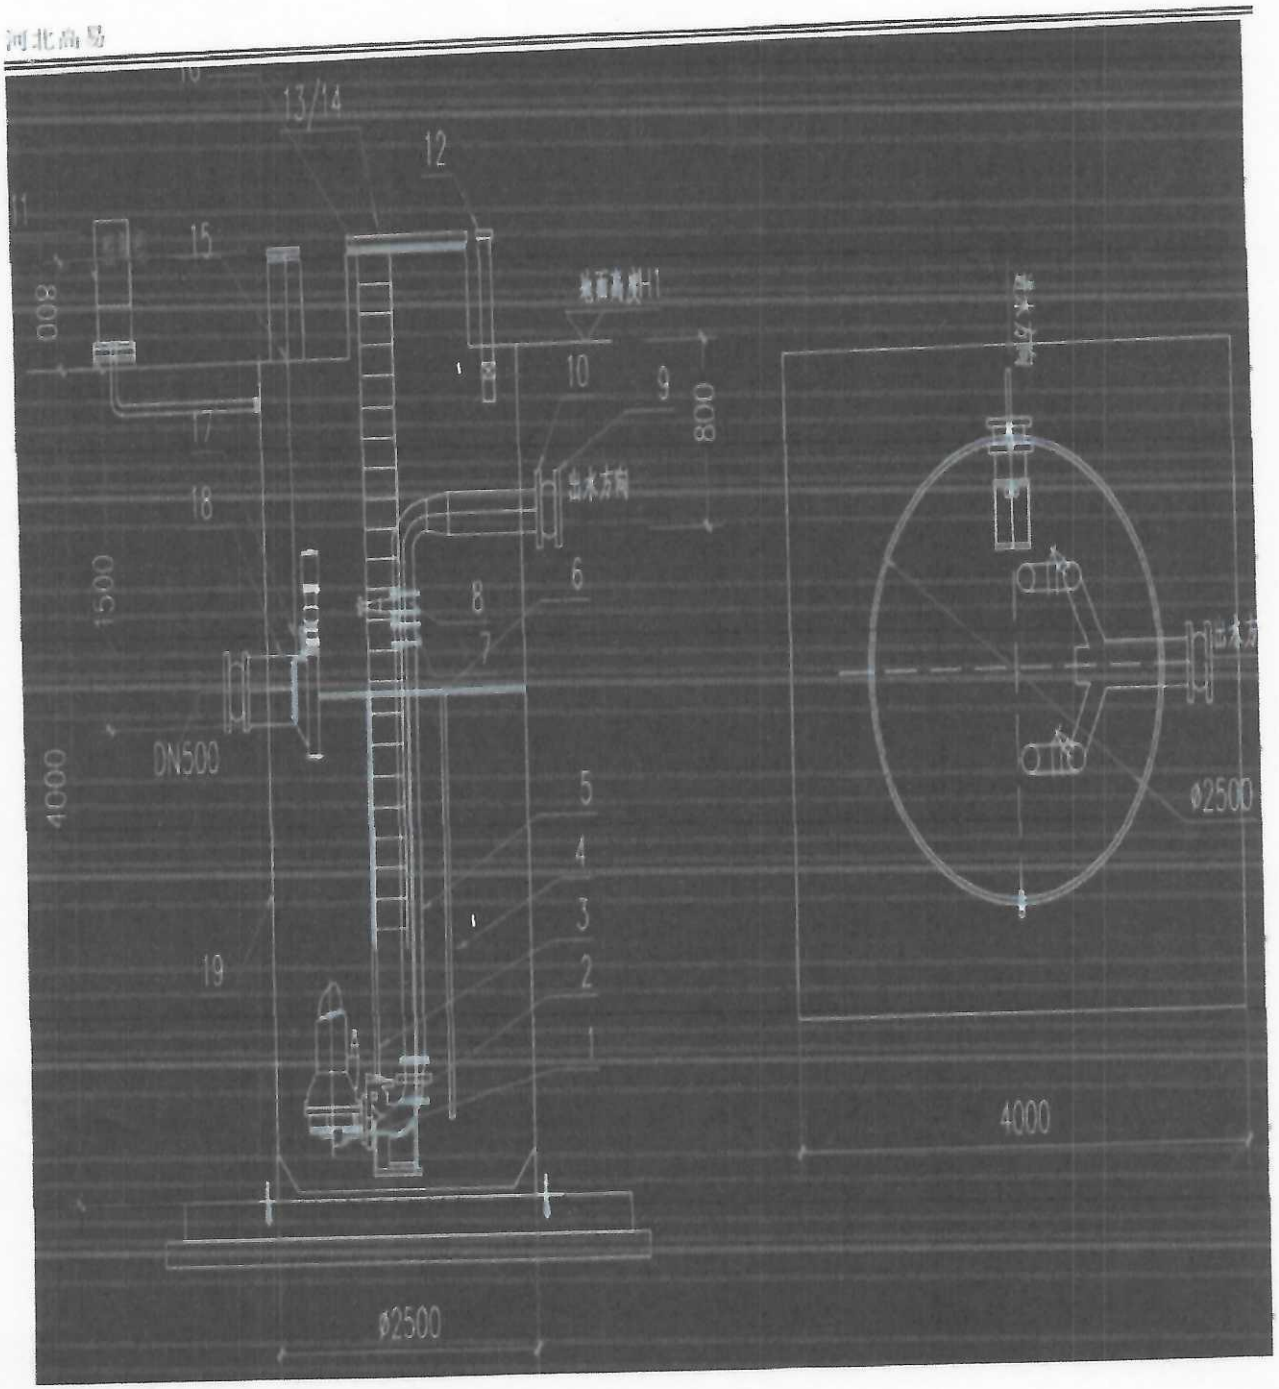
1、价格条款：含运费，含税。

2、货运方式：汽运。

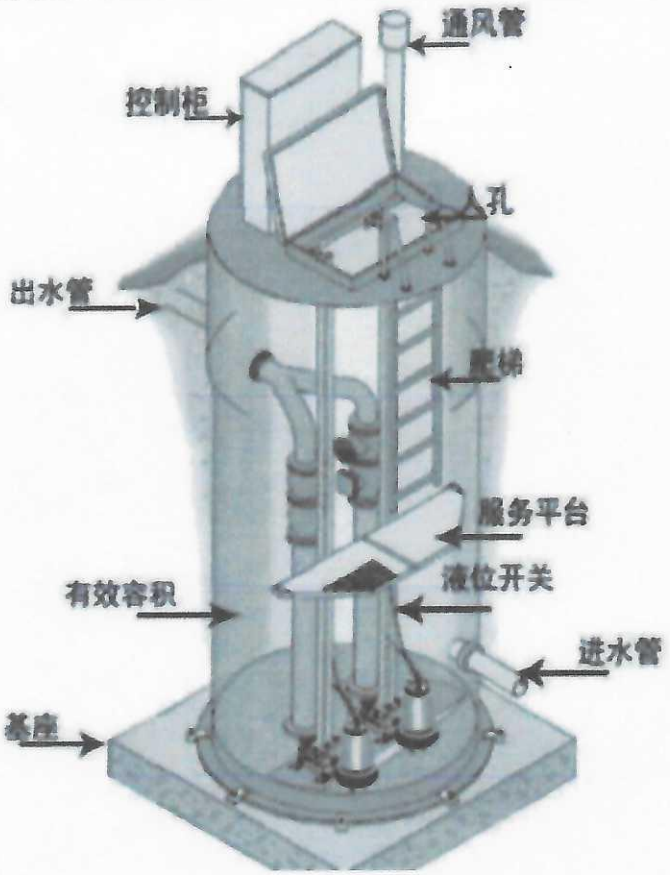
3、吊装组立 、就位及固定由需方负责。

4、提供免费技术支援！产品保质期一年（人为损坏及耗材更换除外）

5、土建施工部分（设备坑挖开、回填、混凝土底板）由需方自行负责。


13/14
12
11
15
800
10
9
800
出水方向
18
17
1500
8
6
7
DN500
4000
5
4
3
2
1
19
Φ2500
4000
Φ2500

**泵站图片（以实物为准）**


通风管
控制柜
孔
出水管
爬梯
服务平台
液位开关
有效容积
进水管
基座

